

# 事業計画（宮城県塩竈市）

## 1. 海岸対策

### ① 海岸の状況

市内の地区海岸数	53地区海岸
被災した地区海岸数	52地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	7地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	52地区海岸
復興を実施する地区海岸数	7地区海岸

### ② 堤防高

平成23年9月9日に堤防高を公表<sup>※</sup>。

松島湾：T.P. 4.3m（対象津波：チリ地震）

※公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

### ③ 復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年12月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成24年3月より順次工事に着手し、平成30年度での完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成24年11月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成26年3月より順次工事に着手し、概ね平成30年度での完了を目指す。

### ④ 平成26年度における成果

- ・新たに、2地区海岸において本復旧工事に着工した。（累計31地区海岸）
- ・着工した地区海岸において復興工事の進捗を図った。（累計1地区海岸）

### ⑤ 平成27年度の成果

- ・新たに、1地区海岸において本復旧工事に着工した。（累計32地区海岸）
- ・新たに、2地区海岸において本復旧工事を完了した。（累計6地区海岸）
- ・新たに、3地区海岸において復興工事に着工した。（累計4地区海岸）

### ⑥ 平成28年度の成果目標

- ・新たに、5地区海岸において本復旧工事の着工を目指す。(累計37地区海岸)
- ・新たに、15地区海岸において本復旧工事の完了を目指す。(累計21地区海岸)
- ・全ての地区海岸において復興工事の着工を目指す。(累計7地区海岸)

⑦ 事業完了予定年度

平成30年度

⑧ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H27年度の実施内容等	H28年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
塩竈市	平戸	159	護岸	6.20	5.00	—	H23.11	H24.1	策定済み	H24.3	着工済み	H25.3	完了済み	—	—		復旧
塩竈市	要の浜	133	護岸	6.20	5.50	—	H23.11	H24.1	策定済み	H24.3	着工済み	H25.3	完了済み	—	—		復旧
塩竈市	本屋敷	359	堤防	3.50	4.30	完了	H23.10	H24.1	策定済み	H24.3	着工済み	H27.8	完了済み	本工事	—		復旧
塩竈市	貝の浜	415	堤防	3.50	4.30	完了	H23.10	H24.1	策定済み	H24.3	着工済み	H27.8	完了済み	本工事	—		復旧
塩竈市	阿勢ヶ浦Ⅰ	54	護岸	3.50	3.50	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	阿勢ヶ浦Ⅱ	271	護岸	3.50	3.50	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	小谷地	72	護岸	2.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	鰐ヶ淵A	81	堤防	3.50	3.50	—	H23.10	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	鰐ヶ淵B	118	護岸	3.50	3.50	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	赤藻崎Ⅰ	81	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	赤藻崎Ⅱ	161	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	美女浦	112	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	笹峯	98	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦2	91	堤防	3.10	3.10	—	H23.10	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦3	108	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦4	91	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦5	97	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H27年度の実施内容等	H28年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
塩竈市	東三百浦6	108	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦7	77	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	東三百浦8	82	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	西三百浦	230	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	彦和田1	77	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	彦和田2	217	堤防	3.10	3.10 (一部3.30)	—	H23.10	H25.5	策定済み	H24.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	彦和田3	169	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H25.5	策定済み	H25.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	鷺島Ⅳ	61	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	野々島Ⅱ	81	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	鷺島Ⅱ	134	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	椋島Ⅰ	120	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	大森島Ⅰ	88	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	大森島Ⅲ	85	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	鷺島Ⅴ	57	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	大森島Ⅱ	72	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	野々島Ⅲ	54	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	他地区との調整	他地区との調整		復旧
塩竈市	椋島Ⅱ	84	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	馬の背	90	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H27年度の実施内容等	H28年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
塩竈市	大森島IV	56	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	馬越	78	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	鷺島III	47	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	計画の見直し	計画の見直し		復旧
塩竈市	葉ヶ崎	94	護岸	3.10	3.10	—	H23.11	H29.3	策定予定	H29d	着工予定	H29d	完了予定	他地区との調整	他地区との調整		復旧
塩竈市	野野島臨港	343	防潮堤、護岸	3.09 1.76	3.30	—	H23.11	H27.10	策定予定	H28.9	着工予定	H31.3	完了予定	詳細設計	詳細設計、本工事		復旧
塩竈市	寒風沢臨港	653	防潮堤、護岸	2.89	4.30 3.30	—	H23.11	H27.10	策定予定	H28.2	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
塩竈市	野々島	1,352.0	堤防、護岸	3.10 2.00	4.30 3.30 3.10 2.00	完了	H23.12	H24.12	策定済み	H25.9	着工済み	H30.3	完了予定	地元説明、本工事等	地元説明、本工事等		復旧
塩竈市	毛無崎	42.0	護岸	3.10	3.30	—	H23.11	H24.12	策定済み	H28.d	着工予定	H30.3	完了予定	地元説明、本工事等	地元説明、本工事等		復旧
塩竈市	朴島	809.0	堤防、護岸	3.10 2.00	3.30 3.10 2.00	完了	H23.12	H24.12	策定済み	H25.9	着工済み	H30.3	完了予定	本工事等	本工事等		復旧
塩竈市	仙台塩釜港 海岸通・港町	880	堤防、護岸、胸壁、その他(陸開)	2.70	3.30	完了	H23.11	H26.9	策定済み	H26.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事等	本工事等		復旧
塩竈市	仙台塩釜港 伊の島・金山通	3,929	護岸、胸壁、その他(樋門)	2.70	3.30	完了	H23.11	H26.6	策定済み	H26.7	着工済み	H30.3	完了予定	本工事等	本工事等		復旧
塩竈市	仙台塩釜港 磯島(前浜)	486	護岸、突堤、離岸堤	3.90	4.30	完了	H23.11	H27.3	策定中	H24.9	着工済み	H30.3	完了予定	本工事等	本工事等		復旧
塩竈市	仙台塩釜港 磯島(金ヶ浜)	0	離岸堤	2.39	4.30	—	H23.11	H24.7	策定済み	H24.10	着工済み	H26.6	完了済み	—	—		復旧
塩竈市	仙台塩釜港 磯島(石浜)	297	護岸、離岸堤	2.59	3.30	—	H23.11	H27.3	策定中	H28.9	着工予定	H30.3	完了予定	離岸堤については完成済	本工事等		復旧
塩竈市	仙台塩釜港 磯島(梅浜)	286	護岸、堤防	1.76	1.76	—	H23.11	H27.3	策定中	H28.6	着工予定	H30.3	完了予定		本工事等		復旧
塩竈市	仙台塩釜港 野々島(陸開)	53	護岸、その他(陸開)	3.09	3.30	—	H23.11	H27.3	策定中	H28.9	着工予定	H30.3	完了予定	地域住民との合意形成等	本工事等		復旧
塩竈市	仙台塩釜港 磯島(前浜)	0	離岸堤	2.59	4.30	—	H23.11	H24.9	策定済み	H24.9	着工済み	H25.8	完了済み	—	—		復旧
塩竈市	塩釜漁港	無堤	胸壁、陸開16基	—	3.30	—	H24.11	H28.3	策定予定	H28.3	着工済み	H31.3	完了予定	本工事	詳細設計 本工事		復興

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H27年度の実施内容等	H28年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
塩竈市	桂島漁港	無堤	胸壁、陸間2基	—	3.30	—	H24.11	H28.3	策定予定	H29.2	着工予定	H31.3	完了予定	本工事	配置検討業務		復興
塩竈市	野野島漁港	343	胸壁	3.09 1.76	3.30	—	H24.11	H27.10	策定予定	H28.9	着工予定	H31.3	完了予定	詳細設計	詳細設計 本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 海岸通・港町	無堤	防潮堤L=1,100m	1.10	3.30	—	H23.11	H26.3	策定済み	H26.3	着工済み	H30.3	完了予定	本工事等	本工事等		復興
塩竈市	仙台塩釜港 海岸通・港町	無堤	水門N=1基	0.00	3.30	—	H23.11	H26.3	策定済み	H26.11	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 中の島真山通	無堤	防潮堤L=1,724m	2.70	3.30	—	H23.11	H28.2	策定済み	H28.3	着工済み	H30.3	完了予定	本工事等	本工事等		復興
塩竈市	仙台塩釜港 要害浦	無堤	防潮堤L=340m	2.70	3.30	—	H23.11	H27.5	策定中	H27.6	着工予定	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 東宮浜	無堤	防潮堤L=194m	2.70	3.30	—	H23.11	H27.5	策定中	H27.6	着工予定	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 花洲浜吉田浜	無堤	防潮堤L=160m	3.10	3.30 5.40	—	H23.11	H27.2	策定済み	H27.3	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 代ヶ崎浜	無堤	防潮堤L=220m	2.70	3.30	—	H23.11	H26.5	策定済み	H27.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 桂島石浜・寒風沢前浜	無堤	防潮堤L=900m	2.59 3.90	3.30 4.30	—	H23.11	H27.5	策定中	H27.3	着工済み	H30.3	完了予定	地権者等との調整	本工事		復興
塩竈市	仙台塩釜港 桂島石浜	無堤	防潮堤L=250m	2.59	3.30	—	H23.11	H28.7	策定中	H28.9	着工予定	H30.3	完了予定	地元住民との合意形成	本工事等		復興
塩竈市	仙台塩釜港 寒風沢前浜	無堤	防潮堤L=650m	3.90	4.30	—	H23.11	H28.7	策定済み	H28.2	着工済み	H30.3	完了予定	本工事等	本工事等		復興

## 2. 下水道対策

### ① 整備目的

東日本大震災における地盤沈下及び津波被害を踏まえ、下水道施設を整備することにより、内水排除機能を強化すると共に、復興に向けた居住環境の向上を図るため、各施設の整備を行うもの。

### ② 整備施設

雨水幹線、雨水ポンプ場増設及び新設、雨水貯留管、雨水枝線、区画整理関連下水道事業

### ③ 平成 27 年度までの成果

新浜町一丁目地区下水道事業（藤倉雨水ポンプ場）の完成。

雨水幹線については、詳細設計が完了した路線から工事に着手済。

雨水ポンプ場、貯留管等については着手済、

区画整理関連下水道事業については、区画整理事業の進捗に合わせ着手済。

### ④ 平成 28 年度の成果目標

越の浦雨水ポンプ場放流渠工事の着手

雨水枝線工事の着手、用地買収の契約

以上の契約を行い、着手率 100%を目指す。

### ⑤ 事業完了予定年度

平成 29 年度

### 3. 交通網

#### 自治体管理道路

(町) 新浜町大通線外 19 路線 (市町村単位で路線をまとめて)

- ① 箇所 (工区) 名 : (市道 1 級) 新浜町大通線、新浜町 1・2・3 丁目 地内
- ② 【新浜町大通線】・・・外 2 路線 (新浜町三丁目十三号線・新浜町三丁目十四号線)

H26 年度末で設計委託を終了。工事については外 2 路線について H28 年度末に完了予定。  
新浜町大通線は平成 28 年度末で工事完了予定。

【H28 年度完了予定路線】・・・4 路線

新浜町大通線・新浜町三丁目一三号線・新浜町一四号線・  
北浜一丁目二号線外 5 路線

【H28 年度廃工予定路線】・・・なし

【H27 年度廃工路線】・・・4 路線

新浜町三丁目二十二号線・中の島芦畔町線外 1 路線・浦戸線

- ③ H28 年度末、復旧をすべて完了する予定

- ④ 平成 27 年度における成果

【工事完了】

尾島町東通線外 3 路線・中の島一号線外 1 路線・新富町貞山通線・旭町一号線外 3 路線・  
港町四号線外 5 路線・しおかぜ通り線外 3 路線

【工事着手】

新浜町大通線・新浜町三丁目十三号線・新浜町十四号線・  
北浜一丁目二号線外 5 路線


- ⑤ 平成 28 年度の成果目標 (集中復興期間の成果目標)

新浜町三丁目十三号線・新浜町三丁目十四号線・新浜町大通線・北浜一丁目二号線  
外 5 路線…計 4 路線工事完了

- ⑥ 事業完了予定年度

平成 28 年度

# H23道路災事業計画 位置図 塩竈市

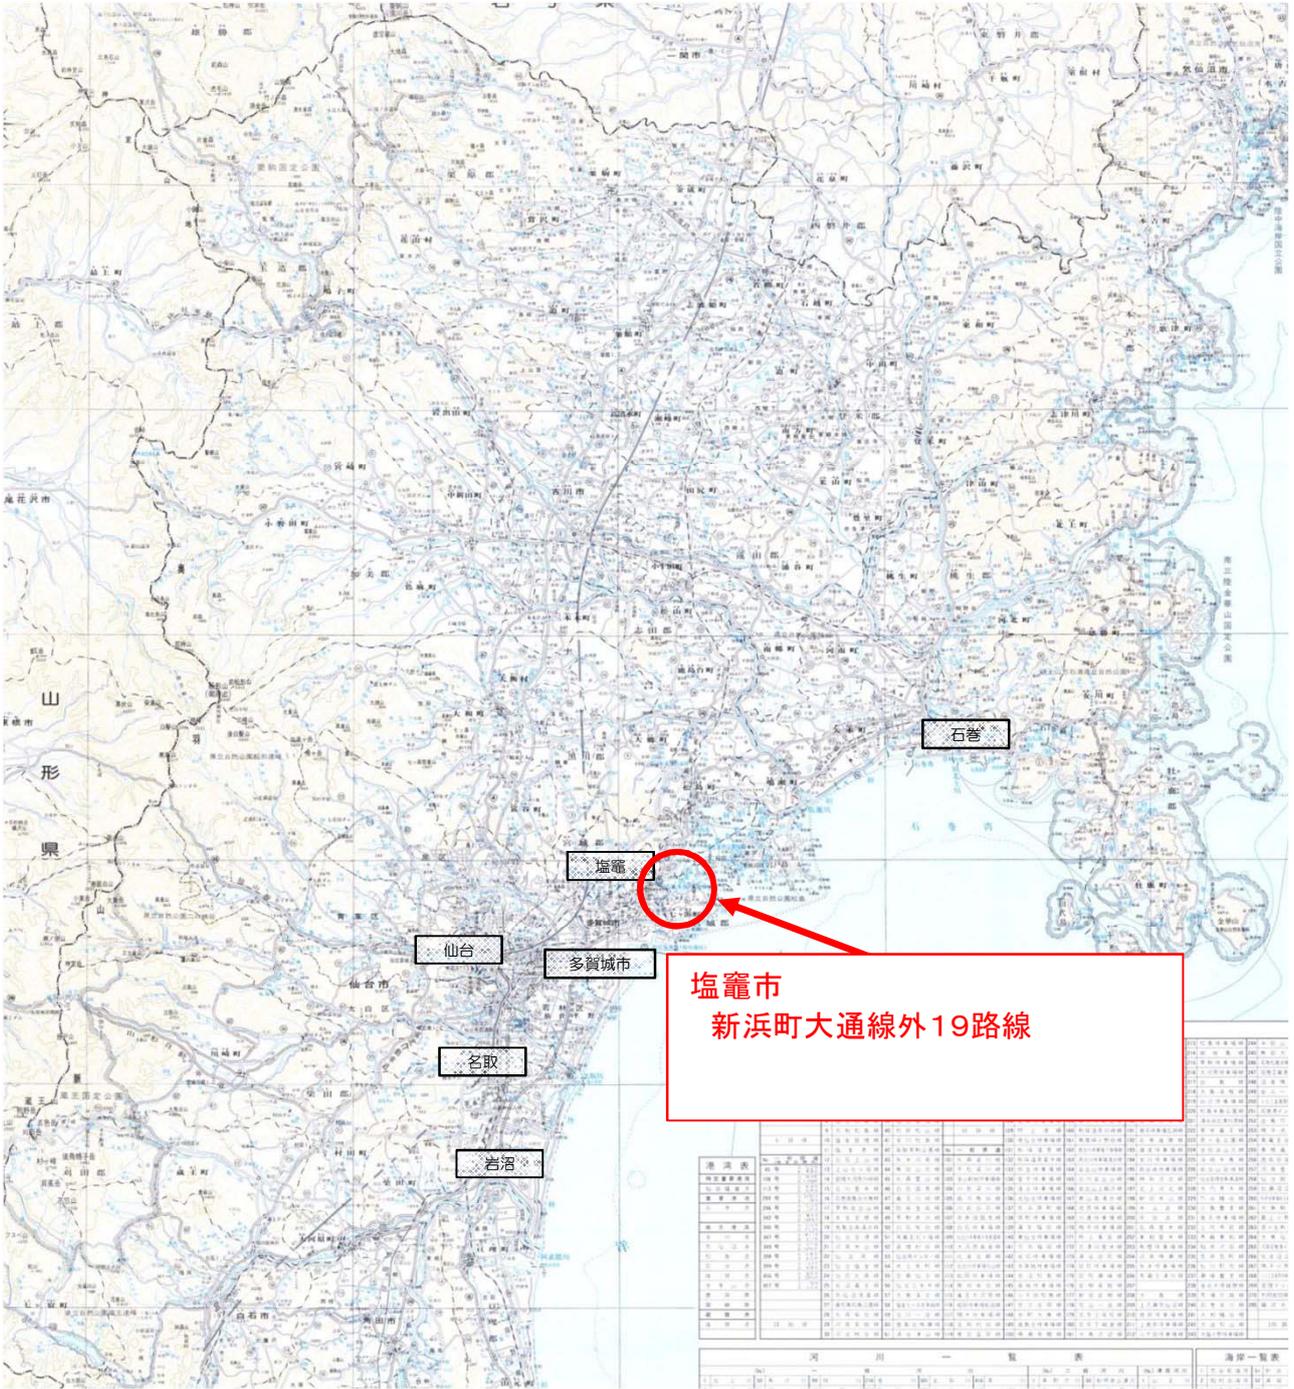

## 4. 農地・農業用施設

### ① 被災状況

津波により約 30ha の農地及び農業用施設に甚大な被害

### ② 農地の復旧状況

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。

○平成 24 年度から営農再開が可能な農地 約 7 ha

○平成 25 年度から営農再開が可能な農地 約 3 ha

○平成 26 年度から営農再開が可能な農地 約 2 ha

○平成 30 年度以降の営農再開を可能とすることを目指す農地 約 15ha

○平成 28 年度の成果目標

平成 29 年度春の作付時期から、津波被災農地約 30ha のうち約 12ha（約 40%）で営農再開を可能とすることを目指す。

○事業完了予定年度 平成 30 年度

（現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。）

## 5. 海岸防災林の再生

① 箇所名：塩竈市

② 被災状況

津波により森林 0.4ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した森林は、塩竈市復興計画策定等の議論を踏まえ検討する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

これまでに、海岸防災林の再生方針について塩竈市と調整を行った。調整の結果、被災した森林については、被害が小さく、防災機能への影響が軽微であることから、現状のまま経過を観察することとなった。

(保全対象： 農地、人家（浦戸地区）)

## 6. 漁港

### ① 被害状況

漁港数：2 漁港

被災漁港数：2 漁港

### ② これまでの実施状況

利府町内の各被災 2 漁港において、平成 25 年度末時点で、全延長の陸揚げ機能が回復している。

今後、平成 26 年度までに、その他の漁港施設の復旧を完了した。

### ③ 事業完了年度

平成 26 年度

## 7. 復興まちづくり

### (1) 津波復興拠点整備事業

① 地区名：港町地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から津波復興拠点整備事業に着手。

③ 平成 27 年度までの成果

平成 25 年 9 月に一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定し、平成 25 年 11 月に事業認可、平成 26 年 12 月に工事着手<sup>※1</sup>している。

④ 平成 28 年度の成果目標

平成 29 年度の事業完了に向けて着実に工事を進めていく。

⑤ 事業完了予定年度

平成 29 年度

※1 工事着手には設計付き工事発注を含む

### (2) 造成宅地滑動崩落緊急対策

① 地区名：藤倉地区、青葉ヶ丘地区、母子沢地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事に着手。25 年度末までに工事完了。

③ 事業完了年度

平成 25 年

### (3) 学校施設等

① 幼稚園・小中高等学校等

#### (i) 公立学校

<塩竈市立学校>

小中学校施設 10 校は全て平成 23 年度内に完了した。

#### < 県立学校 >

塩竈市に所在する県立学校うち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した1校については、平成24年度内に復旧完了した。

#### (ii) 私立学校

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助を申請した1校については、比較的軽微な被害にとどまったことから平成23年度内に事業着手したが、工事の遅れにより平成23年度内に施工完了せず、平成24年10月に復旧完了した。

#### ② 公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む）

##### < 塩竈市立社会教育施設 >

塩竈市公民館、ふれあいエस्प塩竈の2施設については全て平成24年度内に完了した。  
塩竈市民図書館、塩竈市民交流センターは、平成23年度内に完了した。

##### < 塩竈市立社会体育施設 >

塩竈市体育館、塩竈市温水プール、月見ヶ丘スポーツ広場、清水沢公園グラウンドの4施設については全て平成24年度内に完了した。

#### ③ 事業完了年度

平成24年度

## 8. 土砂災害対策

- ① 平成 23 年 8 月末までに、市内約 90 箇所<sup>1</sup>の土砂災害危険箇所<sup>2</sup>の点検を実施し、約 5 箇所<sup>3</sup>で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。（降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を実施。）
  
- ② 最大震度 6 強を観測した塩竈市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 25 年 5 月に通常基準への引き上げを実施。
  
- ③ 事業完了年度  
平成 23 年度

## 9. 災害廃棄物の処理

### ① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 249 千トン（災害廃棄物が約 239 千トン、津波堆積物が約 10 千トン）発生した。

### ② 搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 7 月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年 3 月末までに仮置場への搬入は完了した。

### ③ 処理状況について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 249 千トン（災害廃棄物が約 239 千トン、津波堆積物が約 10 千トン）の処理をすべて完了

### ④ 事業完了年度

平成 25 年度

# 復興施策の工程表（宮城県塩竈市）

	H23			H24			H25			H26			H27			H28			H29			H30			H31			H32						
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月
1. 海岸対策	<p>応急対策</p> <p>施工準備（堤防設計等）</p> <p>本復旧・復興（逐次完了し、全ての区間について概ねH30年度での完了を目指す。）</p> <p>平成30年度完了予定</p>																																	
2. 下水道対策	<p>施工準備（詳細設計、用地補償等）</p> <p>本工事（市策定の復興計画等を踏まえ、整備を逐次完了し、概ね5年を目途に全箇所工事完了予定。）</p> <p>平成29年度完了</p>																																	
3. 交通網 自治体管理道路 (市)新浜町大通線 外19路線	<p>応急対策</p> <p>施工準備（調査・設計等）</p> <p>本復旧</p> <p>平成28年度完了</p>																																	
4. 農地・農業用施設	<p>ヘドロ等が溜り又は部分的に堆積している農地(早川地区等)</p> <p>がれきの撤去</p> <p>土砂撤去、除塩、用排水施設の機能確保等</p> <p>営農再開</p> <p>平成30年度完了予定</p>																																	
上記以外の農地	<p>がれきの撤去</p> <p>土砂撤去、除塩、畦畔の復旧等</p> <p>営農再開</p>																																	
<p>(注)本工事は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。</p>																																		
5. 海岸防災林	<p>※海岸防災林の再生方針について塩竈市と調整した結果、被害が小さく、防災機能への影響が軽微であることから、現状のまま経過を</p>																																	
6. 漁港施設	<p>23年9月にがれき撤去完了</p> <p>1漁港で全延長、2漁港で部分的に陸揚げ機能が回復</p> <p>30年度までに、必要な漁港施設の復旧の完了を目指す</p> <p>平成30年度完了予</p>																																	
7. 復興まちづくり (1)津波復興拠点整備事業	<p>計画の策定</p> <p>復興の拠点となる市街地を緊急に整備</p> <p>平成29年度完了</p>																																	
(2)造成宅地	<p>緊急対策工事のための調査・設計を実施</p> <p>滑动崩落防止のための工事を実施</p> <p>平成25年度完了</p>																																	
(3)学校施設等 幼稚園・小中高等学校等 <市立学校> 比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	<p>施設の本格復旧(完了)</p> <p>平成23年度完了</p>																																	
<県立学校> 比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	<p>校舎等の本格復旧(完了)</p> <p>平成24年度完了</p>																																	
<私立学校> 比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	<p>校舎等の本格復旧</p> <p>平成24年度完了</p>																																	
公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む) <市立社会教育施設> 比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	<p>施設の本格復旧(塩竈市立社会教育施設:市民交流センター)完了</p> <p>平成24年度完了</p>																																	

8. 土砂災害対策	土砂災害 危険箇所 の点検等	平成23年度完了	(※) 土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成25年5月に通常基準への引き上げを実施。
9. 災害廃棄物等の処理	→	(住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去)	
	→	(その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入)	
	→	(中間処理・最終処分)	平成25年度完了
