

事業計画（宮城県東松島市）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

町内の地区海岸数	16地区海岸
被災した地区海岸数	16地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	7地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	16地区海岸

② 堤防高

平成23年9月9日に堤防高を公表※。

松島湾 : T.P. 4.3m（対象津波：チリ地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③ 復旧の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年12月までに策定※¹済み。

これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調整等を進めながら、平成25年度内に全ての区間での着工※²を目指す。

本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないように、計画的に復旧を進め概ね7年での完了を目指す。

※¹ 概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。

※² 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

④ 平成25年度における成果

・新たに、9地区海岸において、本復旧工事に着工※した。（累計29地区海岸）

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。

⑤ 平成26年度の成果目標

・全ての地区海岸において、本復旧工事の着工※を目指す。

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。なお、上記目標には平成25年度迄に着工した地区海岸を含む。

⑥ その他

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧の予定							H25年度の 実施内容等	H26年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計画 策定	詳細計画 策定	左記の 実施状況	工事 着工	左記の 実施状況	工事 完了	左記の 実施状況			
東松島市	波津々浦	207	堤防	3.00	4.30	完了	H23.10	H24	策定済み	H24.11	着工済み	H26.12	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	宮田	103	護岸	3.00	4.30	—	H23.11	H24	策定済み	H24.10	着工済み	H26.12	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	萱和田	80	護岸	3.00	3.00	—	H23.11	H25	策定予定	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	扇田	321	堤防	3.00	4.30	—	H23.10	H24	策定済み	H24.11	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	二郷田	89	護岸	3.00	3.00	—	H23.11	H25	策定予定	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	蛤浜	220	堤防	4.00	4.30	—	H23.10	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	北鰐ヶ淵	90	護岸	3.00	3.00	—	H23.11	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	浜口	54	護岸	3.50	3.50	—	H23.11	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	唐戸	127	護岸	3.50	3.50	—	H23.11	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	荒田浜	80	護岸	3.00	4.30	—	H23.11	H24	策定済み	H24.10	着工済み	H26.12	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	小目軽	83	護岸	3.00	3.00	—	H23.11	H25	策定予定	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	大目軽	231	護岸	3.50	3.50	—	H23.11	H25	策定予定	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	西畑	193	護岸	2.80	2.80	—	H23.11	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	大畑	79	堤防	2.80	4.30	—	H23.10	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	後田 I	129	護岸	2.80	4.30	—	H23.11	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧の予定						H25年度の 実施内容等	H26年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計画 策定	詳細計画 策定	左記の 実施状況	工事 着工	左記の 実施状況	工事 完了				左記の 実施状況
東松島市	苔ヶ浦	173	堤防	3.00	4.30	－	H23.10	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	江の浜	184	護岸	2.80	2.80	－	H23.11	H25	策定予定	H25.10	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	後田Ⅱ	58	護岸	2.10	2.10	－	H23.11	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	栗和田Ⅰ	112	護岸	3.00	3.00	－	H23.11	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	栗和田Ⅱ	88	護岸	3.00	3.00	－	H23.11	H24	策定済み	H25.2	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	松ヶ島	566	堤防	3.10	4.30	完了	H23.10	H24	策定済み	H24.3	着工済み	H26.7	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	大塚	23	防潮水門, 堤防	2.60	4.30	完了	H23.11	H25d	策定予定	H26.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	室浜漁港	1,138	堤防、護岸	3.50	4.30	－	H23.12	H26.3	策定中	H24.11	着工済み	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	月浜漁港	266	護岸	3.80	4.30	－	H23.12	H26.3	策定済み	H26.6	着工予定	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	大曲	1,062	堤防、突堤	6.20	7.20	完了	H23.11	H24.8	策定済み	H24.12	着工済み	H26.10	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	浜市	－	突堤、消波工	2.60	－	完了	H23.11	H24.8	策定済み	H24.8	着工済み	H26.3	完了済み	本工事		
東松島市	州崎	2,885	堤防	6.20	7.20	完了	H23.10	H24.12	策定済み	H26.3	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	東名	1,850	堤防	3.10	4.30	完了	H23.10	H24.12	策定済み	H24.11	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	長浜	966	護岸	3.10	4.30	完了	H23.10	H24.12	策定済み	H26.1	着工済み	H28.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	長石	253	護岸	3.10	4.30	完了	H23.10	H24.12	策定済み	H26.9	着工予定	H27.3	完了予定	背後の復興計画の策定・調整等	本工事	
東松島市	鰐ヶ淵	96	護岸	3.10	3.10	－	H23.11	H24.8	策定済み	H26.9	着工予定	H27.3	完了予定	本工事	本工事	
東松島市	石巻港西浜・南浜	2,256	護岸、突堤、離岸堤	5.63	7.20	完了	H23.7	H26.3	策定済み	H25.12	着工済み	H29.3	完了予定	本工事	本工事	

2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系高城川水系など※1の県・町管理区間では、全箇所（8箇所※2）の災害査定を完了し、8箇所※2で災害復旧事業を予定。そのうち、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊急度の高い2箇所についてはシート張り等による応急対策を完了。

本復旧については、平成23年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った4箇所着手。平成24年度は、新たに4箇所（4箇所）で本復旧に着手。

- ② 平成26年度は、実施中の2箇所の本復旧工事の進捗を図る。

本復旧は、海岸堤防の整備計画及び町が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備し、概ね7年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。）

併せて、堤防において液状化のおそれがある箇所については対策を実施。

- ③ 平成25年度における成果

- ・ 2箇所（2箇所）で本復旧を完了（累計6箇所）

- ④ 平成26年度の成果目標

- ・ 実施中の2箇所の本復旧工事の進捗を図る。

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動する

図面：宮城県提供



3. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 旧矢本町

② 被災状況

防潮堤 4, 151mが津波により倒壊した。また、林帯地盤 25. 3ha が地震により地盤沈下するとともに津波により侵食された。森林 25. 3ha も流失した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤（4, 151m）及び林帯地盤（25. 3ha）の復旧は、治山施設災害復旧事業により復旧する。被災した森林（25. 3ha）については、防災林造成事業により整備する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防潮堤・林帯地盤の復旧工事や森林造成について、他事業の事業計画と調整を図り、事業計画を作成した。

防潮堤の復旧工事については、平成 26 年度に着手し、平成 27 年度の完了を目指す。林帯地盤の復旧工事については、防潮堤の復旧が完了した箇所から着手し、平成 27 年度の完了を目指す。

森林造成については、林帯地盤の復旧が完了後、防風工等の植栽基盤の整備が完了した箇所から順次、苗木の植栽を実施し、平成 32 年度までの完了を目指す。

⑤ 平成 25 年度における成果

治山施設災害復旧事業： 関係機関との調整を行い、事業計画を作成した。

防災林造成事業： 関係機関との調整を行い、事業計画を作成した。

⑥ 平成 26 年度の成果目標

治山施設災害復旧事業： 防潮堤 280mの復旧を実施。

（保全対象： 国道 45 号線、県道 247 号線他、農地、人家（大曲浜地区他））

① 箇所名： 旧鳴瀬町

② 被災状況

海岸防災林の防潮工 122m、林帯 56. 9ha が被災。

③ 事業計画の内容

防潮堤及び林帯地盤は治山施設災害復旧事業により復旧する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防潮堤・林帯地盤の復旧工事や森林造成について、他事業の事業計画と調整を図り、事業計画を作成した。

防潮堤の復旧工事については、平成 26 年度に着手し、平成 27 年度までの完了を目指す。林帯地盤の復旧工事については、防潮堤の復旧が完了した箇所から着手し、平成 27 年度の完了を目指す。

森林造成については、林帯地盤の復旧が完了後、防風工等の植栽基盤の整備が完了した箇所から順次、苗木の植栽を実施し、平成 32 年度までの完了を目指す。

⑤ 平成 25 年度における成果

治山施設災害復旧事業： 関係機関との調整を行い、事業計画を作成した。

防災林造成事業： 関係機関との調整を行い、事業計画を作成した。

⑥ 平成 26 年度の成果目標

治山施設災害復旧事業： 防潮堤 122m の復旧を実施。

(保全対象： 国道 45 号線、県道 27 号線他、農地、人家（野蒜地区他）)

① 箇所名：矢本海岸、浜市、野蒜（国有林）

② 被災状況

津波により防潮護岸 200m、森林 167ha が被災。

③ 事業計画の内容

防潮護岸及び林帯地盤の復旧等については治山施設災害復旧事業により実施。森林の復旧については、防災林造成事業により実施。

④ これまでの実施状況と今後の予定

被災した森林については、一部がれき置場として地方自治体に貸し付けしていたが、平成 25 年度末で災害廃棄物処理が完了したことに伴いがれき置き場が解消。

今後、市復興計画及び他事業との調整を図りつつ着手可能な箇所から順次実施する。

防潮工の復旧及び盛土等海岸防災林の林帯地盤の復旧は平成 27 年度までで完了させ、苗木の植栽は、林帯地盤の復旧後、防風工の施工等が完了した箇所から順次実施し、全体の復旧を平成 32 年度までに完了することを目指す。

⑤ 平成 25 年度における成果

治山施設災害復旧事業： 防潮護岸 42mの復旧を実施

⑥ 平成 26 年度の成果目標

治山施設災害復旧事業： 林帯地盤約 54ha の盛土を実施。

（保全対象：航空自衛隊松島基地、大曲集落、市道他）

（なお、国有林内については、国有林野内直轄治山施設災害復旧事業等により国が直接実施する。）

4. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約 1,620ha の農地及び排水機場、排水路等の基幹的農業用施設に甚大な被害

② 施設の復旧

○応急復旧状況

立沼排水機場、幹線排水路等の基幹的排水施設について実施済み。

○本格的な復旧

復興計画を踏まえて着手し、概ね 4 年以内の完了を目指す。

平成 25 年度内に、第 2 五味倉排水機場や中江川排水路等について復旧完了。

平成 25 年度内に、浜須賀排水機場や立沼排水路等について工事に着手。

○国の直轄災害復旧

中区第二排水機場は、平成 24 年度内に工事に着手し、平成 25 年度内に復旧完了。

大曲排水機場、五味倉排水機場及び南区排水機場は、平成 24 年度内に工事に着手
平成 26 年度内に復旧完了予定。

③ 農地の復旧

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約 52ha（野蒜地区の一部等）

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約 913ha（矢本、鳴瀬地区等）

○平成 25 年度から営農が可能な農地 約 192ha

○平成 26 年度から営農が可能な農地 約 45ha

○平成 27 年度の営農再開を目指す農地 約 200ha

○平成 28 年度以降の営農再開を目指す農地 約 164ha（洲崎地区約 90ha の内数等）

（洲崎地区の状況）

- ・仮締切等の施工及び排水機場の復旧工事を進めたことにより、約 40ha の農地の排水を完了。
- ・並行して、関係機関にて、被害が甚大な農地約 40ha の復旧方針について、地域の意向把握や話し合いを進めていく。

（現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。）

④ 区画整理等検討状況

洲崎地区等において、大区画化等の区画整理を実施しているところ。

5. 漁港

① 被害状況

漁港数：7 漁港

被災漁港数：7 漁港

② スケジュール

東松島市内の各被災6漁港において、平成25年度末時点で、4漁港で全延長の陸揚げ機能が回復し、2漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している（野蒜漁港は係留施設なし）。

今後、平成26年度までに主要な漁港施設の復旧を目指し、平成26年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。

6. 復興まちづくり

(1) 学校施設等

① 幼稚園・小中高等学校等

(i) 公立学校

<東松島市立学校>

東日本大震災により被災した市立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請し、または申請予定の10校について、以下のとおり早期の復旧を目指す。

○比較的軽微な被害にとどまる7校のうち6校については、平成24年度までに事業が完了しており、現地復旧で建て替えが必要な1校については平成25年度に復旧完了した。

○津波被害を受け、移転も含めた総合的な検討が必要となる野蒜小学校、浜市小学校と鳴瀬第二中学校の3校については、平成23年度12月策定の「東松島市復興まちづくり計画」を基本とし、「東松島市学校教育復興検討委員会」の検討結果に基づき、東松島市小中学校の復興再編を行い、移転先の確保等の条件が整い次第、速やかな本格復旧の着手を行うこととする。

<県立学校>

東松島市に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の2校については、比較的軽微な被害に留まり、平成23年度内の事業着手、平成24年度内の復旧完了した。

(ii) 私立学校

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助を申請した2校及び申請予定の1校について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

○比較的軽微な被害に留まる2校については、平成23年度中に全て復旧完了した。

○津波被害を受け、移転も含めた総合的な検討が必要となるのびる幼稚園については、同市内に所在している事業所の空きスペースを間借りして保育を再開しており、平成25年度中に移転し、平成26年度中の復旧完了を目標とする。

② 公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む）

<東松島市立社会教育施設>

東日本大震災により被災した公立社会教育施設のうち、17施設（東松島市内の公館（市民センター・地区センター））については、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助を申請し、復旧を完了した。また、11施設については、平成23年12月策定

の「東松島市復興まちづくり計画」に基づく本格復旧を検討している。

○比較的軽微な被害に留まった１５施設は、平成２３年度から平成２４年度にかけて復旧を完了した。

○甚大な被害を受けた２施設（東松島市大曲市民センター、南区東地区センター）についても、平成２３年度から平成２４年度にかけて復旧を完了した。

○津波被害を受けて住宅地の集団移転も含めた総合的な判断が必要となる１１施設（浜須賀・立沼・大曲浜東・大曲浜西・浜市・新町・亀岡・洲崎・東名・月浜・大浜各地区センター）については、平成２３年１２月策定の「東松島市復興まちづくり計画」に基づき、集団移転の住民合意を図りながら、速やかに本格復旧の着手を行うこととしており、立沼地区センターについては平成２５年度に復旧完了した。

○比較的軽微な被害に留まるコミュニティセンター、図書館、奥松島縄文村の３施設については、平成２４年度までに事業が完了している。

<東松島市立社会体育施設>

東日本大震災により被災した市立社会体育施設のうち、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請したまたは申請予定の７施設について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。

○比較的軽微な被害に留まる５施設については、平成２４年度までに事業が完了している。

○津波被害を受け、移転も含めた総合的な検討が必要となる大曲地区体育館、奥松島運動公園の２施設については、平成２３年１２月策定の「東松島市復興まちづくり計画」に基づき、移転先の確保等条件が整い次第、速やかな本格復旧の着手を行うこととする。

<県立社会教育施設>

東松島市に所在する社会教育施設のうち、東日本大震災により被災し、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の１施設について、以下のとおり早期復旧を目指す。

○津波被害を受けた松島自然の家は、東松島市の復興計画も考慮に入れながら、平成２６年度から野外活動フィールド造成工事に着手し、出来るだけ早い時期に復旧完了する。

7. 土砂災害対策

- ① 最大震度6弱を観測した松島町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成23年3月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成25年5月に通常基準への引き上げを実施。

8. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 3,097 千トン（災害廃棄物が約 936 千トン、津波堆積物が約 2,161 千トン）発生。

② 搬入状況について


現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 8 月までに仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年 10 月末までに仮置場への搬入は完了した。

③ 処理状況と処理完了目標について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 3,097 千トン（災害廃棄物が約 936 千トン、津波堆積物が約 2,161 千トン）の処理をすべて完了した。

復興施策の工程表(東松島市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29		
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降		
1. 海岸対策																											
	応急対策		施工準備 (堤防設計等)																					本復旧（逐次完了し、全ての区間について概ね7年での完了を目指す。）			
2. 河川対策																											
(国管理河川： 鳴瀬川)	応急対策		H24年出水期（6月頃～）までに、被災前と同程度の安全水準（地盤沈下分を含む）までの本復旧を完了 液化化対策についてはH24年度中に概ね対策を完了 本復旧（河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、市町村策定の復興計画等を踏まえ、整備を逐次完了し、概ね5年を目途に全箇所復旧完了。） 市町村の復興計画の策定等に時間を要する箇所の液化化対策について、引き続き対策を実施。																								
			←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期												
			(※) 避難判断水位等を引き下げて運用																								
3. 河川対策																											
(県・市町村管理河川)	応急対策		施工準備 (堤防設計等)																					1箇所 本復旧完了		本復旧（河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、市策定の復興計画等を踏まえ、整備を逐次完了し、概ね7年を目途に全箇所復旧完了予定。）	
			←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期		←→ 出水期										
4. 農地・農業用施設																											
基幹的農業用施設 (立沼排水機場等)	がれきの撤去		応急復旧																					本復旧 (市策定の復興計画、他事業等との調整が完了した箇所から順次着手)			
用排水施設の機能が確保され、平成23年度当初までに除塩等を行い、すでに営農が可能となった農地（野蒜地区の一部等）	畦畔復旧、		営農再開 (地域の意向により、区画整理を実施)																					営農再開			
ヘドロ等が薄く又は部分的に堆積している農地（矢本、鳴瀬地区等）	がれき		土砂撤去、除塩、用排水施設の機能確保等																					営農再開 (地域の意向により、区画整理を実施)		営農再開	

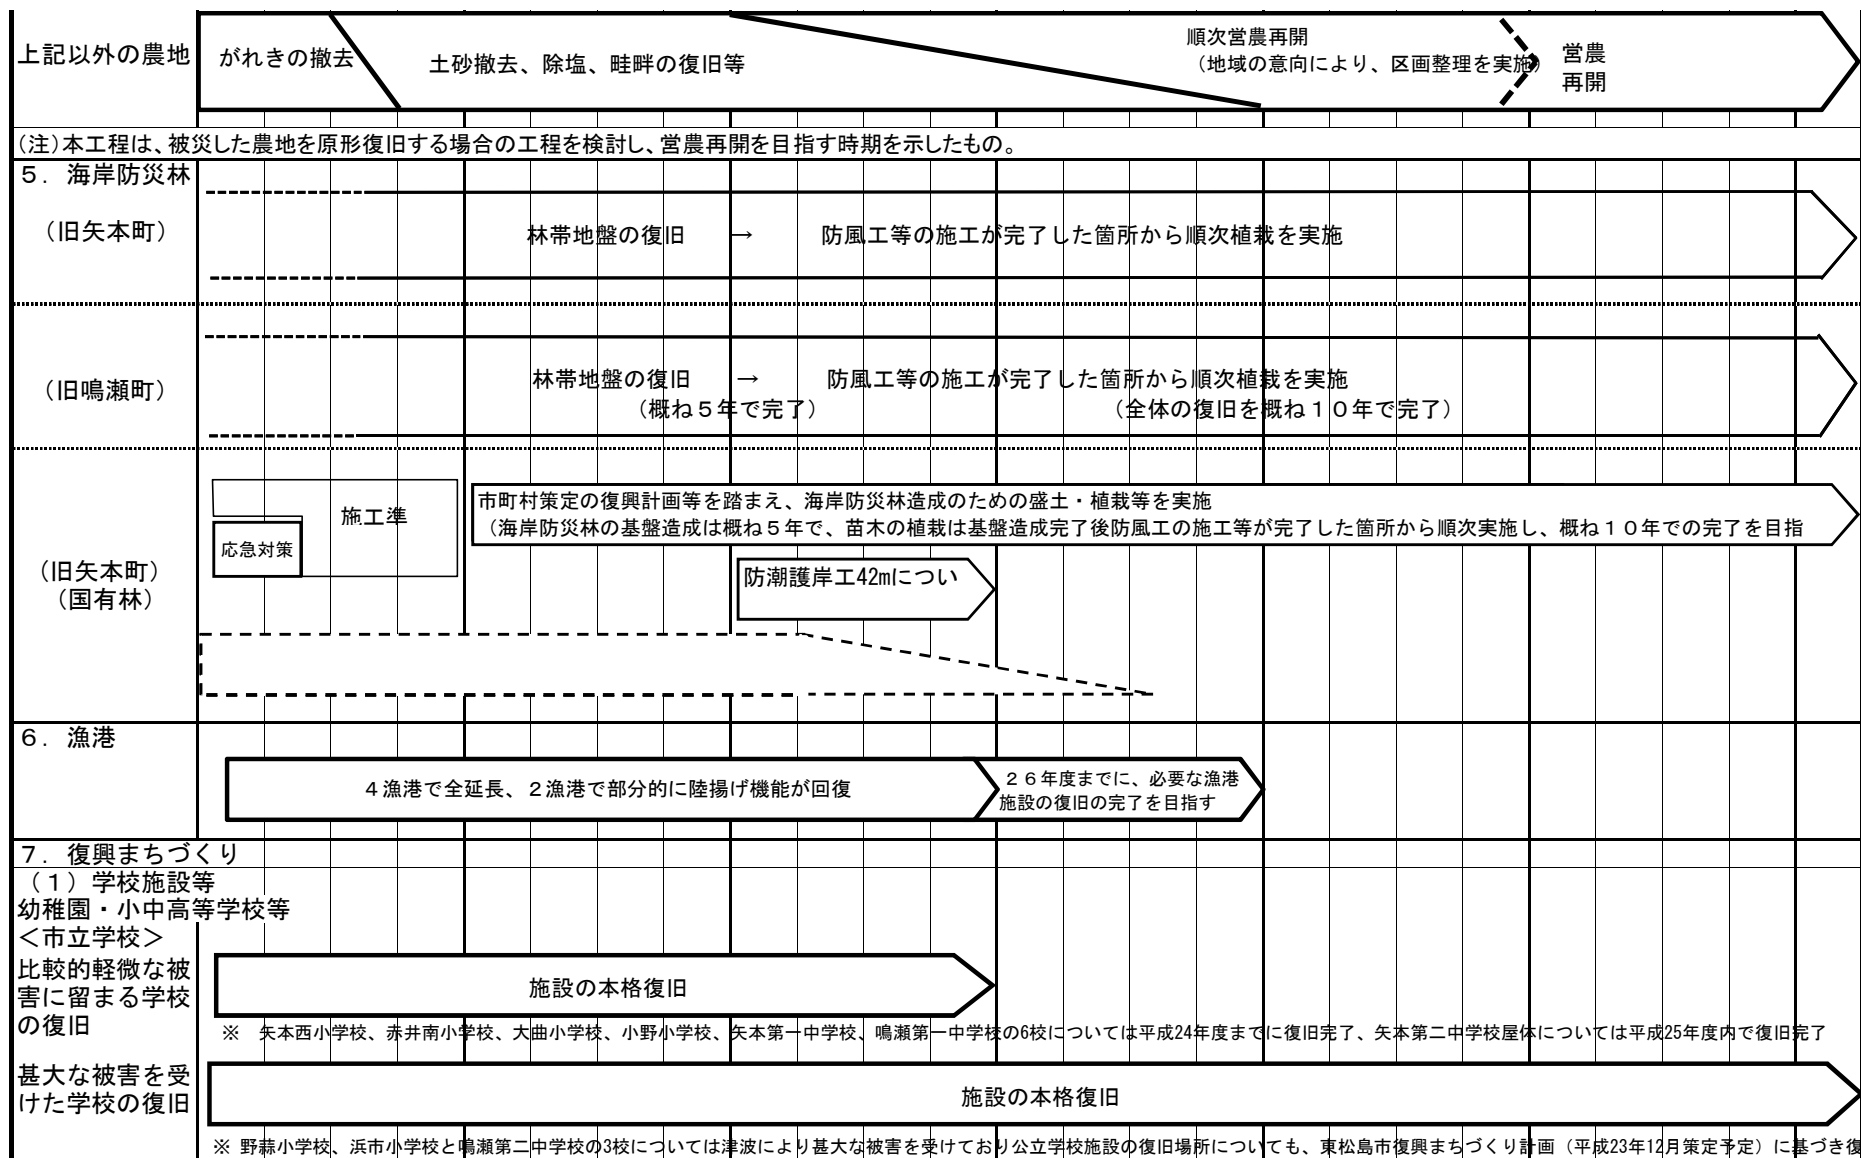

<県立学校> 比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧
<私立学校> 比較的軽微な被害に留まる学校の復旧	校舎等の本格復旧
甚大な被害を受けた学校の復旧	代替施設確保 移転場所選定 校舎等の本格復旧
公立社会教育施設（公立体育施設・公立文化施設を含む） <市立社会教育施設>	※ 津波による被害を受けたのびる幼稚園は、平成26年3月までに復旧場所を確定
比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧 ※ 公民館16施設については平成23年度から平成24年度にかけて復旧完了。
甚大な被害を受けた社会教育施設施設の復旧	施設の本格復旧 ※大曲市民センター、南区東地区センターの2施設は平成24年度までに、立沼地区センターについては平成25年度に復旧完了した。
比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧 ※ コミュニティセンター、図書館、奥松島縄文村の3施設については平成24年度まで復旧完了。
<市立社会体育施設>	
比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧 ※ 市民体育館、赤井地区体育館、小野地区体育館、鷹来の森運動公園、矢本運動公園の5施設については平成24年度までに復旧完了。
甚大な被害を受けた社会教育施設施設の復旧	施設の本格復旧 ※ 大曲地区体育館及び奥松島運動公園は津波により甚大な被害を受けており社会体育施設施設の復旧場所についても、東松島市復興まちづくり計画（平成23年12月策定予定）に基づき復旧する。
<県立社会教育施設>	
甚大な被害を受けた施設の復旧	※津波による被害を受けた松島自然の家は、復旧場所を確定させ本格復旧を行っていく。 本格復旧

8. 土砂災害対策	土砂災害 危険箇所の 点検等	緊急的な土砂災害対策の実施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-----------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
