

事業計画（福島県いわき市）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

| | |
|----------------|--------|
| 市内の地区海岸数 | 37地区海岸 |
| 被災した地区海岸数 | 29地区海岸 |
| 応急対策を実施した地区海岸数 | 7地区海岸 |
| 本復旧を実施する地区海岸数 | 29地区海岸 |
| 復興を実施する地区海岸数 | 6地区海岸 |

② 堤防高

平成23年10月8日に堤防高を公表[※]。

| | |
|------------|-------------------------------|
| 広野海岸 | : T.P. 8.7m (対象津波: 明治三陸タイプ地震) |
| 久之浜海岸 | : T.P. 7.2m (対象: 高潮) |
| 四倉海岸・平海岸① | : T.P. 7.2m (対象: 高潮) |
| 平海岸②・磐城海岸① | : T.P. 7.2m (対象: 高潮) |
| 磐城海岸② | : T.P. 7.2m (対象: 高潮) |
| 勿来海岸 | : T.P. 7.2m (対象: 高潮) |

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③ 復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成23年12月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成23年12月より順次工事に着手し、概ね平成29年度での完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成25年7月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成25年3月より順次工事に着手し、概ね平成29年度での完了を目指す。

④ 平成26年度における成果

- ・新たに、5地区海岸において、本復旧工事に着工した。(累計28地区海岸)
- ・全ての復興工事で着工した。(累計6地区海岸)

⑤ 平成27年度における成果

- ・新たに、8地区海岸において本復旧工事を完了した。(累計10地区海岸)
- ・新たに、1地区海岸において復興工事を完了した。(累計2地区海岸)

⑥ 平成28年度の成果目標

- ・全ての地区海岸において本復旧工事の着工を目指す。(累計29地区海岸)
- ・新たに、11地区海岸において本復旧工事の完了を目指す。(累計21地区海岸)
- ・新たに、2地区海岸において復興工事の完了を目指す。(累計4地区海岸)

⑦ 事業完了予定年度

平成29年度

⑧ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

いわき市

| 市町村 | 地区海岸名 | 堤防護岸延長(m) | 主な施設 | 施設の高さ(T.P) | | 応急対策 | 復旧・復興の予定 | | | | | | H27年度の実施内容等 | H28年度の実施内容等 | その他の場合に詳細を記載 | 備考 | |
|------|--------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------------|----|---------|
| | | | | 被災前現況高(m) | 被災後復旧高(m) | | 概要計画策定 | 詳細計画策定 | 左記の実施状況 | 工事着工 | 左記の実施状況 | 工事完了 | | | | | 左記の実施状況 |
| いわき市 | 久之浜漁港 久之浜 | 45 | 護岸 | 6.20 | 7.20 | — | H23.12 | H25.1 | 策定済み | H26.3 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事实施 | 本工事实施 | | 復旧 |
| いわき市 | 四倉漁港 田之網 | 481 | 離岸堤 | 5.69 | 7.20 | — | H23.10 | H24.3 | 策定済み | H24.4 | 着工済み | H27.12 | 完了済み | 本工事实施 | 本工事实施 | | 復旧 |
| いわき市 | 四倉漁港 志津 | 284 | 護岸 | 6.19 | 7.20 | — | H23.12 | H27.10 | 策定中 | H28.5 | 着工予定 | H30.3 | 完了予定 | 地権者等との調整 | 本工事实施予定 | | 復旧 |
| いわき市 | 四倉漁港 四倉 | 1,218 | 防潮堤、離岸堤 | 6.19 | 7.20 | — | H23.12 | H25.3 | 策定済み | H24.4 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 本工事实施 | 本工事实施 | | 復旧 |
| いわき市 | 豊間漁港 沼ノ内 | 292 | 護岸、消波堤 | 5.44 | 7.20 | — | H23.12 | H25.3 | 策定済み | H24.8 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | H27完 | — | | 復旧 |
| いわき市 | 豊間漁港 薄磯 | 1,275 | 護岸、消波堤、人工リーフ | 4.94 | 7.20 | 完了 | H23.12 | H25.3 | 策定済み | H25.3 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 本工事实施 | 本工事实施 | | 復旧 |
| いわき市 | 豊間漁港 豊間(B) | 0 | 消波堤 | — | — | — | H23.12 | H24.3 | 策定済み | H24.4 | 着工済み | H27.9 | 完了済み | H27完 | — | | 復旧 |
| いわき市 | 豊間漁港 豊間 | 1,129 | 護岸、人工リーフ | 5.44 | 7.20 | 完了 | H23.12 | H25.3 | 策定済み | H25.3 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 本工事实施 | 本工事实施 | | 復旧 |
| いわき市 | 小浜漁港海 岸 小浜地区 | 168 | 護岸 | 4.74 | 7.20 | 完了 | H23.12 | H25.3 | 策定済み | H25.9 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | H27完 | — | | 復旧 |
| いわき市 | 勿来漁港海 岸 九面地区 | 262 | 離岸堤 | 4.74 | 7.20 | — | H23.12 | H24.3 | 策定済み | H24.3 | 着工済み | H24.11 | 完了済み | — | — | | 復旧 |
| いわき市 | 末続 | 354.0 | 護岸、消波堤 | 6.20 | 8.70 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H26.3 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 金ヶ沢 | 155.0 | 護岸、消波堤 | 6.20 | 8.70 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H25.10 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 久之浜 | 2,466.0 | 堤防、護岸、消波堤、離岸堤、人工リーフ | 6.20 | 7.20 | — | H23.11 | H24.11 | 策定済み | H24.10 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 仁井田 | 3,100.0 | 堤防、護岸、消波堤、離岸堤 | 6.20 | 7.20 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H24.8 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 草野下神谷 | 1,410.0 | 堤防、消波堤 | 6.20 | 7.20 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H25.6 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 夏井 | 2,753.0 | 堤防、護岸、突堤、消波堤、離岸堤 | 6.20 | 7.20 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H23.12 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 沼ノ内 | 1,338.0 | 堤防、消波堤 | 6.20 | 7.20 | — | H23.10 | H25.3 | 策定済み | H26.8 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |

| 市町村 | 地区海岸名 | 堤防護岸延長(m) | 主な施設 | 施設の高さ(T.P) | | 応急対策 | 復旧・復興の予定 | | | | | | H27年度の実施内容等 | H28年度の実施内容等 | その他の場合に詳細を記載 | 備考 | |
|------|----------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------------|----|---------|
| | | | | 被災前現況高(m) | 被災後復旧高(m) | | 概要計画策定 | 詳細計画策定 | 左記の実施状況 | 工事着工 | 左記の実施状況 | 工事完了 | | | | | 左記の実施状況 |
| いわき市 | 豊間 | 1,317.0 | 堤防 | 5.40 | 7.20 | 完了 | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H25.10 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | 本工事等 | — | | 復旧 |
| いわき市 | 永崎 | 2,015.0 | 堤防、護岸、離岸堤 | 6.20 | 7.20 | 完了 | H23.10 | H25.3 | 策定済み | H24.6 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 下神白 | 265.0 | 堤防 | 6.20 | 7.20 | 完了 | H23.10 | H25.3 | 策定済み | H26.2 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 岩間佐糠 | 1,924.0 | 堤防、護岸 | 4.40 ~6.20 | 7.20 | 完了 | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H25.10 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 錦町 | 1,268.0 | 堤防、護岸、離岸堤、人工リーフ | 5.40 | 7.20 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H25.10 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 関田 | 3,066.0 | 堤防、護岸、消波堤、離岸堤、人工リーフ | 6.00 | 7.20 | — | H23.11 | H24.11 | 策定済み | H24.5 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 江名港 江ノ浦 | 341 | 堤防(防潮堤) | 5.74 | 7.20 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H26.10 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 江名港 走出A・C | 307 | 堤防(防潮堤) | (走出A) 5.74 (走出C) 2.64 | (走出A) 7.2 (走出C) 2.64 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H26.10 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | 本工事等 | — | | 復旧 |
| いわき市 | 中之作港 中之作 | 377 | 堤防(防潮堤) | 5.74 | 7.20 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H26.9 | 着工済み | H27.8 | 完了済み | 本工事等 | — | | 復旧 |
| いわき市 | 中之作港 岸浦 | 412 | 堤防(防潮堤) | 4.94 | 7.20 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H26.10 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復旧 |
| いわき市 | 中之作港 永崎 | 519 | 緩傾斜堤、護岸 | 4.94 | 7.20 | — | H23.11 | H25.3 | 策定済み | H25.9 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | 本工事等 | — | | 復旧 |
| いわき市 | 久之浜港 金ヶ沢 | 0 | 離岸堤 | — | — | — | H23.11 | H24.6 | 策定済み | H24.8 | 着工済み | H25.9 | 完了済み | — | — | | 復旧 |
| いわき市 | 夏井地区 | 0 | 築堤 920m | 4.00 | 7.20 | — | H24.9 | H24.12 | 策定済み | H25.3 | 着工済み | H25.10 | 完了済み | — | — | | 復興 |
| いわき市 | 豊間地区 | 600 | 築堤 212.7m 堤防嵩上げ 407.4m 樋門 1.0基 | 5.40 | 7.20 | — | H25.9 | H26.3 | 策定済み | H26.9 | 着工済み | H29.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復興 |
| いわき市 | 永崎地区 | 0 | 樋門工 1基 堤防工 23.2m | 4.20 | 7.20 | — | H25.9 | H26.3 | 策定済み | H26.10 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復興 |
| いわき市 | 四倉漁港 四倉 | 無堤 | 堤防、水門 | 1.20 | 7.20 | — | H23.12 | H26.3 | 策定済み | H26.12 | 着工済み | H30.3 | 完了予定 | 本工事実施 | 本工事実施 | | 復興 |
| いわき市 | 小浜漁港 小浜 | 無堤 | 堤防、付替道路 | 3.70 | 7.20 | — | H23.12 | H26.3 | 策定済み | H26.10 | 着工済み | H28.3 | 完了済み | 本工事実施 | 本工事実施 | | 復興 |
| いわき市 | 中ノ作港 永崎、中之作 | 無堤 | 堤防L=320m 陸蘭3箇所 | 0.00 | 7.20 | — | H25.3 | H26.3 | 策定済み | H26.8 | 着工済み | H28.6 | 完了予定 | 本工事等 | 本工事等 | | 復興 |

2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

① 2級水系夏井川水系など^{※1}の県・市管理区間では、全箇所^{※2}の災害査定を完了し、85箇所^{※2}で災害復旧事業を予定。そのうち、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊急度の高い5箇所については大型土のう積み等による応急対策を完了。
本復旧については、平成27年度までに、全箇所^{※2}で着手。うち、75箇所^{※2}で完了。

② 平成26年度に、全箇所^{※2}で本復旧に着手。
また、平成28年度内に6箇所（累計81箇所）で本復旧完了予定。
今後は、平成30年度末に全箇所^{※2}完了が図られるよう、進捗を図る。

③ 平成26年度までの成果

- ・ 全箇所（85箇所）で災害査定を完了（平成24年度）
- ・ 全箇所^{※2}で本復旧に着手

④ 平成27年度における成果

- ・ 全ての河川において、工事の進捗を図った。
- ・ 本復旧の完了箇所数は、以下の通り
平成27年度末まで : 75箇所

⑤ 平成28年度の成果目標

- ・ 6箇所^{※2}で本復旧完了予定（累計81箇所）。
- ・ 残4箇所^{※2}について、平成30年度末に完了が図られるよう、工事の進捗を図る。
（工事に係る各種調整について完了済み）

⑥ 事業完了予定年度
平成30年度

※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる

復興施策の事業計画 参考図面 河川 いわき市



いわき市

【県管理河川】

- 17水系 42河川 85箇所
- (二) 塩民川水系 1河川 1箇所
 - (二) 横内川水系 1河川 1箇所
 - (二) 夏井川水系 10河川 26箇所
 - (二) 滑津川水系 1河川 3箇所
 - (二) 境川水系 1河川 1箇所
 - (二) 鮫川水系 11河川 22箇所
 - (二) 渚川水系 1河川 1箇所
 - (二) 神白川水系 2河川 5箇所
 - (二) 諏訪川水系 2河川 3箇所
 - (二) 大久川水系 1河川 1箇所
 - (二) 大平川水系 1河川 1箇所
 - (二) 藤原川水系 5河川 11箇所
 - (二) 蛭田川水系 1河川 4箇所
 - (二) 浜川水系 1河川 1箇所
 - (二) 弁天川水系 1河川 1箇所
 - (二) 末続川水系 1河川 2箇所
 - (二) 藪川水系 1河川 1箇所

| 凡例 | |
|--|-------------|
| — | 1級河川 (郡轄区間) |
| — | 1級河川 |
| — | 2級河川 |
| | 統制局 |
| | 監視局 |
| ● | 雨量局 (福島県) |
| ○ | 雨量局 (建設省) |
| ▲ | 水位局 (福島県) |
| △ | 水位局 (建設省) |
| ★ | 中継局 |

3. 下水道対策

① 目的

東日本大震災からの復興に向け、復興を加速させることを目的として甚大な面的被害からの復興地域づくりに必要となる事業を行うもの

② 公共下水道事業

四倉地区 : 対象地域約 25ha 管渠延長約 5.6 km
: 平成 24 年度 污水管渠工事 3 件 25 年度 3 件完了
: 平成 25 年度 污水管渠工事 2 件 26 年度 2 件完了
: 平成 26 年度 污水管渠工事 5 件 26 年度 3 件完了
27 年度 2 件完了

小名浜地区 : 対象地域約 12ha 管渠延長約 3.2 km
: 平成 24 年度 実施設計 1 件 25 年度完了
: 平成 25 年度 実施設計 1 件 26 年度完了
合流管渠工事 1 件 26 年度完了
: 平成 26 年度 污水管渠工事 1 件 27 年度完了
雨水函渠工事 3 件 27 年度完了
: 平成 27 年度
污水管渠工事 1 件 27 年度完了
雨水函渠工事 2 件 27 年度完了
雨水函渠工事 1 件 28 年度完了予定
: 平成 28 年度 污水管渠工事 1 件 28 年度完了予定

③ 都市下水路事業

久之浜地区 : 対象地域約 22ha ポンプ場 能力約 3 m³/S
: 平成 24 年度 実施設計委託 1 件 25 年度完了
: 平成 26 年度 放流渠工事 2 件 27 年度完了
: 平成 27 年度 ポンプ場建設工事 1 件 28 年度完了予定
: 平成 28 年度 ポンプ場建設工事 5 件 29 年度完了予定
: 平成 29 年度 ポンプ場建設工事 1 件 29 年度完了予定

④ 事業完了予定年度

平成 29 年度

4. 交通網

自治体管理道路 島・住吉線外2路線

- ① 箇所名：島・住吉線、根小屋1号線、橋出馬落前線

- ② 3路線については、平成27年3月にすべて復旧を完了。
平成27年3月までに広域迂回解消済み。
現在、道路パトロール等により、監視及び維持管理を行っている。

- ③ 平成26年度における成果
平成26年度において、道路2箇所及び橋梁3箇所を施工し、平成27年3月までに全路線の復旧工事を完了。


- ④ 事業完了年度
平成26年度

北端(福島市飯坂町竜ヶ岳:北緯37° 58' 28")

復興施策の事業計画 参考図面 道路 福島県いわき市

西端(南会津郡只見町毛猛山:東経139° 10' 1")

東端(双葉郡浪江町請戸:東経141° 2' 45")

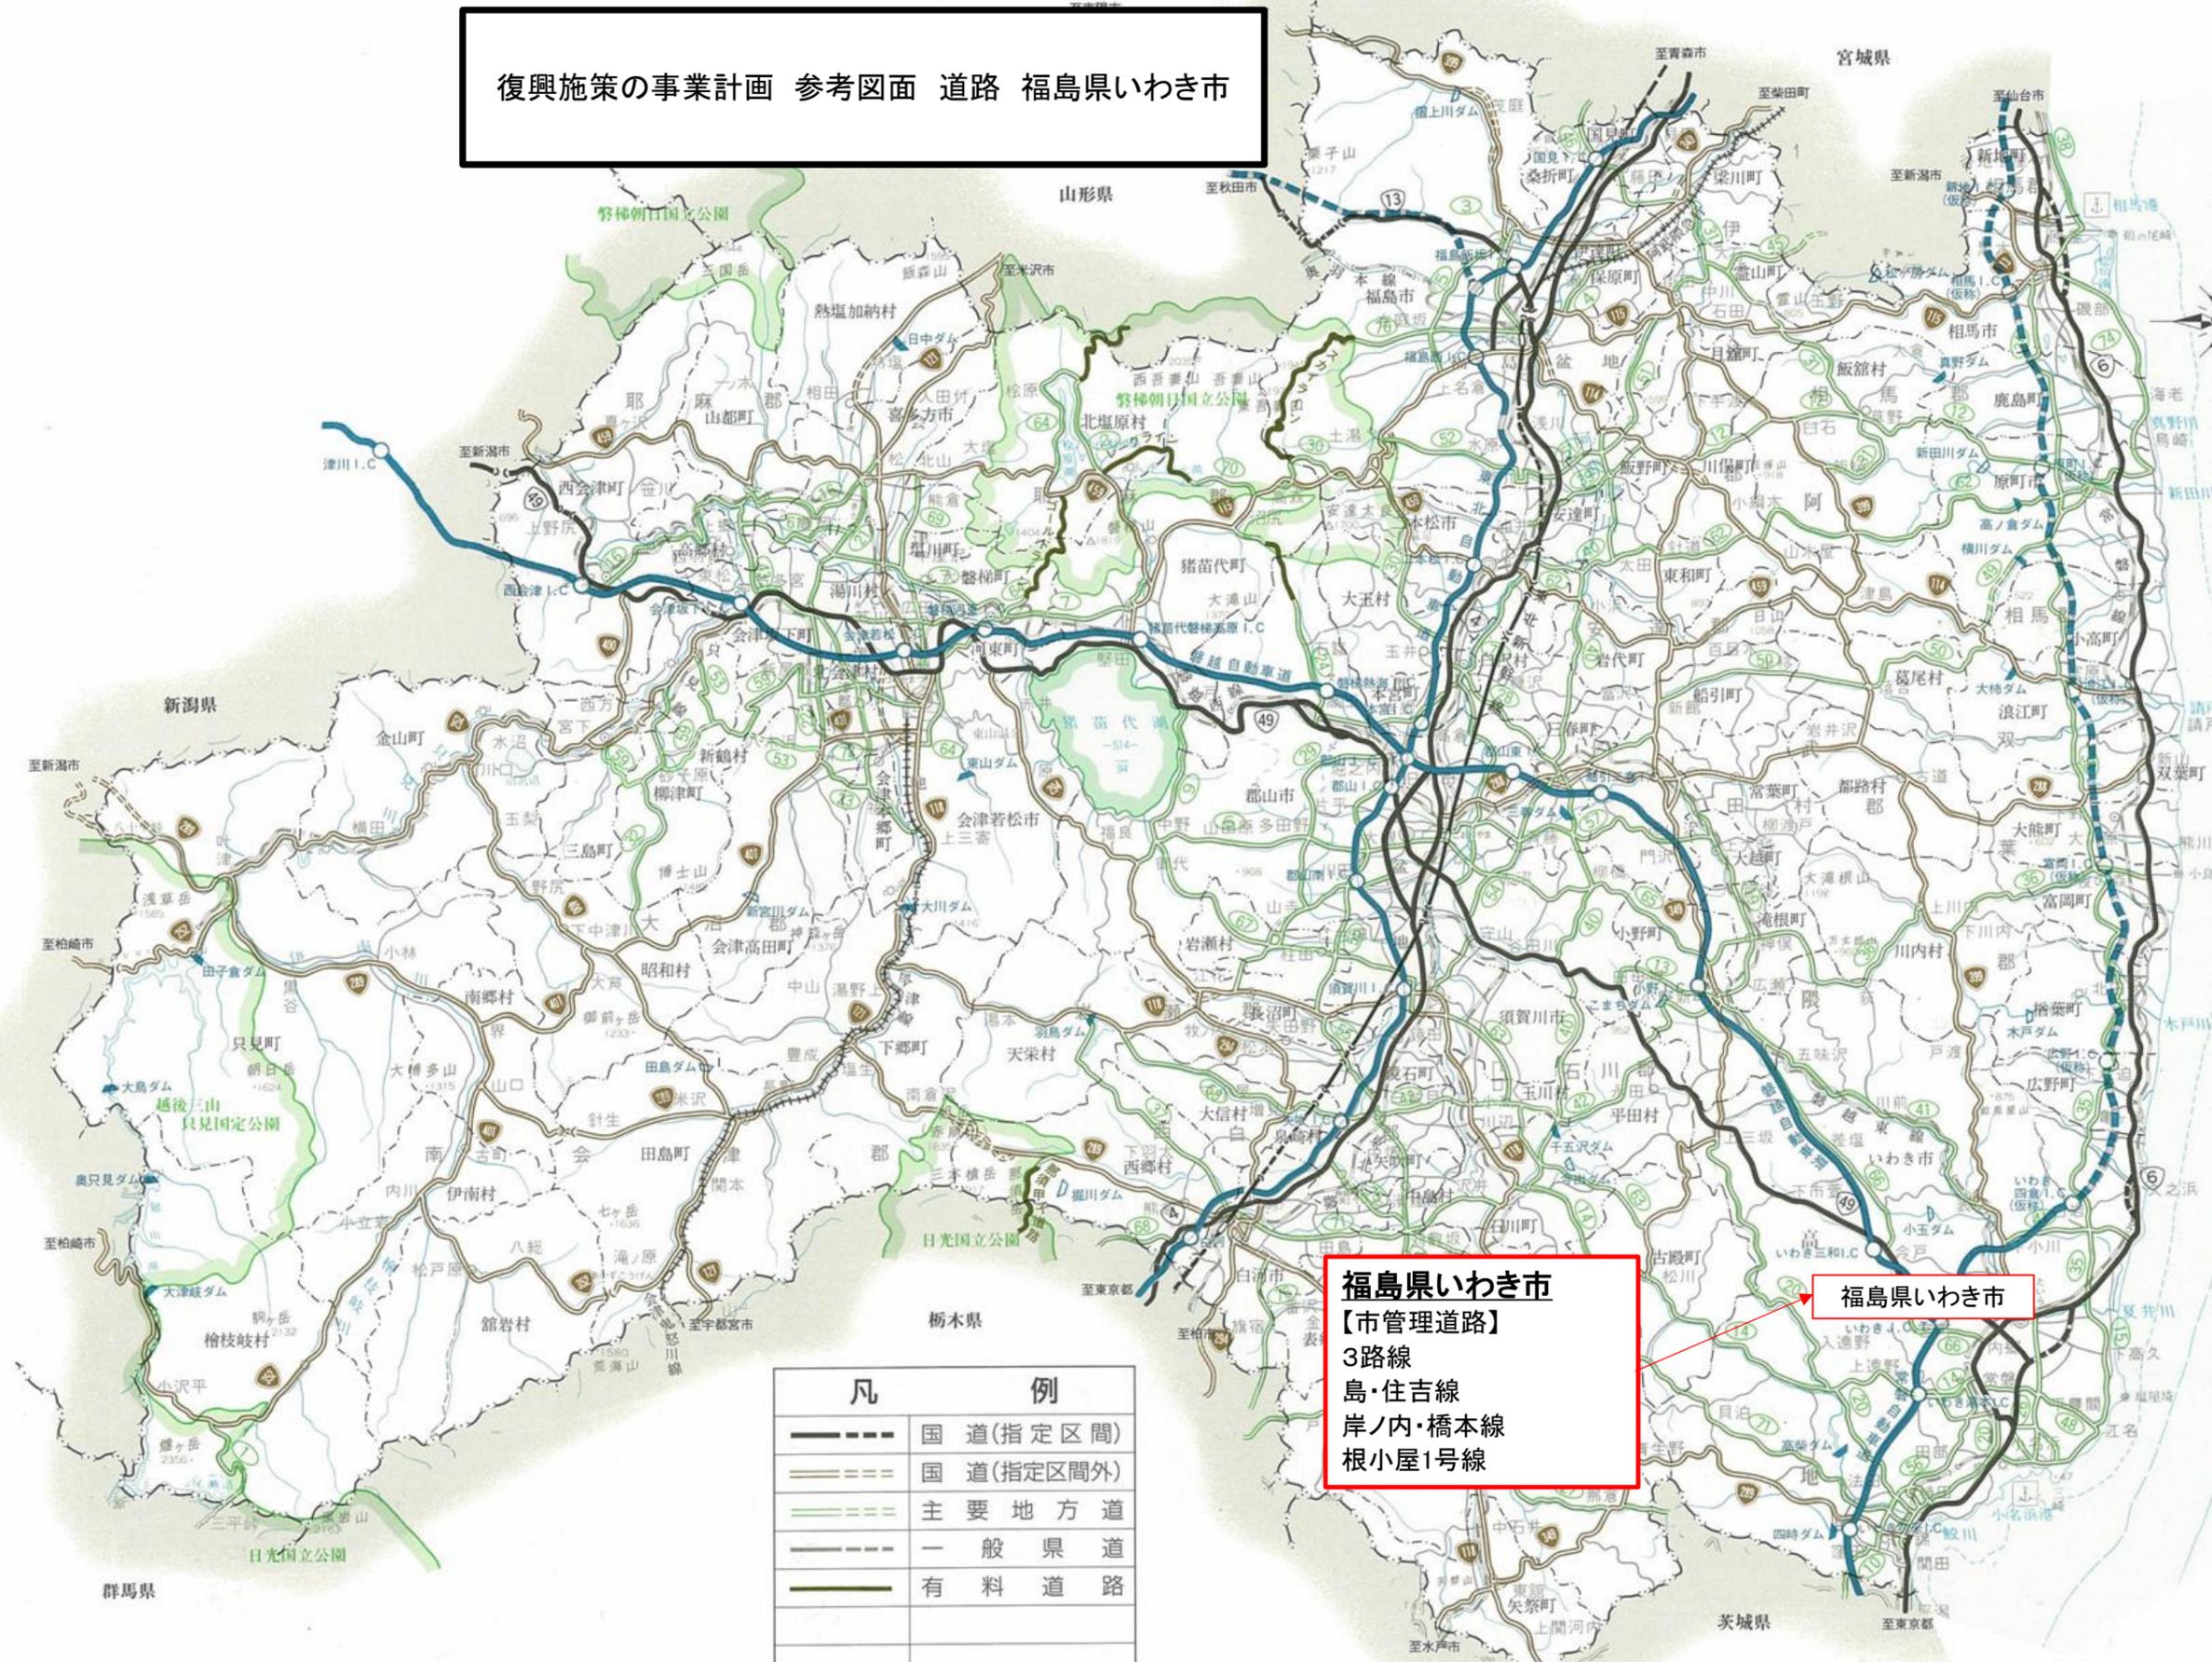

| 凡 | 例 |
|-----|-----------|
| ——— | 国道(指定区間) |
| ——— | 国道(指定区間外) |
| ——— | 主要地方道 |
| ——— | 一般県道 |
| ——— | 有料道路 |

福島県いわき市
【市管理道路】
 3路線
 島・住吉線
 岸ノ内・橋本線
 根小屋1号線

福島県いわき市

1:500,000



南端(東白川郡矢祭町明神:北緯36° 47' 19")

5. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約 180ha の農地及び排水路等の農業用施設に甚大な被害

② 農地の復旧状態

平成 24 年度までに復旧を完了した。

○平成 23 年度当初から既に営農再開が可能な農地 約 60ha

○平成 24 年度から営農再開が可能な農地 約 90ha

③ 区画整理等の実施状況

下仁井田地区等において、大区画化等の区画整理を実施しているところ。

④ 事業完了年度

平成 24 年度

6. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 下長沢、金ヶ沢南、南横手、新舞子

② 被災状況

下長沢、金ヶ沢南は、津波により防潮工（根固工）1,541mが崩れる等の被害を受けた。南横手は、津波により防潮工 750mが沈下、転倒する等の被害を受けた。新舞子では、林帯地盤 18ha（既保安林面積）が地震により地盤沈下するとともに、森林が津波により塩害を受けた。

③ 事業計画の内容

被災した防潮工は、治山施設災害復旧事業により復旧する。被災した林帯地盤及び森林については、防災林造成事業により整備する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防潮工の復旧工事については、平成 24 年度に着手し、平成 26 年度に完了した。森林造成については、平成 24 年度に植栽に着手し、平成 27 年度に完了させる。

⑤ 平成 26 年度における成果

治山施設災害復旧事業： 防潮工 750m の復旧を完了。

防災林造成事業： 植栽工 1 ha に着手。

⑥ 平成 27 年度における成果目標（集中復興期間の成果目標）

防災林造成事業： 植栽工 1 ha の実施。

⑦ 事業完了予定年度

平成 27 年度

7. 漁港

① 被害状況

漁港数：5 漁港

被災漁港数：5 漁港

② これまでの実施状況と今後の予定

いわき市内の各被災5漁港においては、平成27年度末時点で、5漁港ですべての岸壁の使用が可能となっている。

今後、平成29年度までに、漁港施設の復旧完了を目指す。

③ 事業完了予定年度

平成29年度

8. 復興まちづくり

(1) 津波復興拠点整備事業

① 地区名：小名浜港背後地地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成23年度から津波復興拠点整備事業に着手。

③ 平成27年度までの成果

平成24年11月に一団地の津波防災拠点市街地形成施設事業として都市計画決定し、平成25年2月に事業認可、平成26年12月に工事着手している。

④ 平成28年度の成果目標

平成28年度の事業完了に向けて着実に工事を進めていく。

⑤ 事業完了予定年度

平成28年度

(2) 造成宅地滑動崩落緊急対策

① 地区名：常磐西郷町忠多地区、泉もえぎ台地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成24年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事に着手。25年度末までに工事完了。

③ 事業完了年度

平成25年度

(3) 学校施設等

① 幼稚園・小中高等学校等

(i) 公立学校

<いわき市立学校>

東日本大震災により被災した市立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に内定・申請予定の64校については、以下のとおり。

○ 58校については補修復旧で対応し、25年度までに復旧が完了した。残る6校のうち、3校（植田小学校屋内運動場及び泉中学校屋内運動場の改築復旧、永崎小学校敷地造

成)についても、平成26年度までに復旧が完了した。

残りの3校(豊間中学校校舎及び屋内運動場、田人中学校屋内運動場及びプール、江名中学校武道場)については、平成28年度内(豊間中学校屋内運動場については平成29年度内)に復旧を完了させることを目標とする。

- 津波により甚大な被害を受けた豊間中学校については、平成26年度までに移転先の用地確保及び地質調査、建物の実設計等が完了し、平成27年度中に建物の本体工事に着手しており、平成29年夏以降に復旧完了を目標とする。
- また、田人中学校屋内運動場及びプール、江名中学校武道場については、学校関係者等との協議を踏まえ、平成26年度に施設の整備方針を決定し、事業着手したところであり、平成28年度内に復旧完了予定である。

<いわき市立学校給食共同調理場>

東日本大震災により被災した学校給食共同調理場のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請し又は申請予定の4施設については、以下のとおり。

- 比較的軽微な被害に留まる3施設については、24年度までに復旧を完了した。
- 甚大な被害を受けた1施設(勿来学校給食共同調理場)については移転改築となり、平成25年度までに移転先の用地の確保及び地質調査、建物の実設計を完了した。平成26年6月20日には本体工事に着手しており、平成27年11月30日竣工し復旧完了した。

<県立学校>

いわき市に所在する県立学校で、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助を申請し、または申請予定の18校については、以下のとおり。

- 比較的軽微な被害に留まる11校については、平成25年3月までに復旧を完了した。
- 甚大な被害を受けた7校のうち4校については、平成25年度までに2校、平成26年度までに2校、平成27年度までに1校の復旧を完了した。残2校については、平成29年度までに2校の復旧完了を目標とする。

③ 公立社会教育施設(公立社会体育施設と公立文化施設を含む)

<いわき市立社会教育施設>

東日本大震災により被災した市立社会教育施設のうち、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請したまたは申請予定の44施設(教育:19、体育:21、文化:4)について、以下のとおり早期復旧を目指す。

- 比較的軽微な被害に留まる43施設(教育:18、体育:21、文化:4)については、補修復旧で対応する。このうち30施設(教育:17、体育:11、文化:2)については、

平成 23 年度に復旧が完了しており、補修に期間を要する 13 施設（教育：1、体育：10、文化：2）についても平成 24 年度をもって復旧は完了した。

- 津波等により甚大な被害を受け、移転も含めた総合的な検討が必要となった。1 施設（いわき市立江名公民館）については、平成 23 年 12 月に策定した当市の復興計画に基づき、平成 26 年度までに移転改築が完了し、復旧完了した。

<県立社会教育施設>

- ・福島県いわき海浜自然の家

施設建物本体に対する被害は比較的軽微に留まることから、平成 23 年度内に業務を再開するとともに、被害の大きい野外施設等に関しては平成 23 年度内に事業着手、平 25 年度内に復旧完了した。

- ・ふくしま海洋科学館（アクアマリンふくしま）

甚大な被害を受けたふくしま海洋科学館については、平成 25 年度内に復旧完了した。

9. 土砂災害対策

- ① 箇所名：上ノ台地区、駒谷地区、寺前地区、原木田地区、岸前地区、北口地区、堂田1号地区、江名口地区、石畑地区
- ② 平成23年8月末までに、市内約1,500箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施し、約70箇所で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。（降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を実施。）
- ③ これまでの強い地震動により崩壊が発生するなど危険な状態となっている上ノ台地区、駒谷地区、寺前地区、原木田地区、岸前地区、北口地区、堂田1号地区、江名口地区、石畑地区の主な緊急的な土砂災害対策について、平成25年度に完了。
- ④ 最大震度6弱を観測したいわき市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成23年3月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害の発生状況を考慮して基準を見直し、平成24年11月に通常基準への引き上げを実施。
- ⑤ 事業完了年度
平成25年度

10. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 934 千トン※（災害廃棄物が約 683 千トン、津波堆積物が約 252 千トン）が発生した。

② 搬入状況について

住民が生活している場所の近くに流出・飛散した災害廃棄物については、平成 23 年 8 月中に仮置場へ搬入した。家屋内等で発生した災害廃棄物についても、平成 24 年 3 月中に仮置場への搬入が完了した。その他の災害廃棄物、津波堆積物についても、平成 27 年 3 月末までに仮置場への搬入は完了した。

③ 処理状況について

平成 27 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 934 千トン※（災害廃棄物が 683 千トン、津波堆積物が約 252 千トン）の処理を全て完了した。

④ 事業完了年度

平成 26 年度

※）災害廃棄物等推計量、災害廃棄物推計量及び津波堆積物推計量は、各推計量の合計値を 100 トン単位で個別に四捨五入した値のため、千トンの誤差を生じる場合がある。

11. 都市公園

【復興関係】

- ① 地区名：久之浜地区、四倉地区、沼ノ内地区、薄磯地区、豊間地区、永崎地区、岩間地区、21世紀の森公園
- ② 豊間地区防災公園、津波防災緑地については、東日本大震災復興交付金を活用して、平成24年度から都市公園事業に着手。
- ③ 21世紀の森公園については、社会資本整備総合交付金（復興枠）を活用して、平成25年度から都市公園事業に着手。

④ 平成27年度までの成果

久之浜地区については、平成24年11月に津波防災緑地として都市計画決定し、平成25年9月に用地取得に着手、平成25年11月に工事着手している。

四倉地区については、平成25年2月に津波防災緑地として都市計画決定し、平成26年3月に工事着手している。

沼ノ内地区については、平成24年11月に津波防災緑地として都市計画決定し、平成25年9月に用地取得に着手、平成26年9月に工事着手している。

薄磯地区については、平成24年11月に津波防災緑地として都市計画決定し、平成25年9月に用地取得に着手、平成25年11月に工事着手している。

豊間地区については、そのうち津波防災緑地部分は平成24年11月に都市計画決定し、平成25年9月に用地取得に着手、平成25年11月に工事着手しており、防災公園部分は、平成24年11月に都市計画決定し、平成25年4月に用地取得に着手、平成26年12月に工事着手している。

永崎地区については、平成24年11月に津波防災緑地として都市計画決定し、平成26年10月に用地取得に着手、平成25年12月に工事着手（公有地先行）している。

岩間地区については、平成25年2月に津波防災緑地として都市計画決定し、平成25年9月に用地取得に着手、平成25年11月に工事着手している。

21世紀の森公園については、平成25年9月に災害時における救援物資の集積・分配機能を担う災害時拠点施設の測量設計に着手、平成27年3月に工事着手している。

⑤ 平成28年度の成果目標

豊間地区防災公園については、平成29年度の事業完了に向けて工事を進めていく。


津波防災緑地については、平成31年度の事業完了に向けて工事を進めていく。

21世紀の森公園については、災害時拠点施設整備の平成28年度の事業完了に向けて


工事を進めていく。

- ⑥ 事業完了予定年度
平成31年度

復興施策の工程表（福島県いわき市）



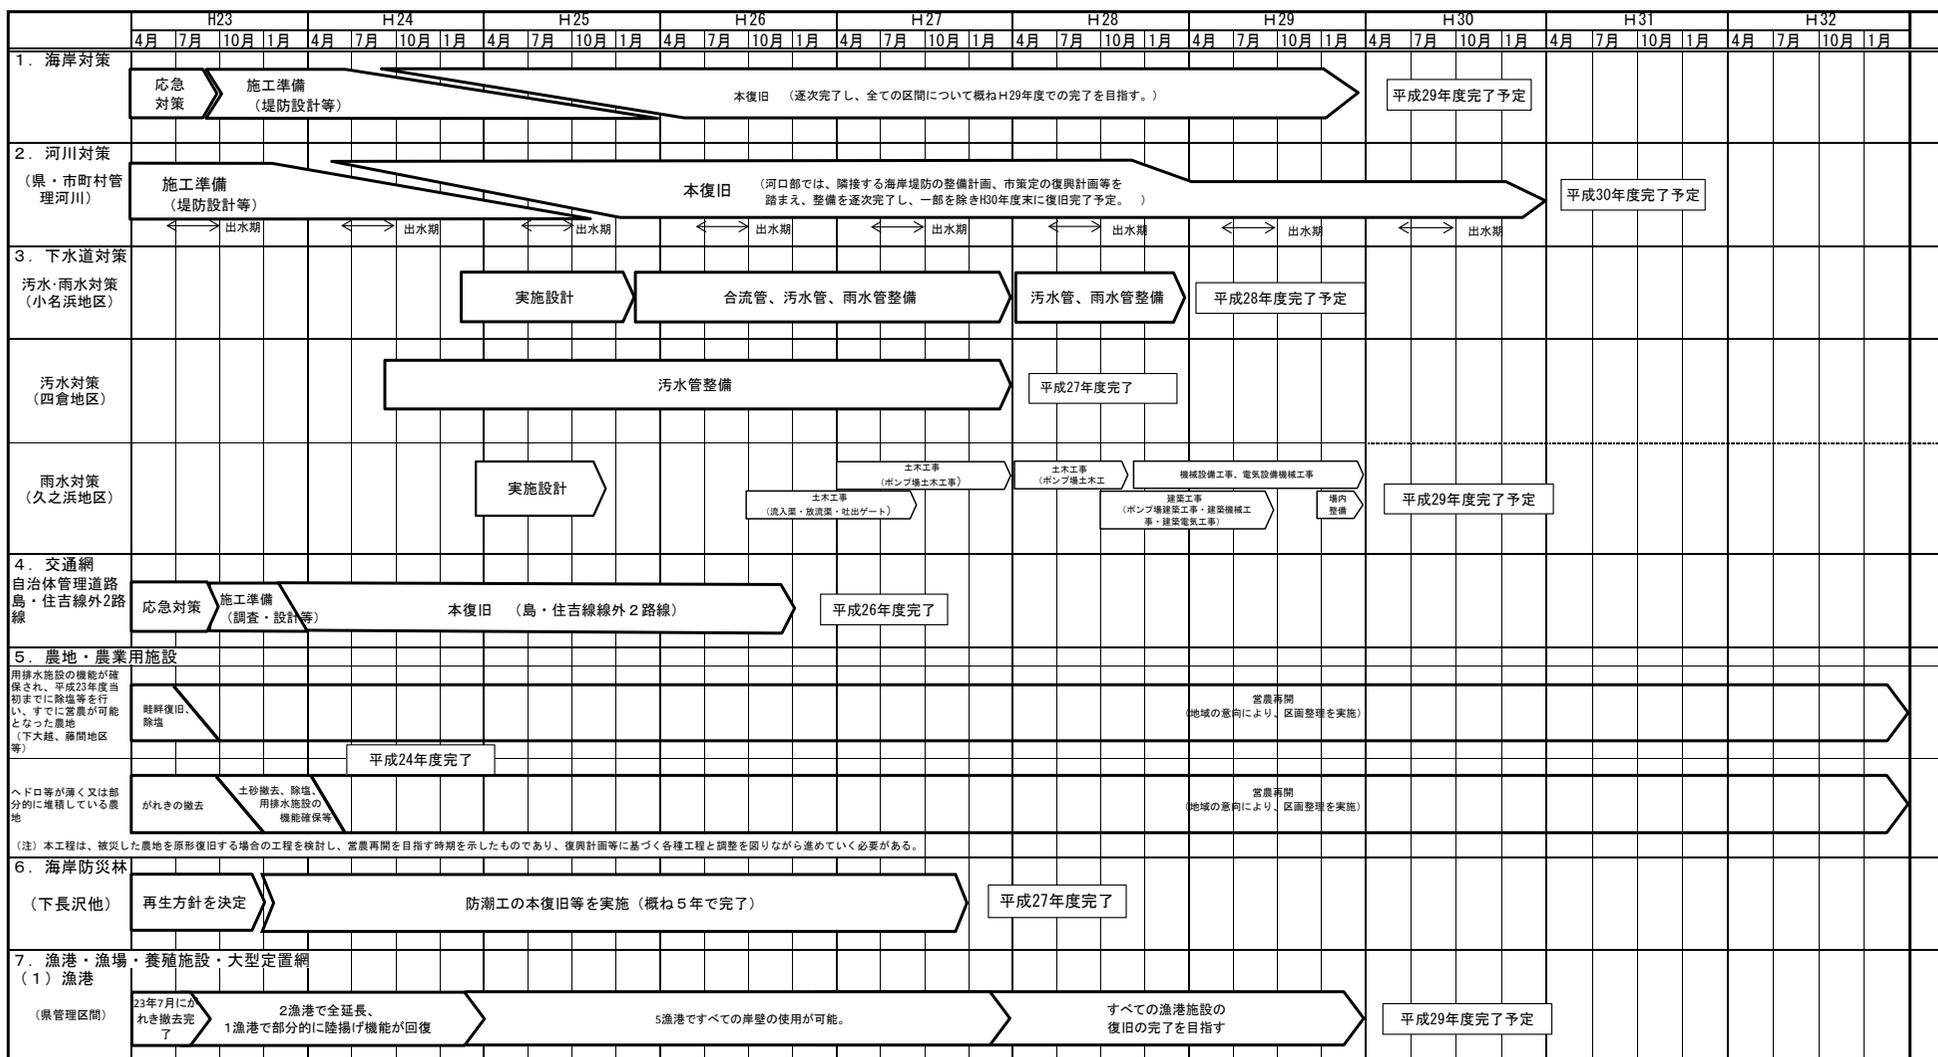


8. 復興まちづくり
 (1) 造成宅地滑動崩落緊急対策



(2) 学校施設等
 ○幼稚園・小中高等学校等
 <市立学校>

比較的軽微な被害に留まる学校の復旧



甚大な被害を受けた学校の復旧




校舎等の本格復旧




平成29年度完了予定

<市立学校給食共同調理場>

比較的軽微な被害に留まる学校給食共同調理場の復旧




甚大な被害を受けた学校給食共同調理場の復旧



平成27年度完了

<県立学校>

比較的軽微な被害に留まる学校の復旧



甚大な被害を受けた学校の復旧


応急仮設校舎の建設





平成29年度完了予定

<私立学校>

比較的軽微な被害に留まる学校の復旧



甚大な被害を受けた学校の復旧




平成29年度完了予定

※ 津波による被害を受けた久之浜第一幼稚園は、移転を含めた復旧計画を検討

○大学等

<私立学校>
 比較的軽微な被害に留まる学校の復旧



甚大な被害を受けた学校の復旧



平成24年度完了

