

事業計画（宮城県七ヶ浜町）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

町内の地区海岸数	9 地区海岸
被災した地区海岸数	9 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	6 地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	9 地区海岸
復興を実施する地区海岸	1 地区海岸

② 堤防高

平成 23 年 9 月 9 日に堤防高を公表[※]。

松島湾：T.P. 4.3m（対象津波：チリ地震）

七ヶ浜海岸①：T.P. 5.4m（対象津波：明治三陸地震）

七ヶ浜海岸②：T.P. 6.8m（対象津波：明治三陸地震）

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③ 復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 11 月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 24 年 10 月より順次工事に着手し、概ね平成 29 年度の完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成 23 年 11 月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 27 年 1 月より順次工事に着手し、概ね平成 27 年度での完了を目指す。

④ 平成 26 年度における成果

- ・新たに、2 地区海岸において本復旧工事に着工した。（累計 6 地区海岸）
- ・新たに、3 地区海岸において復興工事に着工した。（累計 3 地区海岸）

⑤ 平成 27 年度における成果

- ・全ての地区海岸において本復旧工事に着工した。（累計 9 地区海岸）
- ・全ての地区海岸において復興工事に着工した。（累計 5 地区海岸）

⑥ 平成 28 年度の成果目標

- ・新たに、4 地区海岸において本復旧工事の完了を目指す。(累計 4 地区海岸)
- ・新たに、2 地区海岸において復興工事の着工を目指す。(累計 2 地区海岸)

⑦ 事業完了予定年度

平成 29 年度

⑧ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H27年度の 実施内容等	H28年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
七ヶ浜町	菫蒲田漁港	343	護岸(胸壁)	5.19	6.80	—	H23.11	H25.6	策定済み	H26.1	着工済み	H30.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
七ヶ浜町	花淵浜	263.0	堤防、離岸堤	3.00	6.80	完了	H23.11	H24.12	策定済み	H28.2	着工済み	H30.3	完了予定	地元説明、用地取得、本工事等	用地取得、本工事等		復旧
七ヶ浜町	菫蒲田	1,691.0	堤防、護岸、突堤、人工リーフ	5.00	6.80	完了	H23.11	H24.12	策定済み	H25.3	着工済み	H30.3	完了予定	用地取得、本工事等	用地取得、本工事等		復旧
七ヶ浜町	松ヶ浜	469.0	護岸、離岸堤	6.20	6.80 6.20	完了	H23.11	H24.12	策定済み	H27.2	着工済み	H29.3	完了予定	本工事等	本工事等		復旧
七ヶ浜町	仙台塩釜港園寄浦	1,032	護岸、胸壁、その他(樋門、陸閘)	3.10	3.30	—	H23.11	H26.9	策定済み	H27.12	着工済み	H30.3	完了予定	本工事等	本工事等		復旧
七ヶ浜町	仙台塩釜港園寄浜・代ヶ崎浜	864	護岸、胸壁、その他(陸閘)	3.10	3.30	完了	H23.11	H26.6	策定済み	H28.3	着工済み	H30.3	完了予定		本工事等		復旧
七ヶ浜町	仙台塩釜港四ヶ崎	1,359	堤防、護岸、離岸堤、その他(陸閘)	3.10	3.30	完了	H23.11	H26.6	策定済み	H24.10	着工済み	H29.3	完了予定	本工事等	本工事等		復旧
七ヶ浜町	仙台塩釜港四嶋浜	1,067	堤防、その他(陸閘)	3.10	5.40	完了	H23.11	H26.9	策定済み	H27.3	着工済み	H28.9	完了予定	本工事等	本工事等		復旧
七ヶ浜町	仙台塩釜港磯浜	573	護岸、離岸堤	6.36	6.80	—	H23.11	H26.3	策定済み	H26.3	着工済み	H29.3	完了予定	本工事等	本工事等		復旧
七ヶ浜町	菫蒲田	—	離岸堤嵩上げ277m突堤嵩上げ100m	5.00	6.80	—	H23.11	H24.12	策定済み	H27.1	着工済み	H30.3	完了予定	本工事等	本工事等		復興

2. 河川対策

【県・市町村管理区間】

- ① 2級水系砂押川水系 ※¹ 旧砂押川の県管理区間では、全箇所^{※2}の災害査定を完了し、1箇所^{※2}で災害復旧事業を予定。

本復旧については、平成23年度内に、設計、地元調整等の施工準備を終え着手。

なお、七ヶ浜町の町管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事業はない。

- ② 全1箇所について、平成25年度に他事業との調整により廃工とした。

- ③ 平成25年度における成果

・本復旧に着手していた全箇所（1箇所）で他事業調整により廃工（累計1箇所）

- ④ 事業完了年度

平成24年度


※1 位置図を参照

※2 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる



七ヶ浜町
【県管理河川】
1水系 1河川 1箇所
(二)砂押川水系 1河川 1箇所

河川海岸総括表									
河川・海岸の別		河川	海岸	河川	海岸	河川	海岸	河川	海岸
河川	一級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
	二級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
	三級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
	四級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
	五級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
	六級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
	七級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
	八級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
	九級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
	十級河川	1	1	1	1	1	1	1	1
海岸	一級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1
	二級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1
	三級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1
	四級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1
	五級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1
	六級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1
	七級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1
	八級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1
	九級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1
	十級海岸	1	1	1	1	1	1	1	1



河川一覽表									
一級河川					二級河川				
河川名	延長(km)	流域面積(km ²)	平均流量(m ³ /s)	最大流量(m ³ /s)	河川名	延長(km)	流域面積(km ²)	平均流量(m ³ /s)	最大流量(m ³ /s)
1 北上川	154.00	83	1,000	2,000	1 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
2 大沢川	6.80	84	1,000	2,000	2 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
3 通達川	2.85	85	1,000	2,000	3 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
4 富士川	8.70	86	1,000	2,000	4 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
5 大沢川	1.50	87	1,000	2,000	5 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
6 大沢川	10.55	88	1,000	2,000	6 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
7 大沢川	1.50	89	1,000	2,000	7 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
8 大沢川	2.50	90	1,000	2,000	8 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
9 大沢川	3.40	91	1,000	2,000	9 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
10 大沢川	4.30	92	1,000	2,000	10 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
11 大沢川	5.20	93	1,000	2,000	11 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
12 大沢川	6.10	94	1,000	2,000	12 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
13 大沢川	7.00	95	1,000	2,000	13 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
14 大沢川	7.90	96	1,000	2,000	14 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
15 大沢川	8.80	97	1,000	2,000	15 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
16 大沢川	9.70	98	1,000	2,000	16 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
17 大沢川	10.60	99	1,000	2,000	17 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
18 大沢川	11.50	100	1,000	2,000	18 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
19 大沢川	12.40	101	1,000	2,000	19 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
20 大沢川	13.30	102	1,000	2,000	20 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
21 大沢川	14.20	103	1,000	2,000	21 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
22 大沢川	15.10	104	1,000	2,000	22 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
23 大沢川	16.00	105	1,000	2,000	23 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
24 大沢川	16.90	106	1,000	2,000	24 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
25 大沢川	17.80	107	1,000	2,000	25 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
26 大沢川	18.70	108	1,000	2,000	26 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
27 大沢川	19.60	109	1,000	2,000	27 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
28 大沢川	20.50	110	1,000	2,000	28 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
29 大沢川	21.40	111	1,000	2,000	29 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
30 大沢川	22.30	112	1,000	2,000	30 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
31 大沢川	23.20	113	1,000	2,000	31 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
32 大沢川	24.10	114	1,000	2,000	32 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
33 大沢川	25.00	115	1,000	2,000	33 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
34 大沢川	25.90	116	1,000	2,000	34 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
35 大沢川	26.80	117	1,000	2,000	35 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
36 大沢川	27.70	118	1,000	2,000	36 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
37 大沢川	28.60	119	1,000	2,000	37 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
38 大沢川	29.50	120	1,000	2,000	38 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
39 大沢川	30.40	121	1,000	2,000	39 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
40 大沢川	31.30	122	1,000	2,000	40 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
41 大沢川	32.20	123	1,000	2,000	41 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
42 大沢川	33.10	124	1,000	2,000	42 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
43 大沢川	34.00	125	1,000	2,000	43 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
44 大沢川	34.90	126	1,000	2,000	44 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
45 大沢川	35.80	127	1,000	2,000	45 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
46 大沢川	36.70	128	1,000	2,000	46 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
47 大沢川	37.60	129	1,000	2,000	47 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
48 大沢川	38.50	130	1,000	2,000	48 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
49 大沢川	39.40	131	1,000	2,000	49 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
50 大沢川	40.30	132	1,000	2,000	50 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
51 大沢川	41.20	133	1,000	2,000	51 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
52 大沢川	42.10	134	1,000	2,000	52 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
53 大沢川	43.00	135	1,000	2,000	53 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
54 大沢川	43.90	136	1,000	2,000	54 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
55 大沢川	44.80	137	1,000	2,000	55 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
56 大沢川	45.70	138	1,000	2,000	56 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
57 大沢川	46.60	139	1,000	2,000	57 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
58 大沢川	47.50	140	1,000	2,000	58 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
59 大沢川	48.40	141	1,000	2,000	59 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
60 大沢川	49.30	142	1,000	2,000	60 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
61 大沢川	50.20	143	1,000	2,000	61 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
62 大沢川	51.10	144	1,000	2,000	62 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
63 大沢川	52.00	145	1,000	2,000	63 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
64 大沢川	52.90	146	1,000	2,000	64 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
65 大沢川	53.80	147	1,000	2,000	65 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
66 大沢川	54.70	148	1,000	2,000	66 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
67 大沢川	55.60	149	1,000	2,000	67 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
68 大沢川	56.50	150	1,000	2,000	68 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
69 大沢川	57.40	151	1,000	2,000	69 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
70 大沢川	58.30	152	1,000	2,000	70 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
71 大沢川	59.20	153	1,000	2,000	71 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
72 大沢川	60.10	154	1,000	2,000	72 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
73 大沢川	61.00	155	1,000	2,000	73 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
74 大沢川	61.90	156	1,000	2,000	74 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
75 大沢川	62.80	157	1,000	2,000	75 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
76 大沢川	63.70	158	1,000	2,000	76 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
77 大沢川	64.60	159	1,000	2,000	77 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
78 大沢川	65.50	160	1,000	2,000	78 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
79 大沢川	66.40	161	1,000	2,000	79 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
80 大沢川	67.30	162	1,000	2,000	80 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
81 大沢川	68.20	163	1,000	2,000	81 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
82 大沢川	69.10	164	1,000	2,000	82 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
83 大沢川	70.00	165	1,000	2,000	83 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
84 大沢川	70.90	166	1,000	2,000	84 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
85 大沢川	71.80	167	1,000	2,000	85 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
86 大沢川	72.70	168	1,000	2,000	86 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
87 大沢川	73.60	169	1,000	2,000	87 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
88 大沢川	74.50	170	1,000	2,000	88 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
89 大沢川	75.40	171	1,000	2,000	89 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
90 大沢川	76.30	172	1,000	2,000	90 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
91 大沢川	77.20	173	1,000	2,000	91 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
92 大沢川	78.10	174	1,000	2,000	92 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
93 大沢川	79.00	175	1,000	2,000	93 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
94 大沢川	79.90	176	1,000	2,000	94 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
95 大沢川	80.80	177	1,000	2,000	95 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
96 大沢川	81.70	178	1,000	2,000	96 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
97 大沢川	82.60	179	1,000	2,000	97 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
98 大沢川	83.50	180	1,000	2,000	98 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
99 大沢川	84.40	181	1,000	2,000	99 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1
100 大沢川	85.30	182	1,000	2,000	100 山手川	2.70	0.1	0.1	0.1

3. 下水道対策

① 箇所名：七ヶ浜町代ヶ崎浜字立花、菖蒲田浜字中田地内

② 平成 25 年度における成果

高台住宅団地等造成及び公共施設整備工事に伴い、新たに整備される地区内 汚水管と既設汚水管までを接続。（平成 25 年度事業完了）

工期 平成 25 年 7 月 4 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

工事概要

代ヶ崎浜字立花地内

- ・ 管布設工 V U ϕ 200 31.00 m
- ・ 組立マンホール工（1 号組立） 1 箇所

菖蒲田浜字中田地内

- ・ 管布設工 V U ϕ 200 312.10 m
- ・ 組立マンホール工（1 号組立） 9 箇所

③ 事業完了年度

平成 25 年度

4. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約 180ha の農地及び排水機場、排水路等の基幹的農業用施設に甚大な被害

② 施設の復旧状況

平成 26 年度までに基幹的農業用施設の復旧を完了した。

○応急復旧状況

阿川排水機場、幹線排水路等の基幹的排水施設について実施済み。

○本格的な復旧状況

平成 25 年度までに、阿川沼排水機場等の復旧が完了。

平成 26 年度内に、葦ヶ森排水機場の復旧が完了。

③ 農地の復旧状況

平成 25 年度までに復旧を完了した。

○平成 24 年度から営農再開が可能な農地 約 46ha

○平成 25 年度から営農再開が可能な農地 約 130ha

④ 区画整理等の実施状況

七ヶ浜地区において、大区画化等の区画整理を実施しているところ。

⑤ 事業完了年度

平成 26 年度

5. 海岸防災林の再生

① 箇所名：七ヶ浜町

② 被災状況

津波により森林 6.1ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した森林（6.1ha）については、防災林造成事業により整備する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

森林造成については、平成 24 年度に林帯地盤の復旧に着手し、平成 29 年度の完了を目指す。

防災集団移転事業及び七ヶ浜まちづくり計画との調整を行い、事業計画の見直しを行った。

⑤ 平成 26 年度における成果

防災林造成事業： 防災集団移転事業との調整により林帯地盤を拡大させることとし、平成 27 年度以降の事業計画の見直しを行った。植栽工 1.3ha に着手。

⑥ 平成 27 年度の成果

防災林造成事業：植栽工 1.3ha を完了。

⑦ 平成 28 年度の成果目標

防災林造成事業：植栽工 1.0ha を実施。

⑧ 事業完了予定年度

平成 29 年度

（保全対象： 国道 58 号線、農地、人家（菖蒲田浜地区他））

① 箇所名：七ヶ浜地区（国有林）

② 被災状況

津波により森林 5ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した森林（5ha）の復旧については、防災林造成事業により整備する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

森林の造成については、七ヶ浜町復興計画及び他事業との調整等踏まえ、今後の再生方針を決定する予定。

防風工の施工等が完了した箇所から順次、植栽に着手し、平成 32 年度までの完了を目指す。

⑤ 平成 28 年度の成果目標

防災林造成事業： 植栽工約 3.0ha の実施。

⑥ 事業完了予定年度

平成 32 年度

（保全対象：県道、人家（菖蒲田浜地区他））

（なお、国有林内については、防災林造成事業により国が直接実施する。）

6. 漁港

① 被害状況

漁港数：2 漁港

被災漁港数：2 漁港

② これまでの実施状況と今後の予定

七ヶ浜町内の各被災 2 漁港において、平成 25 年度末時点で、全延長で陸揚げ機能が回復している。

今後、平成 29 年度までに全ての漁港施設の復旧の完了を目指す。

③ 事業完了予定年度

平成 29 年度

7. 復興まちづくり

(1) 学校施設等

① 幼稚園・小中高等学校等

(i) 公立学校

<町立学校>

東日本大震災により被災した町立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助を申請した5校と1施設について、以下のとおり復旧完了。

- 比較的大規模な被害を受けた4校については、災害査定を終了し平成23年度内に事業着手し、平成24年度内に補修復旧を完了した。
- 甚大な被害を受けた七ヶ浜中学校については、本格復旧までの間、応急仮設校舎を計画的に進めつつ、校舎等の本格復旧に向けて、災害査定を終了し平成23年度からの事業着手（実施設計等）、平成26年度内に改築復旧を完了した。
- 甚大な被害を受けた七ヶ浜町学校給食センターについては、平成23年度及び平成24年度に災害査定を受け、平成24年度から事業着手（基本設計・実施設計等）し、平成25年度内に移転改築復旧完了した。

(ii) 私立学校

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補助を申請した2校については、比較的軽微な被害にとどまったことから、平成23年度内の事業着手し、うち1校は平成23年度内に復旧完了しており、他の1校は平成25年1月に復旧完了した。

② 公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む）

<公立社会教育施設>

- 甚大な被害を受けた七ヶ浜町中央公民館及び七ヶ浜国際村については、平成23年度内に事業着手し復旧完了した。
- 甚大な被害を受けた七ヶ浜町亦楽地区公民館（図書センター）については、平成23年度に災害査定を受け、平成24年度内に被災した施設の解体を先行し、移転先については今後、七ヶ浜町の前期復興計画を踏まえながら総合的に検討を行い、速やかな復旧を目指す。
- 中央公民館施設内部の空調設備、非常用電源の整備などについては、災害査定を終え速やかに整備するとともに、応急仮設住宅敷地となっている中央公民館敷地内のパターゴルフ場について、応急仮設住宅撤去後、七ヶ浜町の前期復興計画も踏まえ速やかに本格復旧する。
- 比較的軽微な被害に留まる社会教育施設について、平成23年度に事業着手、完了した。

<公立社会体育施設>

- 甚大な被害を受けた七ヶ浜健康スポーツセンターについては、平成23年度及び2

4 年度に災害査定を受け事業着手し、平成 2 4 年度内に復旧完了した。

- セヶ浜町体育施設の復興事業について、建物施設改修、改築、フェンス等の改修、照明等のＬＥＤ化などの工事を完了した。
- 比較的軽微な被害にとどまる社会教育施設について、平成 2 3 年度に事業着手し完了した。

③ 事業完了年度

平成 27 年度

8. 土砂災害対策

- ① 平成 23 年 8 月末までに、町内約 50 箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施し、1 箇所で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。(降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を実施。)
- ② 最大震度 5 強を観測した七ヶ浜町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 24 年 5 月に通常基準への引き上げを実施。
- ③ 事業完了年度
平成 23 年度

9. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 532 千トン（災害廃棄物が約 228 千トン、津波堆積物が約 304 千トン）発生した。

② 搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 6 月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年 10 月末までに仮置場への搬入は完了した。

③ 処理状況について

平成 26 年 3 月末までに、災害廃棄物等約 532 千トン（災害廃棄物が約 228 千トン、津波堆積物が約 304 千トン）の処理をすべて完了した。

④ 事業完了年度


平成 25 年度

10. 都市公園

【復興関係】

- ① 地区名：湊浜・松ヶ浜・菖蒲田浜・小豆浜地区：A地区
表浜・花渚浜・吉田浜・代ヶ崎浜地区：B地区
- ② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成24年度から都市公園事業に着手。
- ③ 平成27年度における（までの）成果
A地区について、平成27年2月に菖蒲田海浜公園、菖蒲田漁港緑地、諏訪前緑地として都市計画決定し、平成27年10月に工事着手している。
B地区については、平成27年2月に表浜緑地、割山緑地として都市計画決定し、平成27年10月に工事着手している。
- ④ 平成28年度の成果目標
両地区について、平成28年度中に事業完了する。
- ⑤ 事業完了予定年度
平成28年度

復興施策の工程表(宮城県七ヶ浜町)

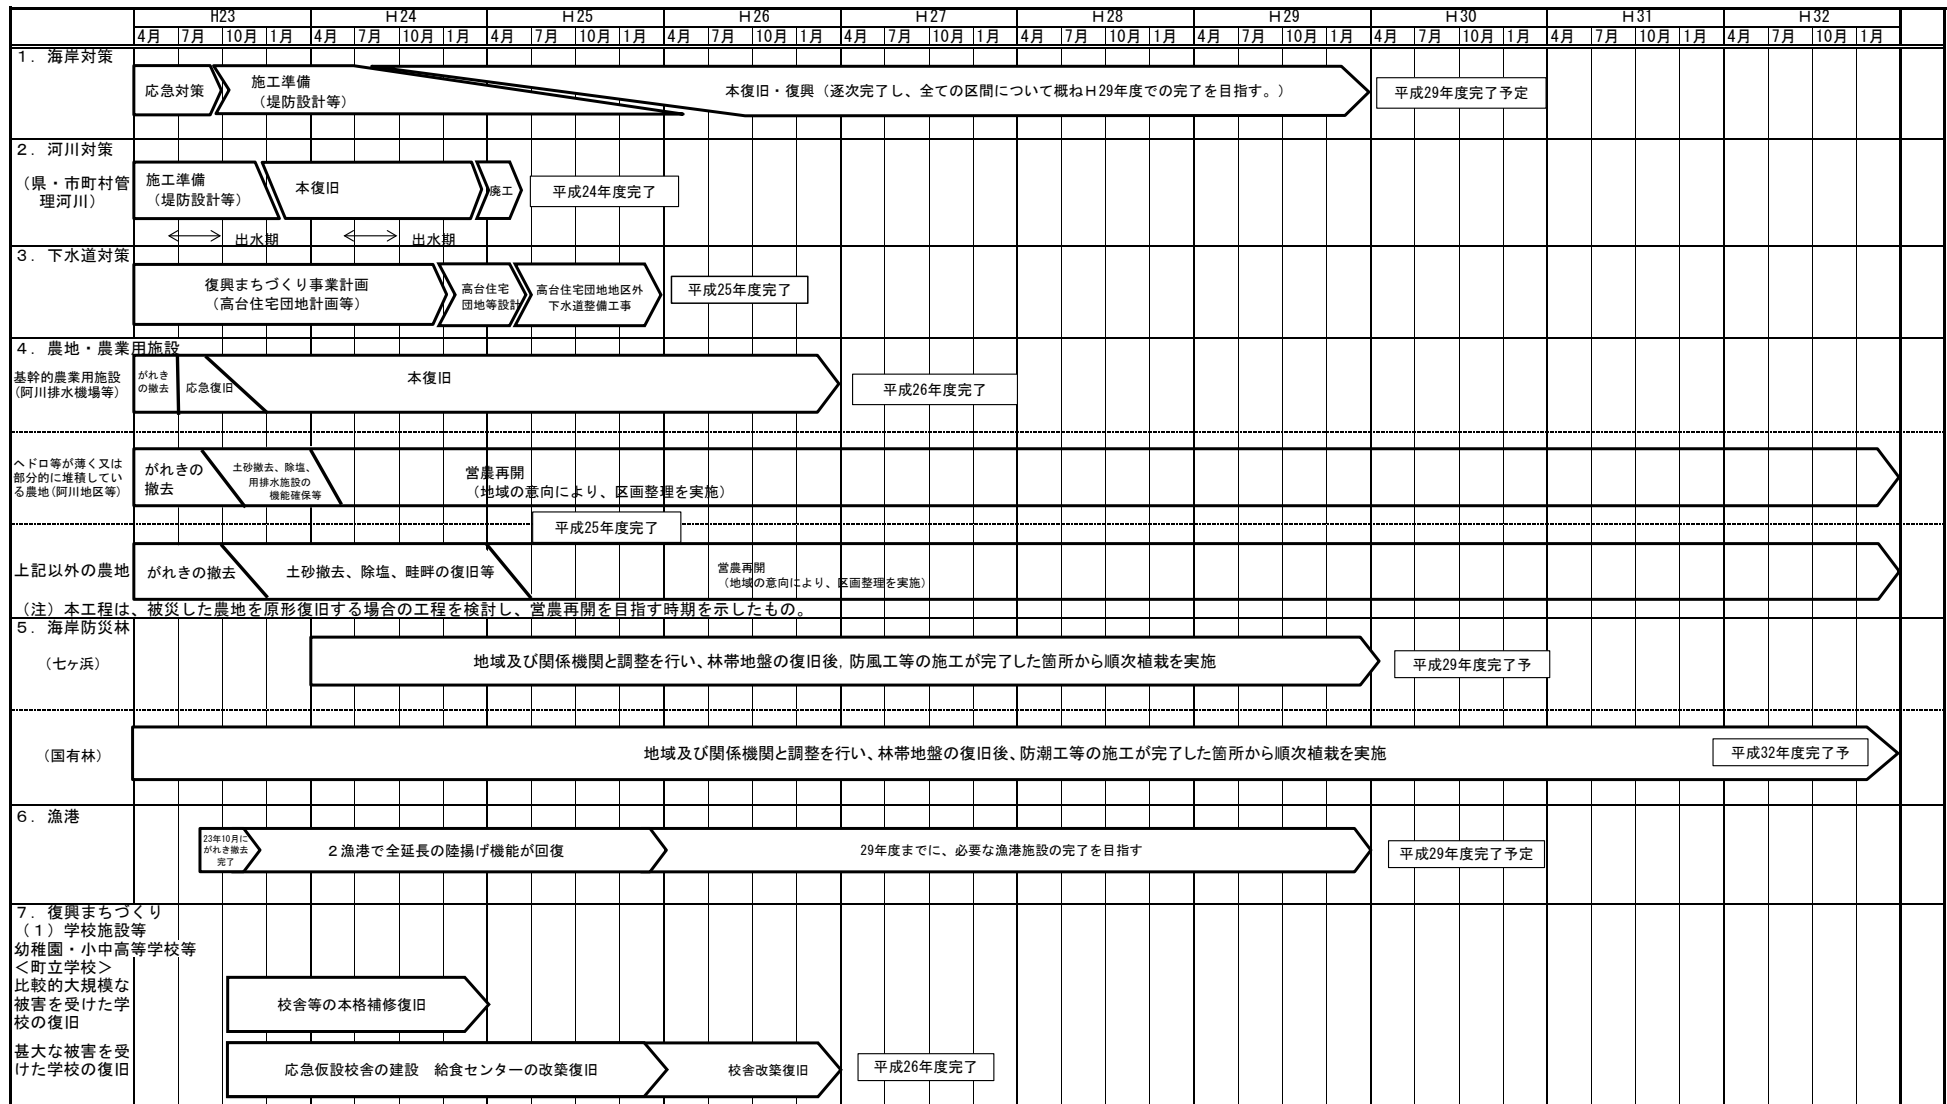

＜私立学校＞ 比較的大規模な被害を受けた学校の復旧	校舎等の本格復旧	平成24年度完了
	公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）＜町立社会教育施設＞	
	比較的小規模な被害に留まる社会教育施設の復旧	施設の本格復旧 平成24年度完了
大きな被害を受けた社会教育施設の復旧	復旧計画実施準備・施設本格復旧	平成27年度完了
＜町立社会体育施設＞		
大きな被害を受けた施設の復旧 社会体育施設の町復興計画による復旧等	施設の本格復旧	平成24年度完了
	復旧計画実施準備・施設本格復旧	平成25年度完了
8. 土砂災害対策	土砂災害危険箇所の点検等 平成23年度完了 （※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成24年5月に通常基準への引き上げを施。	
9. 災害廃棄物の処理	（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去） （その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入） （中間処理・最終処分）	平成25年度完了
10. 都市公園（復興）	計画の策定 津波防災緑地を緊急に整備	平成28年度完了予定
