事業計画（宮城県亘理町）

１．海岸対策

①　海岸の状況

町内の地区海岸数	３地区海岸
被災した地区海岸数	３地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	３地区海岸
本復旧を実施する地区海岸数	３地区海岸
復興を実施する地区海岸	１地区海岸

②　堤防高

平成 23 年９月９日に堤防高を公表※。

仙台湾南部海岸②　：T.P.　7.2m（対象：高潮）

※　公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。

③　復旧・復興の予定

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 12 月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 24 年１月より順次工事に着手し、概ね平成 30 年度での完了を目指す。

復興する施設の概要計画については、平成 24 年 11 月までに策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 26 年８月より順次工事に着手し、概ね平成 30 年度での完了を目指す。

④　平成 26 年度における成果

・全ての復旧工事で事業の進捗を図った。（累計３地区海岸）

・全ての復興工事で着工した。（累計１地区海岸）

⑤　平成 27 年度における成果

・全ての地区海岸において本復旧工事の進捗を図った。（累計３地区海岸）

・全ての地区海岸において復興工事の進捗を図った。（累計１地区海岸）

⑥　平成 28 年度の成果目標

・新たに、２地区海岸において本復旧工事の完了を目指す。（累計２地区海岸）

・全ての地区海岸において復興工事の進捗を図る。（累計１地区海岸）

⑦　事業完了予定年度

平成 30 年度

⑧　その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長（m）	主な施設	施設の高さ（T.P）		応急対策	復旧・復興の予定							H27年度の実施内容等	H28年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考
				被災前現況高（m）	被災後復旧高（m）		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了	左記の実施状況				
亘理町	吉田砂浜	3,596	堤防，離岸堤	6.20	7.20	完了	H23.10	H23.12	策定済み	H24.1	着工済み	H28.7	完了予定	本工事	本工事		復旧
亘理町	鳥の海（大畑浜）	3,252	堤防，防潮水門	3.00	3.60	完了	H23.10	H23.12	策定済み	H24.10	着工済み	H28.9	完了予定	本工事	本工事		復旧
亘理町	荒浜漁港	2,351	堤防、離岸堤	6.20 2.15	7.20 3.60	完了	H23.12	H24.9	策定済み	H24.2	着工済み	H31.3	完了予定	本工事	本工事		復旧
亘理町	荒浜漁港	924	堤防270m胸壁380m、陸閘2基	2.15	7.20 8.60	―	H24.11	H26.8	策定済み	H26.7	着工済み	H31.3	完了予定	本工事	本工事		復興

２．河川対策

【国管理河川（阿武隈川）】

① 阿武隈川※1では、亘理町で９箇所（阿武隈川では 58 箇所）の堤防の亀裂、沈下や護岸の崩壊等の被災があり、平成 24 年出水期（６月頃～）までに、被災前と同程度の安全水準を確保する本復旧を全て完了。

② 今後、津波の遡上が想定される区間については、海岸堤防の整備計画及び市町村が策定する復興計画と整合を図りながら、引き続き、本復旧工事に加えて必要な地震・津波対策として、堤防整備や液状化対策等を実施し、平成 28 年度内を目途に全箇所を完了させることを目標とする。

③ 地盤沈下により、浸水リスクが増大していることから大雨等による家屋等の浸水被害に備え、排水ポンプ車を機動的に運用できるよう増強配備し、運用体制を整えるとともに、住民の円滑な警戒避難を支援するため、浸水リスクマップの作成・公表や浸水センサー（１箇所）を設置し、リアルタイムの浸水関連情報を提供。また、平成 23 年出水期間中においては、避難判断水位等を引き下げて運用していたが、堤防の本復旧完了に伴い、平成 24 年７月に通常水準への見直しを実施。

④ 平成 27 年度における成果

本復旧工事に加えて必要な地震・津波対策として、堤防整備や液状化対策等を実施し、一部区間において完了。

⑤ 平成 28 年度の成果目標

引き続き、本復旧工事に加えて必要な地震・津波対策として堤防整備や液状化対策等を実施し、全箇所を完了させることを目指す。

⑥ 事業完了予定年度

平成 28 年度

※１位置図を参照

復興施策の事業計画　参考図面　河川　　亘理町

図面：宮城県提供

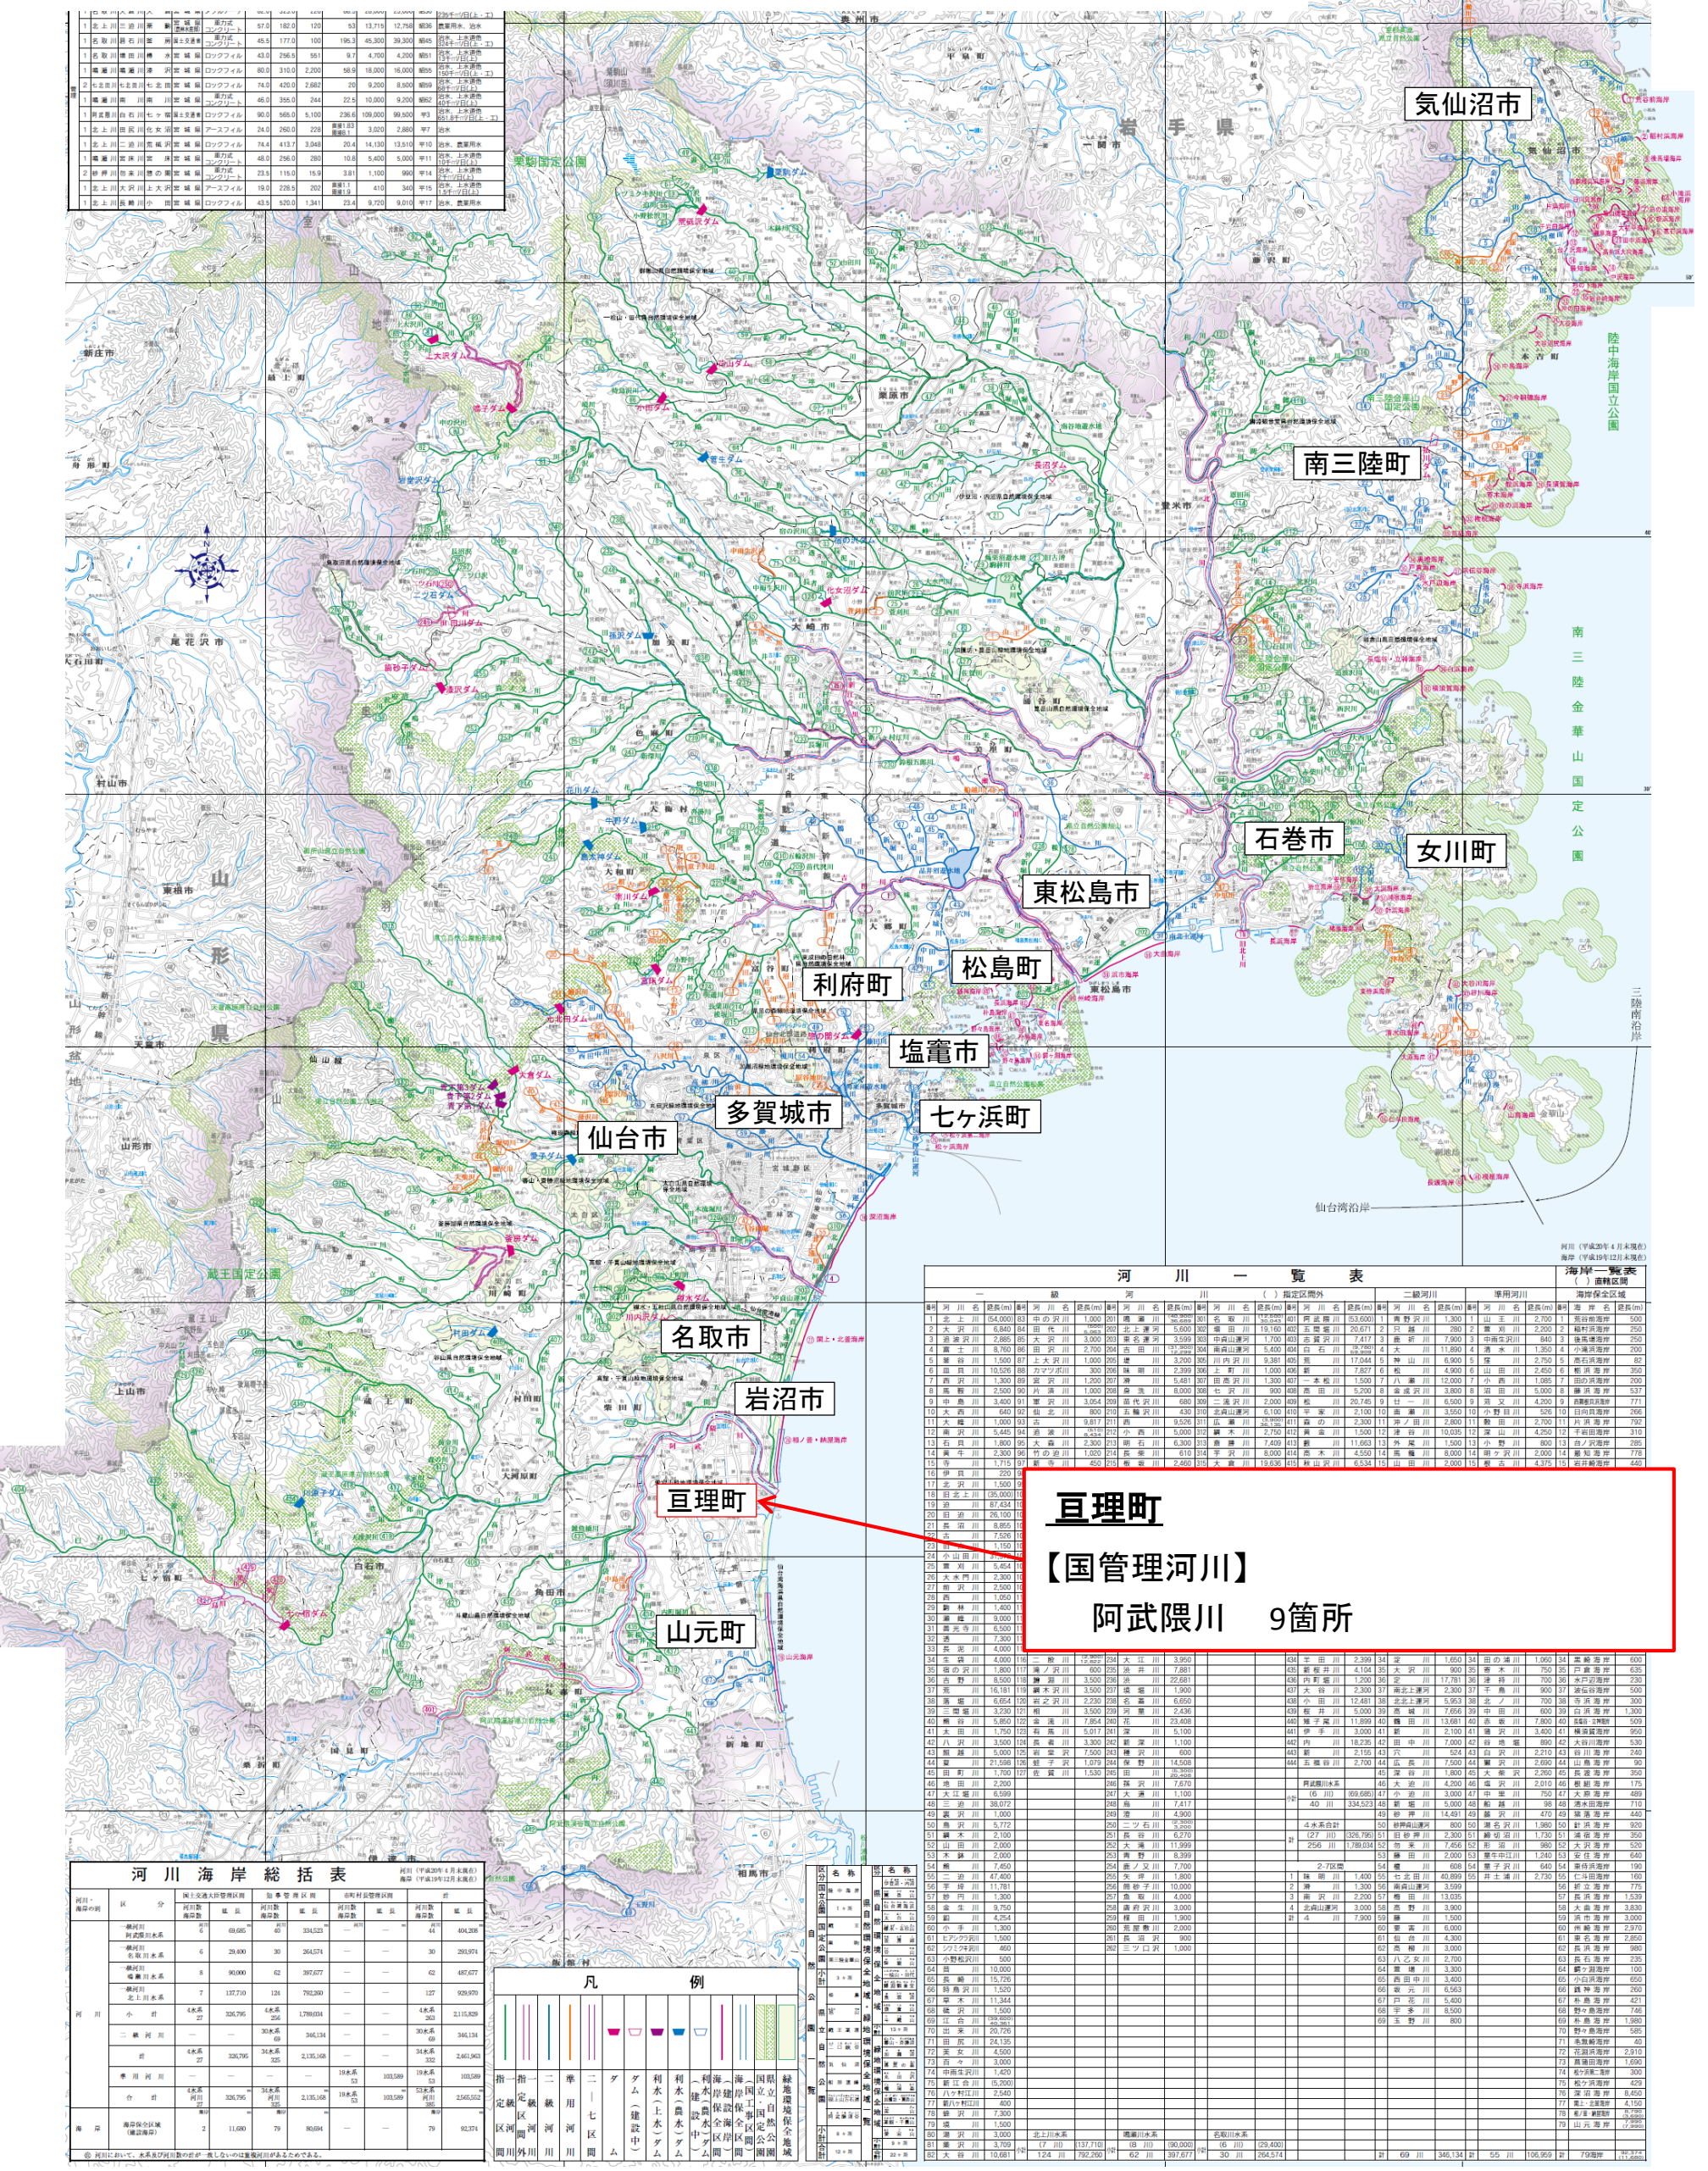

亘理町

【国管理河川】

阿武隈川　9箇所

河川一覧表

河川（平成20年4月末現在）
海岸（平成19年12月末現在）

一級河川 指定区間				一級河川 指定区間外				二級河川				準用河川				海岸保全区域（ ）は重複区間		
番号	河川名	延長(m)		番号	河川名	延長(m)		番号	河川名	延長(m)		番号	河川名	延長(m)		番号	海岸名	延長(m)
1	北上川	(54,000)		83	中の沢川	1,000		201	鳴瀬川	(43,800) (30,043)		301	名取川	(12,500) (10,043)		401	阿武隈川	(53,600)
2	大沢川	6,840		84	田代川	(6,863)		202	北上運河	5,600		302	堀田川	19,160		402	五間堀川	20,671
3	追波沢川	2,885		85	大沢川	3,000		203	東名運河	3,599		303	中貞山運河	1,700		403	志賀沢川	7,417
4	富士川	8,760		86	田沢川	2,700		204	吉田川	(11,300) (1,200)		304	南貞山運河	5,400		404	白石川	(59,700) (59,900)
5	釜谷川	1,500		87	上大沢川	1,000		205	堤川	3,200		305	川内沢川	9,381		405	荒浜川	17,044
6	国見川	10,526		88	カマツボ川	300		206	妹明川	2,399		306	上野川	1,000		406	新川	7,827
7	西谷川	1,300		89	宮沢川	1,200		207	神川	5,481		307	田高沢川	1,300		407	一本松川	1,500
8	馬鞍川	2,500		90	片清川	1,000		208	身洗川	8,000		308	七沢川	900		408	金成沢川	5,200
9	中島川	3,400		91	軍沢川	3,054		209	笛代沢川	680		309	二流沢川	2,000		409	松川	20,745
10	大西川	640		92	仙北川	800		210	五輪沢川	430		310	北貞山運河	6,100		410	平家川	2,100
11	大蟹川	1,000		93	古川	9,817		211	西川	9,526		311	広瀬川	(5,900) (35,135)		411	森の川	2,300
12	南沢川	5,445		94	追波川	(9,110) (8,434)		212	小西川	5,000		312	鋼木川	2,750		412	貴金川	1,500
13	右良川	1,800		95	大森川	2,300		213	明右川	6,300		313	鹿勝川	7,409		413	観川	11,663
14	黄牛川	2,300		96	竹の迫川	1,020		214	長柴川	610		314	宇沢川	8,000		414	高木川	4,550
15	寺川	1,715		97	新寺川	450		215	熊坂川	2,460		315	大鹿川	19,636		415	鮫山川	6,534
16	伊具川	220																
17	北沢川	1,500																
18	旧北上川	(35,000)																
19	迫川	87,434																
20	旧迫川	26,100																
21	長沼川	8,855																
22	江合川	7,526																
23	鳴瀬川	1,150																
24	小山田川	1,200																
25	雷刈川	5,454																
26	大水門川	2,300																
27	前沢川	2,500																
28	西川	1,050																
29	新林川	1,400																
30	鹿妻川	1,000																
31	善光寺川	6,500																
32	迫川	7,300																
33	長泥川	4,000																
34	生袋川	4,000	116	二股川		(12,800) (12,822)		234	大江川	3,950						434	半田川	2,399
35	宿の沢川	1,800	117	滝ノ沢川		600		235	浜井川	7,881						435	新桜井川	4,104
36	吉野川	8,500	118	御蔵川		3,500		236	浜川	22,681						436	内町堀川	1,200
37	荒川	16,181	119	新木沢川		3,500		237	成堀川	1,900						437	大谷川	2,300
38	馬堀川	6,654	120	岩之沢川		2,230		238	名取川	6,650						438	小田川	12,481
39	三間堀川	3,230	121	相川		3,500		239	河堂川	2,436						439	桜井川	5,000
40	熊谷川	5,850	122	金滝川		7,854		240	花川	23,408						440	雑子尾川	11,899
41	太田川	1,750	123	有馬川		5,017		241	深川	5,100						441	伊手川	3,000
42	八沢川	3,500	124	長者川		3,300		242	新深川	1,100						442	内川	18,235
43	堀越川	5,000	125	岩堂沢川		7,500		243	種沢川	600						443	新川	2,155
44	夏川	21,598	126	蛭子沢川		1,079		244	保野川	(5,350) (3,450)						444	五福谷川	2,700
45	田町川	1,700	127	佐賀川		1,530		245	田沢川	(5,350) (3,450)								
46	池田川	2,200						246	豚沢川	1,670							阿武隈川水系	
47	大江堀川	6,599						247	大清川	1,100						小計	(6川)	(69,686)
48	三迫川	38,072						248	鳥川	7,417							40川	334,523
49	裏沢川	1,000						249	滑川	4,900								
50	鳥沢川	5,772						250	二ツ石川	(5,350) (3,450)							4水系合計	
51	鋼木川	2,100						251	長谷川	6,270						計	(27川)	(326,795)
52	山田川	2,000						252	大滝川	11,999							256川	1,789,034
53	木鉢川	2,000						253	青野川	8,399								
54	熊川	7,450						254	鹿ノ又川	7,700							2-7区間	
55	二迫川	47,400						255	矢坪川	1,800						1	妹明川	1,400
56	宇坪川	11,781						256	間倉子川	(5,350) (3,450)						2	滑川	1,300
57	砂内川	1,300						257	魚取川	4,000						3	南沢川	2,200
58	金生川	9,750						258	鹿岩沢川	3,000						4	北貞山運河	3,000
59	鍛川	4,254						259	種田川	1,900						計	4川	7,900
60	小手川	1,300						260	荒屋敷川	2,000								
61	ヒアシクラ川	1,500						261	長沼沢川	900								
62	シノミウキ川	460						262	三ツ口沢川	1,000								
63	小野松沢川	500																
64	昔川	10,000																
65	長崎川	15,726																
66	時鳥沢川	1,520																
67	草木川	11,344																
68	磯沢川	1,500																
69	江合川	(59,900) (59,900)																
70	出来川	20,726																
71	田尻川	24,135																
72	美女川	4,500																
73	百々川	3,000																
74	中雨生沢川	1,420																
75	新江合川	(5,200)																
76	八ケ村江川	2,540																
77	新八ケ村江川	400																
78	鍛沢川	7,300																
79	境川	1,500																
80	湖沢川	3,000		北上川水系				鳴瀬川水系				名取川水系						
81	築沢川	3,709		(7川)		(137,710)		(8川)		(90,000)		(6川)		(29,400)				
82	大谷川	10,681		124川		792,260		62川		397,677		30川		264,574				

二級河川				準用河川				海岸保全区域			
番号	河川名	延長(m)		番号	河川名	延長(m)		番号	海岸名	延長(m)	
1	青野沢川	1,300		1	山王川	2,700		1	荒谷前海岸	500	
2	只越川	280		2	雷刈川	2,200		2	福村浜海岸	250	
3	鹿折川	7,900		3	中南生沢川	840		3	後馬場海岸	250	
4	大川	11,890		4	清水川	1,350		4	小滝浜海岸	200	
5	神山川	6,900		5	窪川	2,750		5	荒谷浜海岸	82	
6	松川	4,900		6	山田川	2,450		6	船渡海岸	350	
7	八瀬川	12,000		7	小西川	1,085		7	田の浜海岸	200	
8	金成沢川	3,800		8	沼田川	5,000		8	藤浜海岸	537	
9	廿一川	6,500		9	苅又川	4,200		9	西舞鶴浜海岸	771	
10	南瀬川	3,550		10	小野田川	526		10	日向貝海岸	266	
11	沖ノ田川	2,800		11	熨田川	2,700		11	片浜海岸	792	
12	津谷川	10,035		12	深山川	4,250		12	千岩田海岸	310	
13	外尾川	1,500		13	小野川	800		13	台ノ沢海岸	285	
14	馬籠川	8,000		14	明ケ沢川	2,000		14	最知海岸	778	
15	山田川	2,000		15	根古川	4,375		15	岩井崎海岸	440	
16	二股川	2,000		16	大谷川	1,000		16	寺浜海岸	1,000	
17	大谷川	1,000		17	大谷川	1,000		17	大谷海岸	1,000	
18	大谷川	1,000		18	大谷川	1,000		18	大谷海岸	1,000	
19	大谷川	1,000		19	大谷川	1,000		19	大谷海岸	1,000	
20	大谷川	1,000		20	大谷川	1,000		20	大谷海岸	1,000	
21	大谷川	1,000		21	大谷川	1,000		21	大谷海岸	1,000	
22	大谷川	1,000		22	大谷川	1,000		22	大谷海岸	1,000	
23	大谷川	1,000		23	大谷川	1,000		23	大谷海岸	1,000	
24	大谷川	1,000		24	大谷川	1,000		24	大谷海岸	1,000	
25	大谷川	1,000		25	大谷川	1,000		25	大谷海岸	1,000	
26	大谷川	1,000		26	大谷川	1,000		26	大谷海岸	1,000	
27	大谷川	1,000		27	大谷川	1,000		27	大谷海岸	1,000	
28	大谷川	1,000		28	大谷川	1,000		28	大谷海岸	1,000	
29	大谷川	1,000		29	大谷川	1,000		29	大谷海岸	1,000	
30	大谷川	1,000		30	大谷川	1,000		30	大谷海岸	1,000	
31	大谷川	1,000		31	大谷川	1,000		31	大谷海岸	1,000	
32	大谷川	1,000		32	大谷川	1,000		32	大谷海岸	1,000	
33	大谷川	1,000		33	大谷川	1,000		33	大谷海岸	1,000	
34	定川	1,650		34	田の浦川	1,060		34	黒崎海岸	600	
35	大沢川	900		35	寄木川	750		35	戸倉海岸	635	
36	定川	17,781		36	津谷川	700		36	水戸辺海岸	230	
37	南北上運河	2,300		37	千鳥川	900		37	波伝谷海岸	500	
38	北北上運河	5,953		38	北上川	700		38	寺浜海岸	300	
39	高城川	7,656		39	中田川	600		39	白浜海岸	1,300	
40	鶴田川	13,681		40	赤坂川	7,800		40	長崎浜海岸	509	
41	新川	2,100		41	鵜沢川	3,400		41	横浜海岸	950	
42	田中川	7,000		42	谷地堰	890		42	大谷川海岸	530	
43	穴川	524		43	白沢川	2,210		43	谷川海岸	240	
44	広長川	7,500		44	鷲沢川	2,690		44	山鳥海岸	90	
45	深谷川	1,800		45	大柳沢川	2,260		45	長倉海岸	350	
46	大迫川	4,200		46	塩沢川	2,010		46	熊崎海岸	175	
47	小迫川	3,000		47	中里川	750		47	大原海岸	489	
48	新堀川	5,000		48	船越川	98		48	清水田海岸	710	
49	砂押川	14,491		49	藤沢川	470		49	猿落海岸	440	
50	砂押前山運河	800		50	潮名沢川	1,980		50	針浜海岸	920	
51	旧砂押川	2,300		51	綿切沼川	1,730		51	滝宿海岸	350	
52	笠木川	7,456		52	形沼川	980		52	大沢海岸	520	
53	藤田川	2,000		53	菅生中江川	1,240		53	安住海岸	640	
54	樋川	608		54	菖子沢川	640		54	菖倉浜海岸	190	
55	七北田川	40,899		55	井土浦川	2,730		55	仁斗田海岸	160	
56	南貞山運河	3,599						56	折立海岸	775	
57	梅田川	13,035						57	長浜海岸	1,539	
58	燕野川	3,900						58	大鼻海岸	3,830	
59	藤川	1,500						59	浜市海岸	3,000	
60	要害川	6,000						60	熊崎海岸	2,970	
61	仙台川	4,300						61	寺谷海岸	2,850	
62	高柳川	3,000						62	長浜海岸	980	
63	八乙女川	2,700						63	長石海岸	235	
64	雷堰川	3,300						64	鍛ケ淵海岸	100	
65	西田中川	3,400						65	小白浜海岸	650	
66	荻元川	6,563						66	鎮神海岸	260	
67	戸花川	5,400						67	朴島海岸	421	
68	宇多川	8,500						68	野々島海岸	746	
69	玉野川	800						69	朴島海岸	1,980	
									野々島海岸	585	
									鳥屋崎海岸	40	
									花淵浜海岸	2,910	
									舞鶴田海岸	1,690	
									松ケ浜第二海岸	300	
									松ケ浜海岸	429	
									深沼海岸	6,450	
									寒立・立浪海岸	4,150	
									菖ノ浜・鮎貝海岸	(1,740) (1,650)	
									亘理海岸	(7,990) (7,990)	
									山元海岸	32,374 (11,660)	

河川海岸総括表

河川（平成20年4月末現在）
海岸（平成19年12月末現在）

河川・海岸の別	区分	国土交通大臣管理区間		知事管理区間		市町村長管理区間		計	
		河川数 海岸数	延長	河川数 海岸数	延長	河川数 海岸数	延長	河川数 海岸数	延長
河川	一級河川 阿武隈川水系	6	69,685	40	334,523	—	—	44	404,208
	一級河川 名取川水系	6	29,400	30	264,574	—	—	30	293,974
	一級河川 鳴瀬川水系	8	90,000	62	397,677	—	—	62	487,677
	一級河川 北上川水系	7	137,710	124	792,260	—	—	127	929,970
	小計	4水系 27	326,795	4水系 256	1,789,034	—	—	4水系 363	2,115,829
	二級河川	—	—	30水系 69	346,134	—	—	30水系 69	346,134
	計	4水系 27	326,795	34水系 325	2,135,168	—	—	34水系 332	2,461,963
	準用河川	—	—	—	—	19水系 53	103,589	19水系 53	103,589
	合計	4水系 27	326,795	34水系 河川 325	2,135,168	19水系 53	103,589	53水系 河川 385	2,565,552
海岸	海岸保全区域（建設海岸）	2	11,680	79	80,694	—	—	79	92,374

※ 河川において、水系及び河川数の計が一致しないのは重複河川があるためである。

凡例

指定区間 / 指定区間外 / 一級河川 / 二級河川 / 準用河川 / ダム / ダム（建設中） / 利水（上水）ダム / 利水（農水）ダム / 利水（農水）ダム（建設中） / 海岸保全区域（海岸保全区間） / 海岸保全区域（国土事業区間） / 県立自然公園 / 国立公園 / 国定公園 / 緑地環境保全地域

３．下水道対策

① 箇所名

１．吉田地区　（下水道整備事業：災害公営住宅建設及び防災集団移転促進事業に係る移転先地整備に併せた下水道の整備）

２．荒浜排水区　（荒浜雨水ポンプ場吐出槽改良事業：東日本大震災による広域的な地盤沈下及び阿武隈川河川堤防の嵩上げ復旧に伴う荒浜雨水ポンプ場吐出槽の改良）

② 今までの整備内容

１．吉田地区　下水道整備事業については、平成 24 年度から工事に着手し、平成 26 年 6 月末までに整備完了。

２．荒浜排水区　荒浜雨水ポンプ場吐出槽改良事業については、平成 27 年度から工事に着手し、平成 28 年度 5 月末までに整備完了予定。

③ 平成 27 年度における成果

１．吉田地区　下水道整備については、既に供用を開始しており、整備済。

２．荒浜排水区　荒浜雨水ポンプ場吐出槽改良事業については、工事着手済。

④ 平成 28 年度の成果目標

荒浜排水区　荒浜雨水ポンプ場吐出槽改良事業については、平成 28 年 5 月末完成を目指し事業実施する。

⑤ 事業完了予定年度

平成 28 年度

４．交通網

自治体管理道路

（一） 荒浜港今泉線

① 箇所（工区）名：荒浜（１）

② 荒浜（１）については、亘理町の復興まちづくり事業地と重複箇所があることから調整が必要。

また、調整次第では重変（減工）・廃工の可能性が生じる可能性がある。

③ 平成 27 年度における成果

事業箇所調整を行い、復旧を完了した。

④ 事業完了年度

平成 27 年度

（町）長瀞浜吉田浜線外８路線

① 箇所（工区）名：一級町道長瀞浜吉田浜線　亘理町吉田字松ヶ崎山 地内

② 町道長瀞浜吉田浜線については、現在未着手。

③ 町道長瀞浜吉田浜線については、平成 30 年度末までに復旧を完了する予定。

④ 平成 27 年度における成果

圃場整備事業との協議

町道堂前線について、他事業調整により廃工となった。

町道吉田浜南線について、他事業調整により廃工となった。

⑤ 平成 28 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

圃場整備事業との調整

⑥ 事業完了予定年度

平成 30 年度

H23道路災事業計画　位置図　亘理町

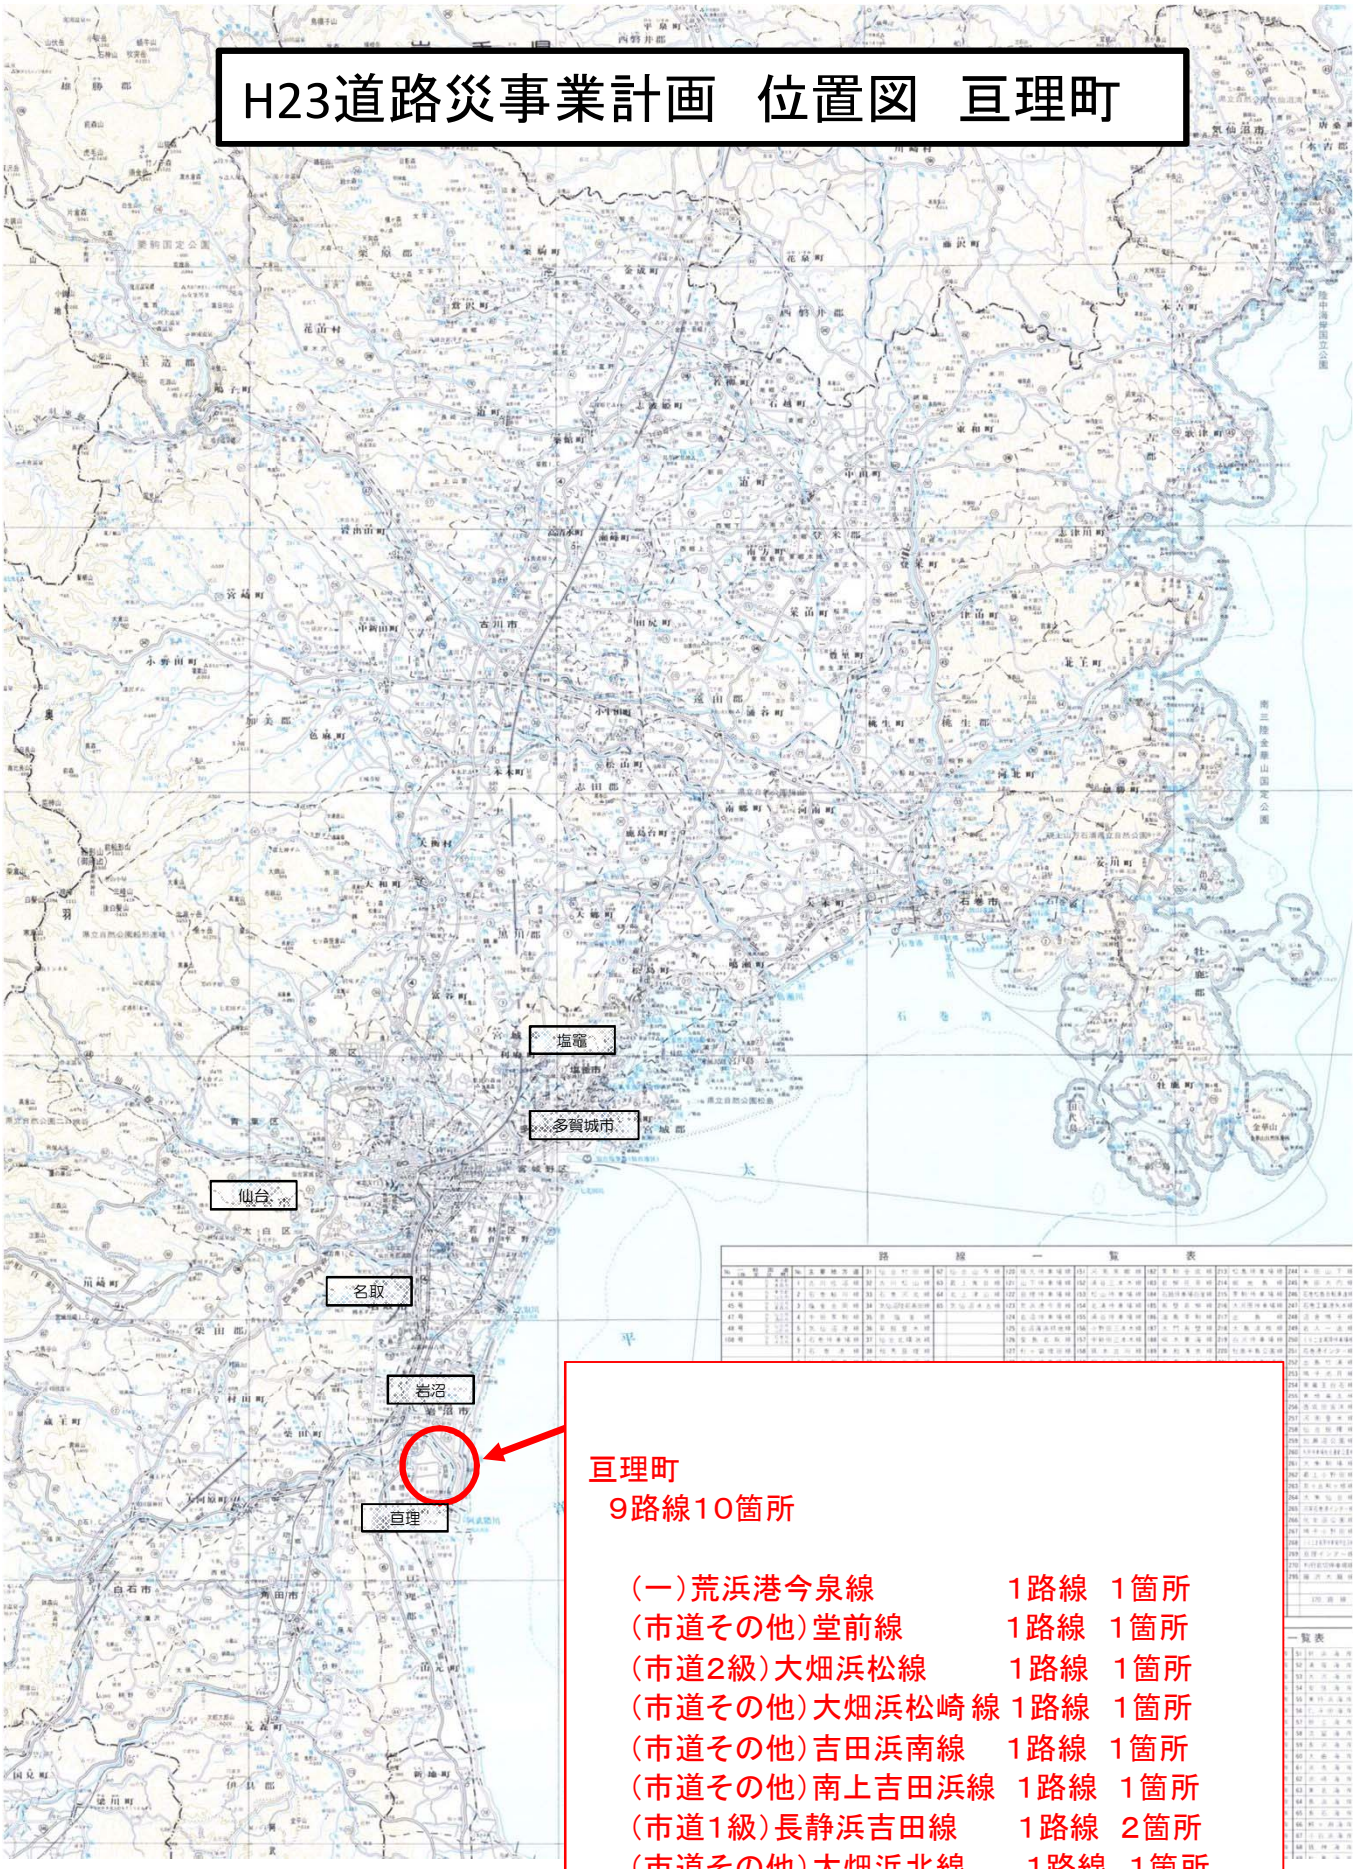

亘理町
9路線10箇所

(一)荒浜港今泉線	1路線	1箇所
(市道その他)堂前線	1路線	1箇所
(市道2級)大畑浜松線	1路線	1箇所
(市道その他)大畑浜松崎線	1路線	1箇所
(市道その他)吉田浜南線	1路線	1箇所
(市道その他)南上吉田浜線	1路線	1箇所
(市道1級)長静浜吉田線	1路線	2箇所
(市道その他)大畑浜北線	1路線	1箇所

５．農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約 2,050ha の農地及び排水機場、排水路等の基幹的農業用施設に甚大な被害

② 施設の復旧状況

平成 27 年度までに基幹的農業用施設の復旧を完了した。

〇応急復旧状況

大畑浜排水機場、橋本堀排水路等の基幹的排水施設について実施済み。

〇本格的な復旧状況

平成 25 年度内に、大塚揚水機場や九号排水路等の復旧が完了。

平成 26 年度内に、吉田排水機場等の復旧が完了。

〇国の直轄災害復旧の状況

平成 25 年度内に、高屋堀排水路等の復旧が完了。

平成 26 年度内に、長瀞浜排水機場の復旧が完了。

平成 27 年度内に、大畑浜排水機場の復旧が完了。

③ 農地の復旧状況

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。

〇平成 23 年度当初から既に営農再開が可能な農地　約 174ha

〇平成 24 年度から営農再開が可能な農地　約 830ha

〇平成 25 年度から営農再開が可能な農地　約 716ha

〇平成 28 年度から営農再開が可能な農地　約 135ha

〇平成 29 年度から営農再開を可能とすることを目指す農地　約 138ha

〇平成 28 年度の成果目標

平成 29 年度春の作付時期から、津波被災農地約 2,050ha のうち約 1,993ha（約 97%）で営農再開を可能とすることを目指す。

〇事業完了予定年度　平成 28 年度

（現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、面積は変わり得るもの。）

④ 区画整理等検討状況

亘理地区において、大区画化等の区画整理を実施しているところ。

６．海岸防災林の再生

① 箇所名：亘理町

② 被災状況

防潮堤 790ｍが津波により流失した。また、林帯地盤 105.6ha が地震により地盤沈下するとともに、津波により大きく侵食され、森林 105.6ha が流失した。

③ 事業計画の内容

被災した防潮堤（790ｍ）については、治山施設災害復旧事業により復旧する。また、被災した林帯地盤（105.6ha）の復旧については、国が民有林直轄治山施設災害復旧事業により復旧する。被災した森林（105.6ha）については、国が民有林直轄治山事業により整備する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防潮堤の復旧工事については、平成 24 年度に着手し、平成 26 年度に完了した。林帯地盤の復旧工事については、他事業との調整を図りつつ、平成 24 年度に着手した。森林の造成については、林帯地盤の復旧が完了した箇所から順次、植栽に着手し、平成 32 年度の完了を目指す。

⑤ 平成 27 年度における成果

治山施設災害復旧事業：林帯地盤約 41ha の盛土を実施。

⑥ 平成 28 年度の成果目標

治山施設災害復旧事業：林帯地盤 9ha の盛土を実施。
防潮堤（787m）の復旧を完了。

防災林造成事業：１箇所の復旧を完了。

⑦ 事業完了予定年度

平成 32 年度

（保全対象：国道 123 号線、農地、人家（吉田地区他））

① 箇所名：亘理地区（国有林）

② 被災状況

津波により森林 19ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した林帯地盤については、治山施設災害復旧事業により復旧する。被災した森林については、防災林造成事業により整備する。

④ これまでの実施状況と今後の予定

被災した林帯については、一部がれき置場として地方自治体に貸し付けていたが、平成 25 年度末で災害廃棄物処理が完了したことに伴いがれき置き場が解消された。今後、町復興計画及び他事業との調整を図りつつ着手可能な箇所から順次実施する。

盛土等海岸防災林の林帯地盤の復旧は平成26年度に着手した。森林造成については、林帯地盤の復旧後、防風工の施工等が完了した箇所から順次、植栽に着手し、全体の復旧については、平成 32 年度の完了を目指す。

（保全対象：国道 123 号線、農地、人家（吉田地区他））

（なお、国有林内については、国有林野内直轄治山施設災害復旧事業等により国が直接実施する。）

⑤ 平成 27 年度における成果

治山施設災害復旧事業：林帯地盤 7ha の盛土を実施。

⑥ 平成 28 年度の成果目標

⑦ 事業完了予定年度

平成 32 年度

７．漁港

① 被害状況

漁港数：１漁港

被災漁港数：１漁港

② これまでの実施状況と今後の予定

亘理町内の荒浜漁港において、平成 25 年度末時点で、全延長の陸揚げ機能が回復している。

今後、平成 27 年度までに主要な漁港施設の復旧を目指し、平成 28 年度までに、防潮堤と隣接する臨港道路等の漁港施設の復旧の完了を目指す。

③ 事業完了予定年度

平成 28 年度

８．復興まちづくり

（１）造成宅地滑動崩落緊急対策

① 地区名：長瀞地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事に着手。25 年度末までに工事完了。

③ 事業完了年度

平成 25 年度

（２）学校施設等

① 幼稚園・小中高等学校等

（ｉ）公立学校

＜亘理町立学校＞

東日本大震災により被災した町立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した７校について、以下のとおり平成２７年度末までに完了した。

○ 比較的軽微な被害に留まる４校のうち２校については、平成２４年度内に復旧完了した

他の２校のうち１校について、校舎関係の復旧は平成２４年度内に完了しており、プールは平成２６年４月に復旧完了した。もう１校は、校舎・プールについて平成２５年度内に復旧完了した。

○ 甚大な津波被害を受け、移転も含めた総合的な検討が必要となる３校のうち、荒浜小学校については、平成２４年度に着手し平成２５年２月２５日に校舎・体育館の復旧工事が完了した。また、プールについては平成２６年度に実施設計、平成２７年度に復旧完了した。長瀞小学校については、平成２４年度中に仮設校舎を建設するとともに、当町の震災復興計画に基づき平成２４年度内に事業着手し、平成２６年７月に復旧完了した。

荒浜中学校についても、当町の震災復興計画に基づき平成２４年度内に事業着手し、平成２６年７月に復旧完了した。

＜県立学校＞

亘理町に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した１校については、比較的軽微な被害に留まり、平成２３年度内に復旧完了した。

② 公立社会教育施設（公立社会体育施設を含む）

＜町立社会教育施設＞

東日本大震災により被災した亘理町社会教育施設のうち，公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の７施設について，次のとおり早期の復旧をめざす。

○　比較的軽微な被害にとどまる４施設のうちＢ＆Ｇ海洋センタープール、佐藤記念体育館については、平成２３年度で復旧完了。

中央公民館、悠里館（図書館・郷土資料館）については、平成２４年度で復旧完了。

○　甚大な被害を受けた荒浜体育館、吉田体育館の２施設については、併設する荒浜支所、吉田支所の復旧と併せて平成２５年７月再開。

○　流失したＢ＆Ｇ海洋センター艇庫については、平成２８年度中に実施設計、平成２９年度中に完了を目指す。

９．土砂災害対策

① 平成 23 年８月末までに、町内約 40 箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施。

② 最大震度６弱を観測した亘理町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 25 年５月に通常基準への引き上げを実施。

③ 事業完了年度
平成 23 年度

10. 災害廃棄物の処理

① 推計量について

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等により膨大な量の災害廃棄物等約 856 千トン（災害廃棄物が約 495 千トン、津波堆積物が約 361 千トン）発生した。

② 搬入状況について

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年８月中に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年６月末までに仮置場への搬入は完了した。

③ 処理状況について

平成 26 年３月末までに、災害廃棄物等約 856 千トン（災害廃棄物が約 495 千トン、津波堆積物が約 361 千トン）の処理をすべて完了した。

④ 事業完了年度

平成 25 年度

11. 都市公園

① 箇所名：鳥の海公園、（築港公園は廃止報告済）

② 被災状況

津波により、ほぼ全ての施設が流失及び破損

③ 平成 28 年度の成果目標

都市災害復旧事業により、遊具施設、多目的広場、野球場、陸上競技場兼サッカー場等の復旧工事に着手し、事業の進捗を図る。

④ 事業完了予定年度

平成 28 年度

復興施策の工程表（宮城県亘理町）

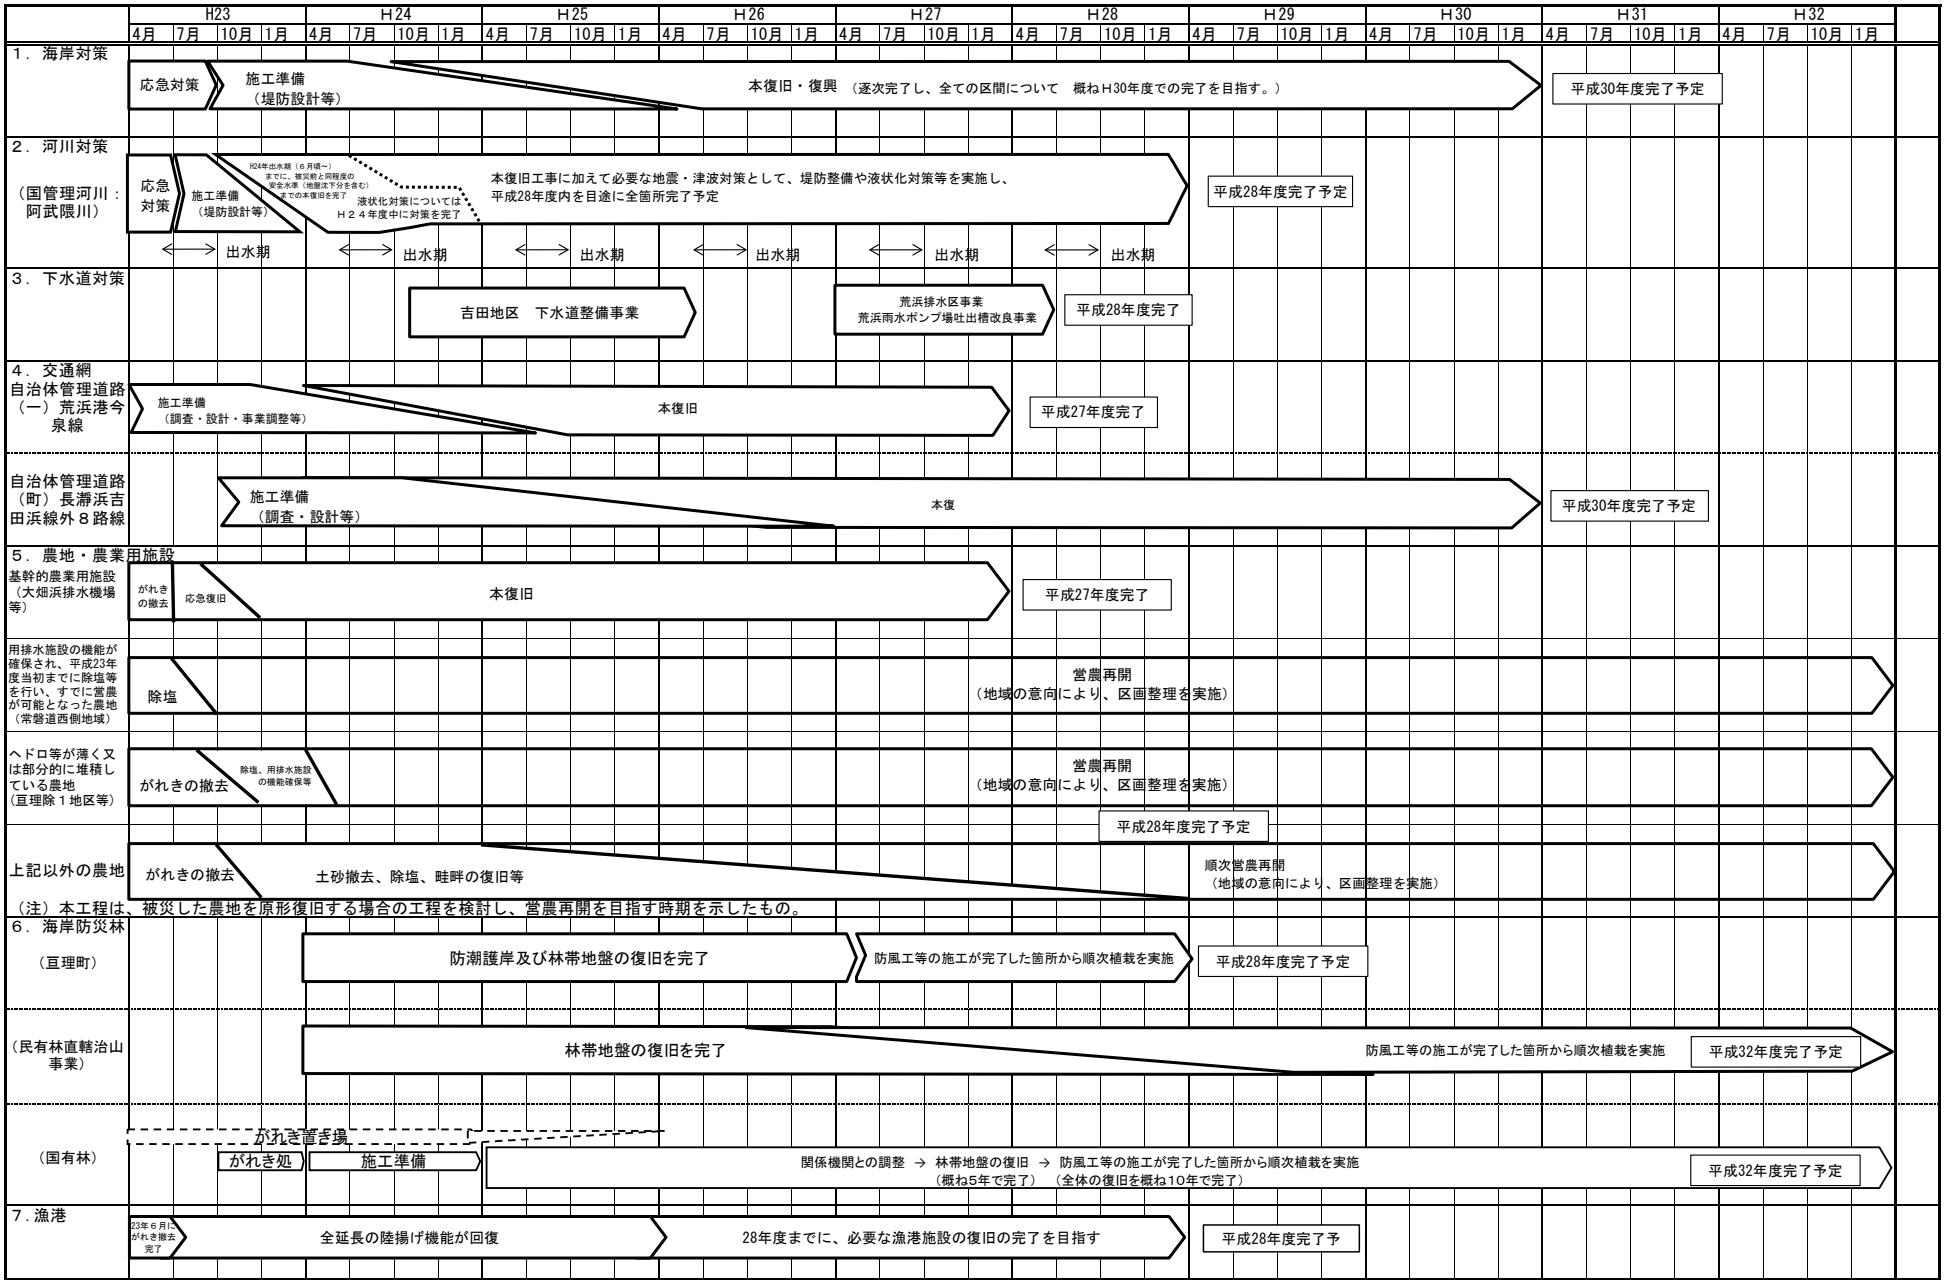

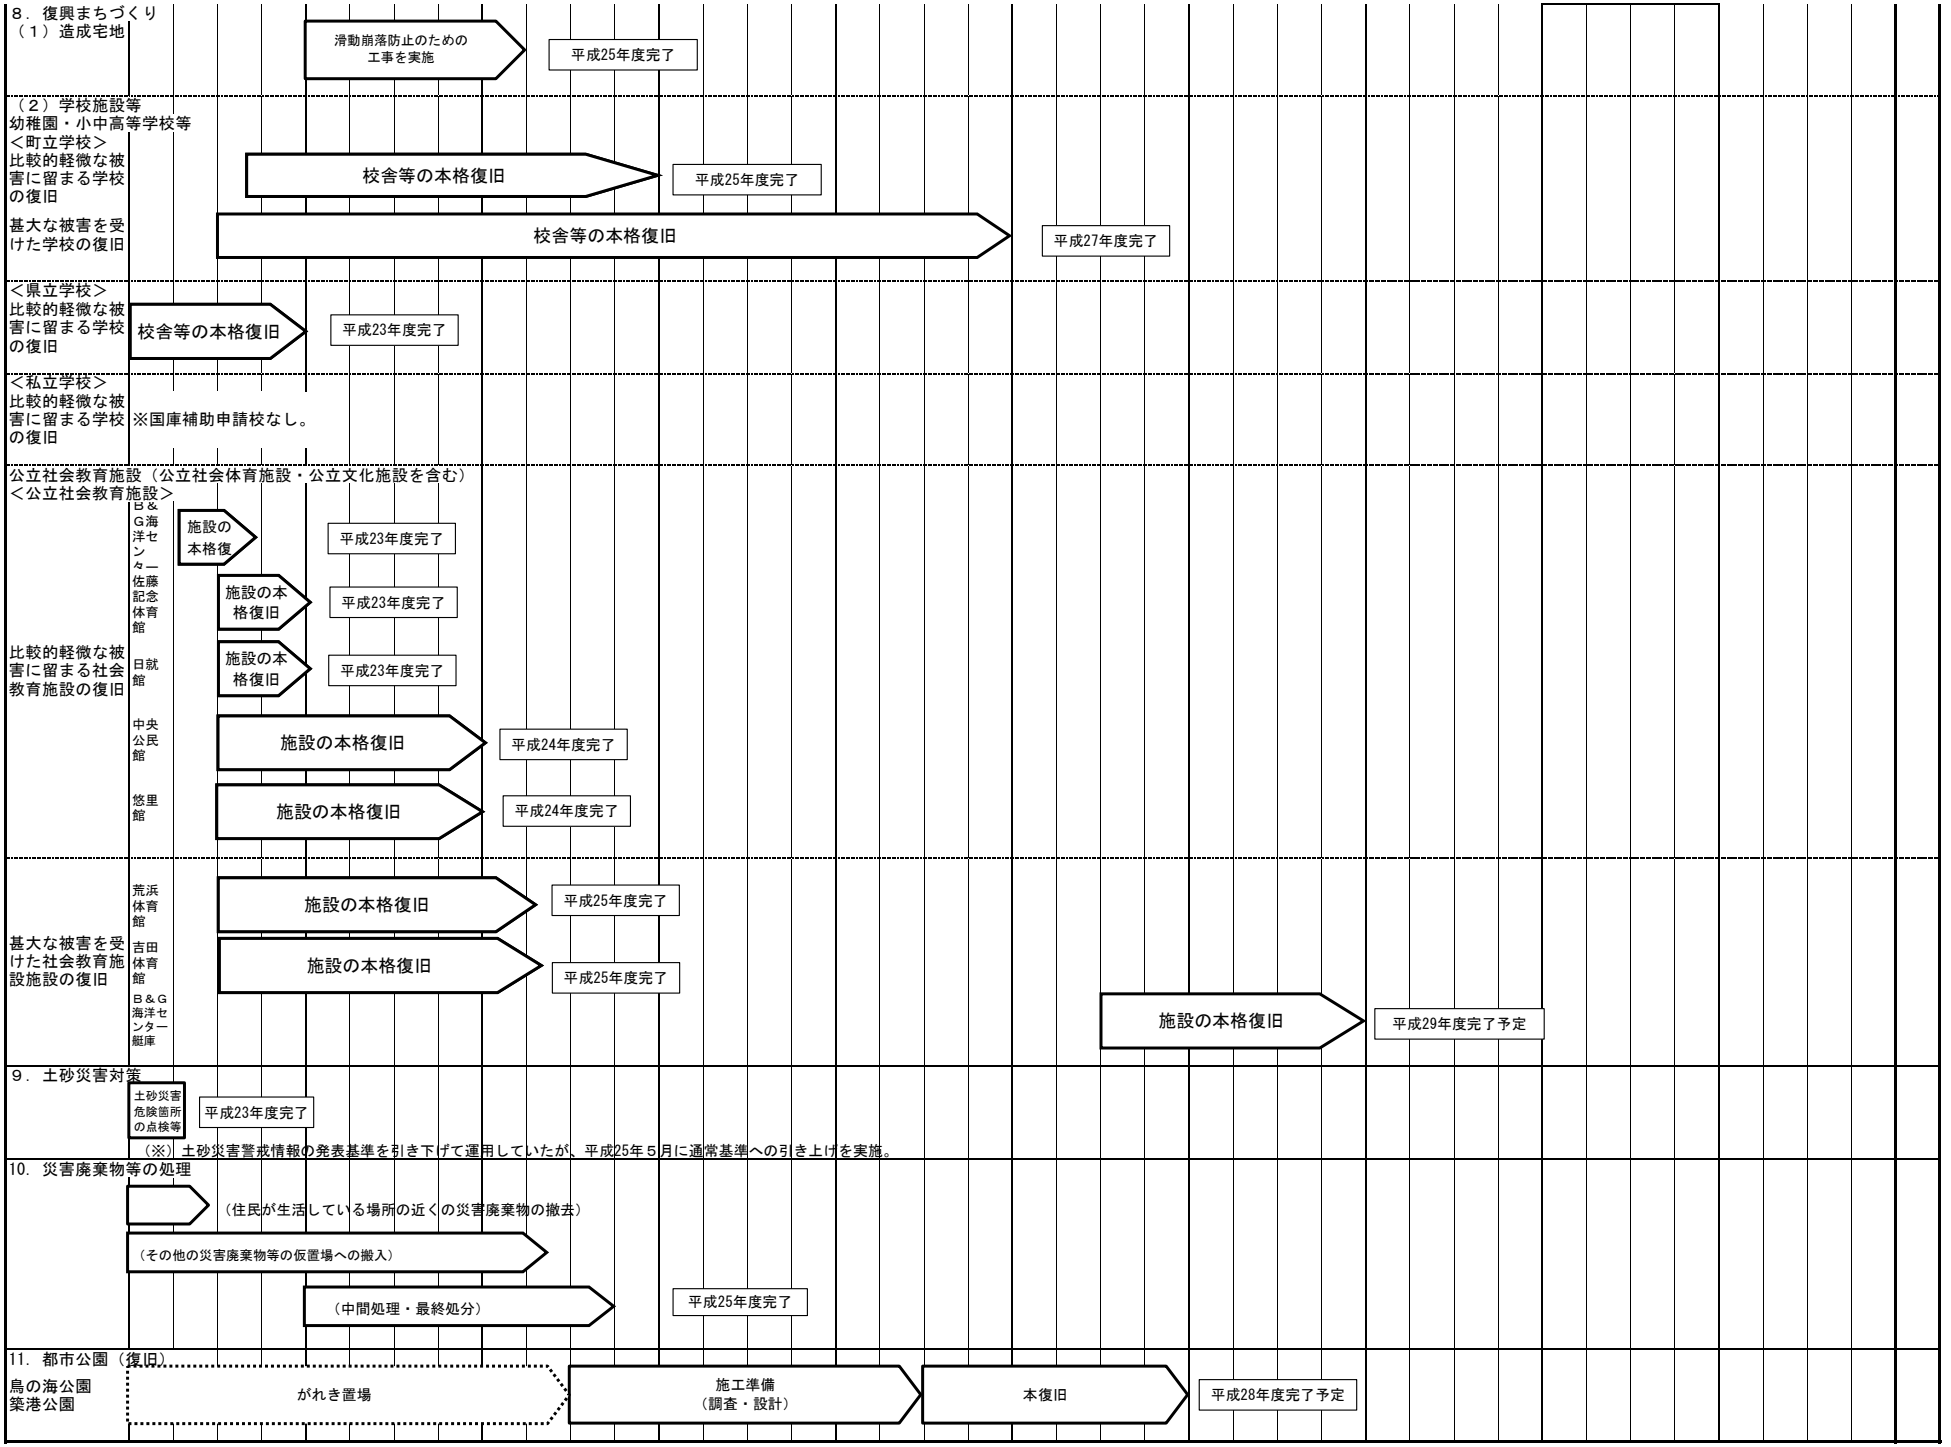
8．復興まちづくり
（１）造成宅地
滑動崩落防止のための工事を実施
平成25年度完了
（２）学校施設等
幼稚園・小中高等学校等
＜町立学校＞
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧
校舎等の本格復旧
平成25年度完了
甚大な被害を受けた学校の復旧
校舎等の本格復旧
平成27年度完了
＜県立学校＞
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧
校舎等の本格復旧
平成23年度完了
＜私立学校＞
比較的軽微な被害に留まる学校の復旧
※国庫補助申請校なし。
公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）
＜公立社会教育施設＞
比較的軽微な被害に留まる社会教育施設の復旧
B＆G海洋センター
施設の本格復
平成23年度完了
佐藤記念体育館
施設の本格復旧
平成23年度完了
日就館
施設の本格復旧
平成23年度完了
中央公民館
施設の本格復旧
平成24年度完了
悠里館
施設の本格復旧
平成24年度完了
甚大な被害を受けた社会教育施設施設の復旧
荒浜体育館
施設の本格復旧
平成25年度完了
吉田体育館
施設の本格復旧
平成25年度完了
B＆G海洋センター艇庫
施設の本格復旧
平成29年度完了予定
9．土砂災害対策
土砂災害危険箇所の点検等
平成23年度完了
（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成25年５月に通常基準への引き上げを実施。
10．災害廃棄物等の処理
（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）
（その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入）
（中間処理・最終処分）
平成25年度完了
11．都市公園（復旧）
鳥の海公園
築港公園
がれき置場
施工準備（調査・設計）
本復旧
平成28年度完了予定
