

事業計画

5. 港湾

八戸港

- ①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁４４バース（水深４.５ｍ以深）のうち、４１バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ②八太郎地区コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、製紙、製鉄、飼料等の産業復興に必要な施設への安全な船舶の入出港や安定的な港湾荷役の確保のために必要な防波堤や航路・泊地から順次本復旧。
- ③平成２５年度末までの復旧完了を目指すこととし、特に、八太郎地区北防波堤（中央部）については、２４年度内の概成を目指す。

久慈港

- ①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁２４バース（水深４.５ｍ以深）のうち、全ての岸壁が、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ②造船、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。
- ③平成２５年度末までの復旧完了を目指す。

宮古港

- ①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁２６バース（水深４.５ｍ以深）のうち、全ての岸壁が、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ②木材加工、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。
- ③平成２５年度末までの復旧完了を目指す。

釜石港

- ①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁７バース（水深４.５ｍ以深）のうち、５バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ②鉄鋼、飼料等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。

③湾口防波堤以外の施設については、平成24年度末までの復旧完了を目指す。

④湾口防波堤については、まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧を進め、平成27年度末までの復旧完了を目指す。

大船渡港

①応急復旧により、11月24日現在で、公共岸壁10バース（水深4.5m以深）のうち、全ての岸壁が、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。

②セメント等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。

③湾口防波堤以外の施設については、平成24年度末までの復旧完了を目指す。

④湾口防波堤については、まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧を進め、平成27年度末までの復旧完了を目指す。

石巻港

①応急復旧により、11月24日現在で、公共岸壁31バース（水深4.5m以深）のうち、23バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。

②製紙、飼料、木材加工等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。

③24年度の復旧完了を目指す。

仙台塩釜港

①応急復旧により、11月24日現在で、公共岸壁42バース（水深4.5m以深）のうち、31バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。

②高砂国際コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、完成自動車の輸出等産業復興に必要な施設から順次本復旧。

③平成24年度末までの復旧完了を目指すこととし、特に、高砂コンテナターミナルは、23年11月中に北米航路の就航を可能とする。

相馬港

- ①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁１３バース（水深４.５ｍ以深）のうち、４バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ②基幹的輸送を担う内航コンテナ施設から順次本復旧。
- ③沖防波堤以外の施設については、平成２５年度末までの復旧完了を目指す。
- ④沖防波堤については、火力発電所への燃料の安定供給等の支障にならないように計画的に復旧を進め、平成２７年度末までの復旧完了を目指す。

小名浜港

- ①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁７２バース（水深４.５ｍ以深）のうち、４２バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ②火力発電所への燃料の安定供給に必要な施設、化学工業・非鉄金属工業等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。
- ③２５年度末までの復旧完了を目指す。

茨城港日立港区

- ①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁１８バース（水深４.５ｍ以深）のうち、６バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ②基幹的輸送を担う北海道との定期ＲＯＲＯ輸送に必要な施設、完成自動車の輸出入等産業復興に必要な施設から順次本復旧。
- ③２４年度末までの復旧完了を目指す。

茨城港常陸那珂港区

- ①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁２５バース（水深４.５ｍ以深）のうち、１３バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ②北ふ頭コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設から順次本復旧。

- ③ 24年度末までの復旧完了を目指すこととし、特に、コンテナ等が利用する北ふ頭A岸壁は、23年度内の復旧完了を目指す。

茨城港大洗港区

- ① 応急復旧により、11月24日現在で、公共岸壁13バース（水深4.5m以深）のうち、3バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ② 基幹的輸送を担う北海道とのフェリー輸送に必要な施設から順次本復旧。
- ③ 24年度の復旧完了を目指すこととし、特に、フェリーが利用する第3ふ頭は、23年度末までの復旧完了を目指す。

鹿島港

- ① 応急復旧により、11月24日現在で、公共岸壁18バース（水深4.5m以深）のうち、10バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。
- ② 石油化学、鉄鋼、飼料、木材加工等の産業復興に必要な係留施設、鹿島臨海工業地帯に原料を搬入する大型船舶の水深を確保するための航路・泊地から順次本復旧。
- ③ 24年度末までの復旧完了を目指す。

八戸港 復旧工程計画


平成23年11月17日

: 応急復旧工事
 : 暫定供用
 ☆ : 災害査定
 : 本格復旧工事
 : 供用

番号	施設名	水深	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度	平成27年度
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
①	八太郎地区 北防波堤(中央部)				☆																								
②	八太郎地区 北防波堤(ハネ部)					☆																							
③	河原木地区 航路・泊地	-14m				☆																							
④	河原木地区 泊地	-7.5m			☆																								
⑤	八太郎地区 航路・泊地	-12m -13m				☆																							
⑥	八太郎地区 泊地	-13m				☆																							
⑦	八太郎地区 泊地	-7.5m				☆																							
⑧	八太郎地区 泊地	-10m				☆																							
	八戸港海岸	-10m				☆																							

施設配置図

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

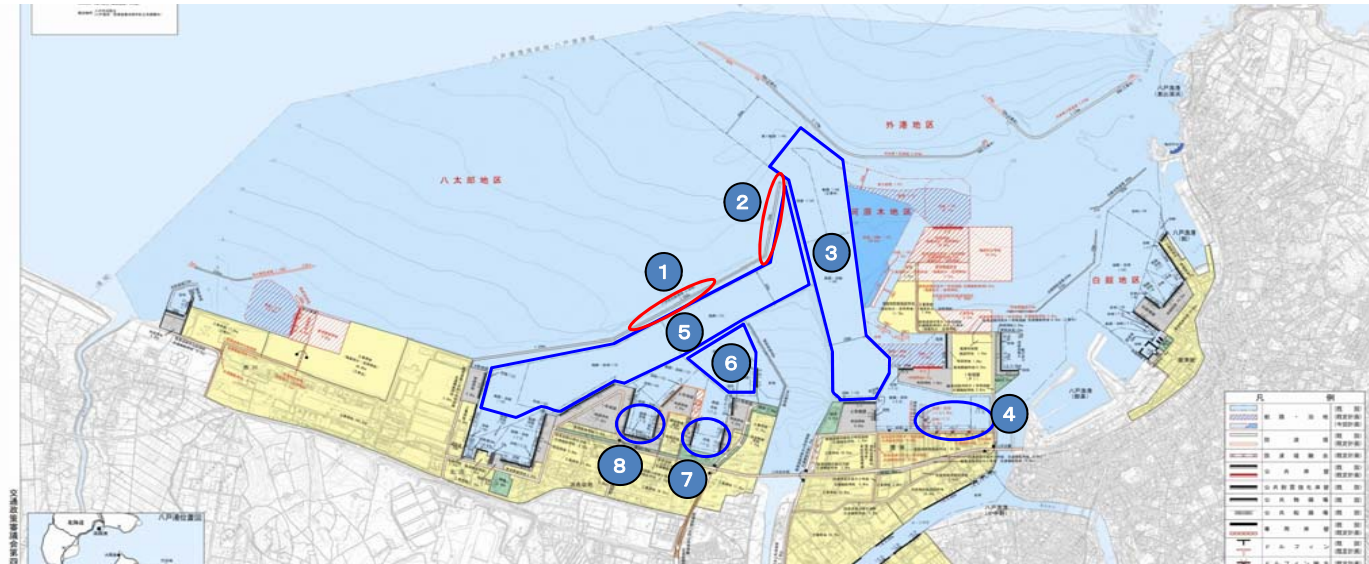

久慈港 復旧工程計画

平成23年11月17日

■ : 応急復旧工事 ■ : 暫定供用 ☆ : 災害査定 ■ : 本格復旧工事 ■ : 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	諏訪下	-10m	非金属鉱物				☆																						
②	諏訪下 1号岸壁	-7.5m	木材チップ				☆																						
③	諏訪下 2号岸壁	-7.5m	木材チップ				☆																						
④	諏訪下 3号岸壁	-7.5m	木材チップ				☆																						
⑤	掘込	-6.0m	水産品				☆																						
⑥	掘込	-4.5m	重油					☆																					
⑦	湾口防波堤							☆																					
	久慈港海岸										☆																		

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

施設配置図



宮古港 復旧 工程 計画

平成23年11月17日

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	藤原	-12m	りん鉱石					☆																					
②	藤原	-7.5m	化学肥料					☆																					
③	藤原	-7.5m	化学薬品					☆																					
④	藤原	-7.5m	非金属鉱物					☆																					
⑤	藤原	-7.5m	木材チップ					☆																					
⑥	藤原	-10m	食料工業品					☆																					
⑦	出崎	-7.3m	水産品								☆																		
⑧	出崎	-9.0m	水産品					☆																					
⑨	出崎防波堤							☆																					
	宮古港海岸											☆																	

施設配置図



※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

釜石港 復旧 工程計画


平成23年11月17日

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
①	須賀	-11m	完成自動車							☆																				
②	須賀 耐震強化	-7.5m	金属くず								☆																			
③	須賀	-7.5m	砂・砂利								☆																			
④	須賀	-4.5m	コークス								☆																			
⑤	湾口防波堤											☆		平成27年度未完了見込み																
	釜石港海岸										☆																			

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

施設配置図

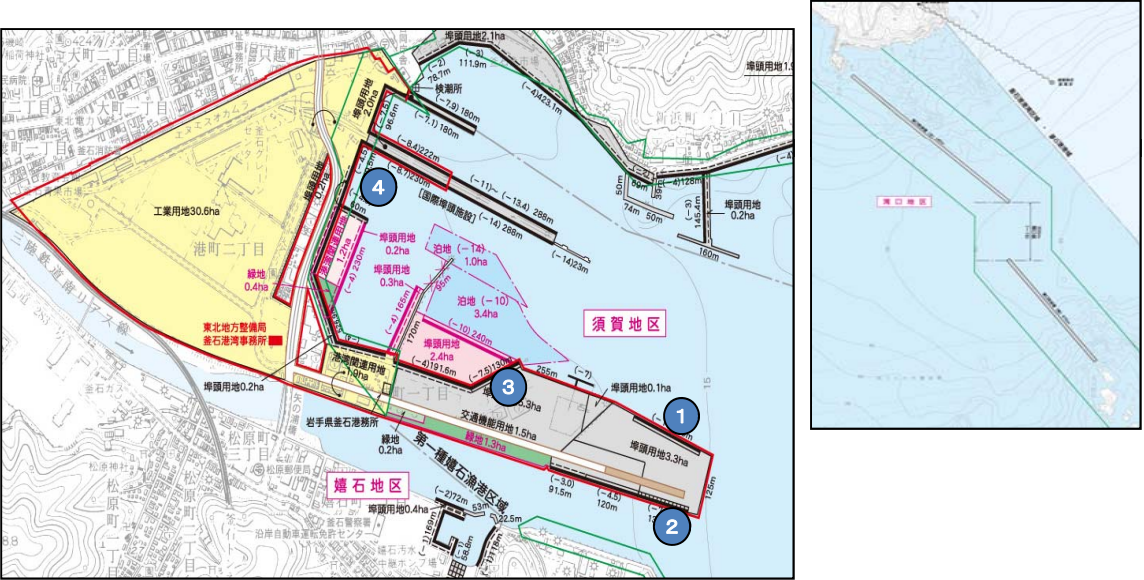

大船渡港 復旧工程計画

平成23年11月17日

：応急復旧工事

：暫定供用

☆

：災害査定


：本格復旧工事

：供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	野々田	-13m	コンテナ																										
②	野々田	-7.5m	砂・砂利																										
③	永浜	-13m	石油製品																										
④	茶屋前	-9.0m	石炭																										
⑤	湾口防波堤																												
	大船渡港海岸																												

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

施設配置図

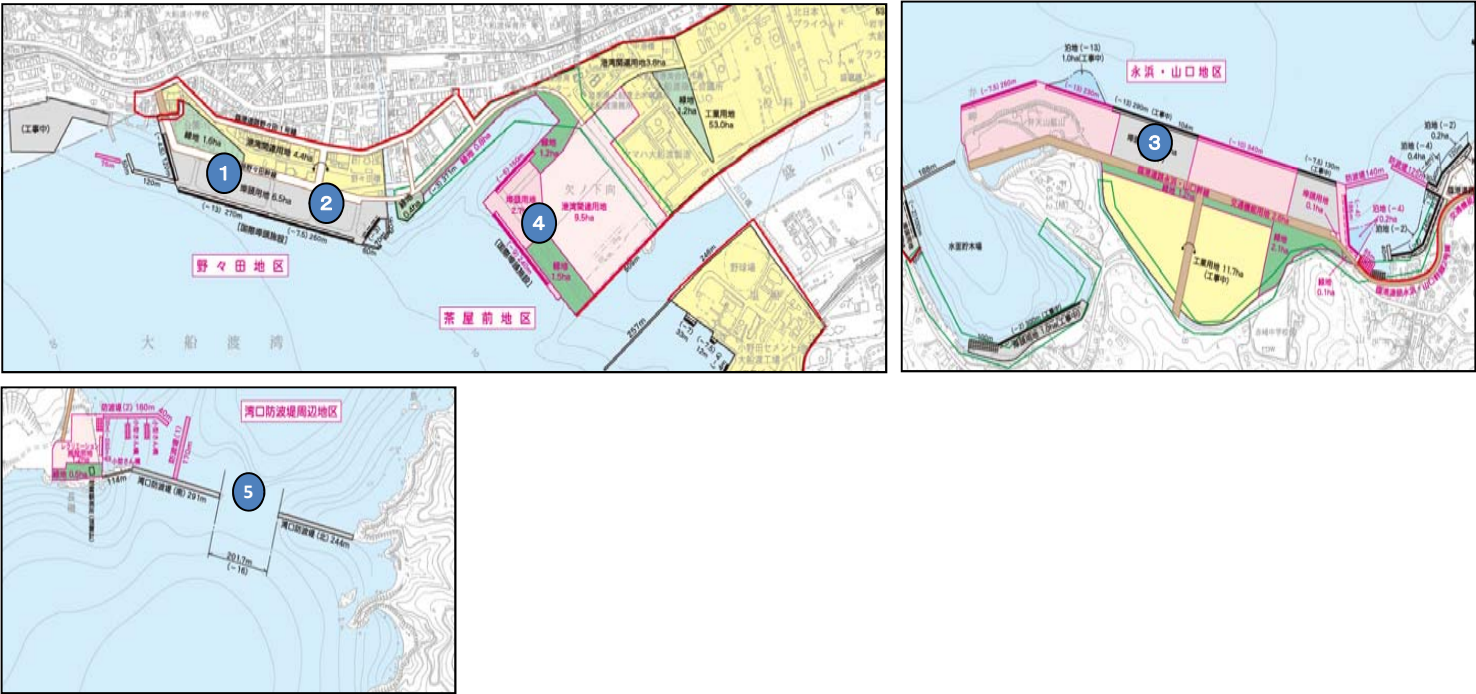


石 巻 港 復 旧 工 程 計 画

平成23年11月17日

■ : 応急復旧工事 ■ : 暫定供用 ☆ : 災害査定 ■ : 本格復旧工事 ■ : 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	雲雀野 1号	-13m	原木																										
②	雲雀野 2号	-13m	石炭																										
③	雲雀野北埠頭	-10m	石材																										
④	中島埠頭	-10m	非金属鉱物																										
⑤	日和埠頭	-10m	穀物																										
⑥	日和埠頭	-9m	石灰石																										
⑦	南浜埠頭	-9m	原木																										
⑧	南浜埠頭	-10m	木材チップ																										
⑨	民有護岸、係留施設																												
⑩	石巻港海岸																												

施設配置図

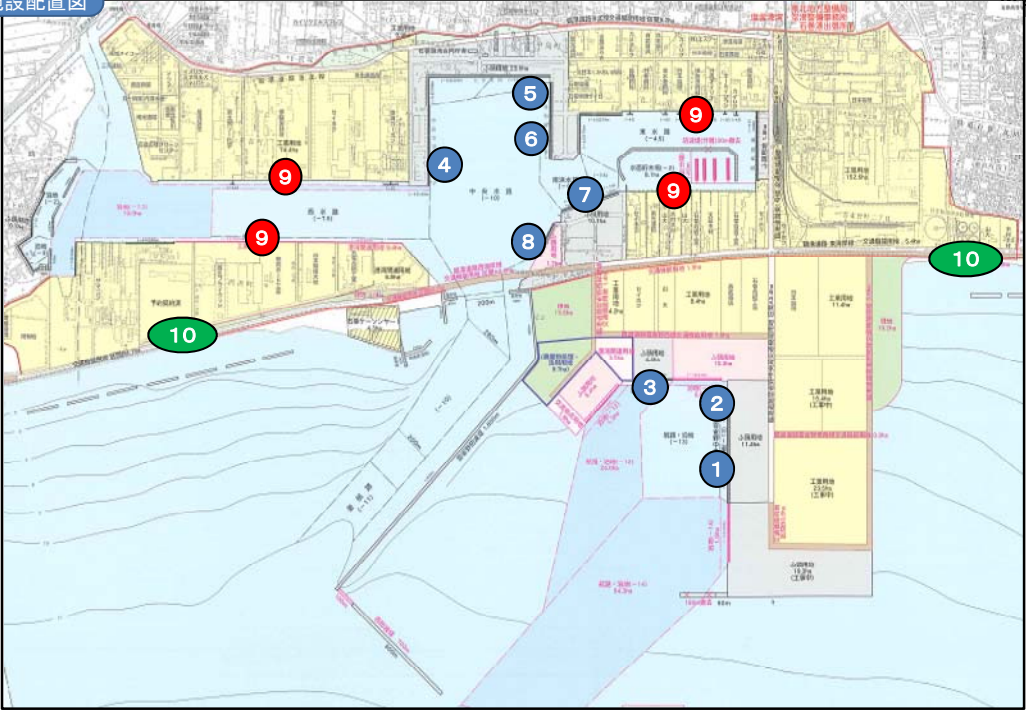


※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

仙 台 塩 釜 港（塩釜港区） 復 旧 工 程 計 画

平成23年11月17日

:応急復旧工事																												:暫定供用			☆:災害査定			:本格復旧工事			:供用		
番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度										
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
①	真山 1号	-9m	水産品	☆												暫定利用可能																							
②	真山 2号	-9m	水産品	☆												暫定利用可能																							
③	東埠頭	-7.5m	セメント	☆												暫定利用可能																							
	仙台塩釜港海岸			☆																																			

施設配置図

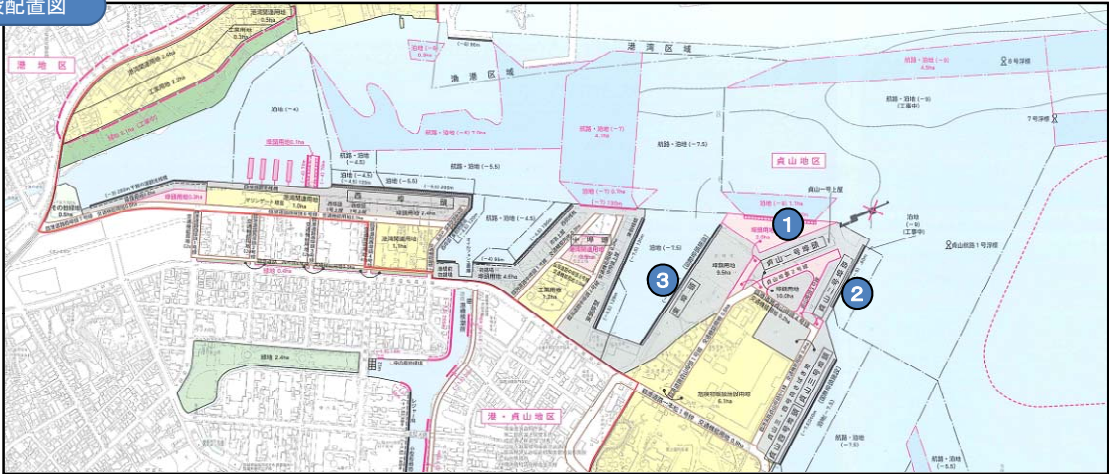

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。


仙 台 塩 釜 港（仙台港区） 復 旧 工 程 計 画

平成23年11月17日

■ ; 応急復旧工事 ■ ; 暫定供用 ☆ ; 災害査定 ■ ; 本格復旧工事 ■ ; 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	高松埠頭	-12m	製材				☆								暫定利用可能														
②	中野 1号	-12m	穀物				安全確認	☆							暫定利用可能														
③	中野 2号	-10m	紙・パルプ					☆							暫定利用可能														
④	中野 3号	-10m	完成自動車					☆							暫定利用可能														
⑤	中野 4号	-10m	完成自動車					☆							暫定利用可能														
⑥	中野 5号	-10m	完成自動車					☆							暫定利用可能														
⑦	中野 6号	-10m	鋼材					☆							暫定利用可能														
⑧	雷神 1号	-7.5m	完成自動車					☆							暫定利用可能														
⑨	雷神 2号	-9m	完成自動車					☆							暫定利用可能														
⑩	高砂 1号	-12m	コンテナ					☆							暫定利用可能														
⑪	高砂 2号	-14m	コンテナ					☆							利用不可														
															暫定利用可能 L=270m														
⑫	向洋	-12m	石炭												暫定利用可能														
	仙台塩釜港海岸												☆																

施設配置図

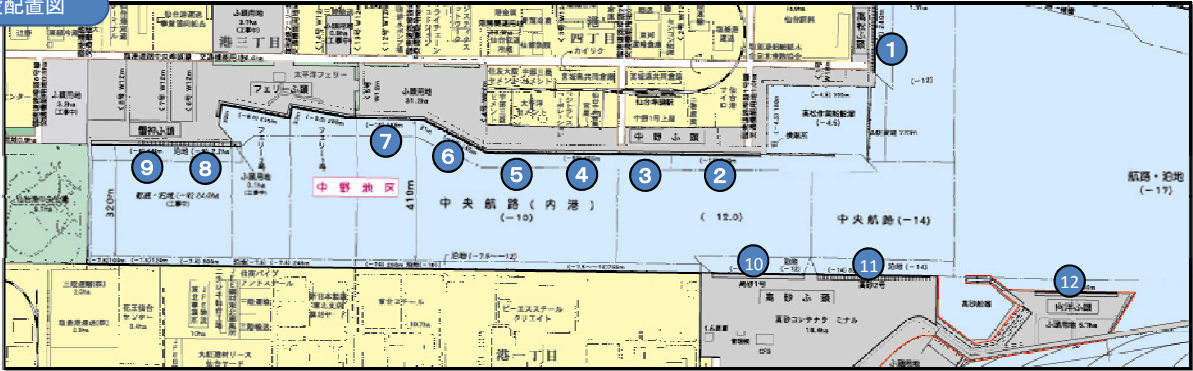

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

相馬港 復旧工程計画

平成23年11月17日

：応急復旧工事

：暫定供用

☆

：災害査定


：本格復旧工事

：供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	1ー3	-7.5m	砕石 スクラップ					☆																					
②	1ー4	-7.5m	セメント					☆																					
③	1ー5	-7.5m	石炭灰					☆																					
④	2ー2	-7.5m	石灰石等バラもの					☆																					
⑤	2ー3	-7.5m	コンテナ					☆																					
⑥	2ー4	-12m	コークス 鉄鉄 他																										
⑦	沖防波堤												☆																
	相馬港海岸												☆																

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

施設配置図

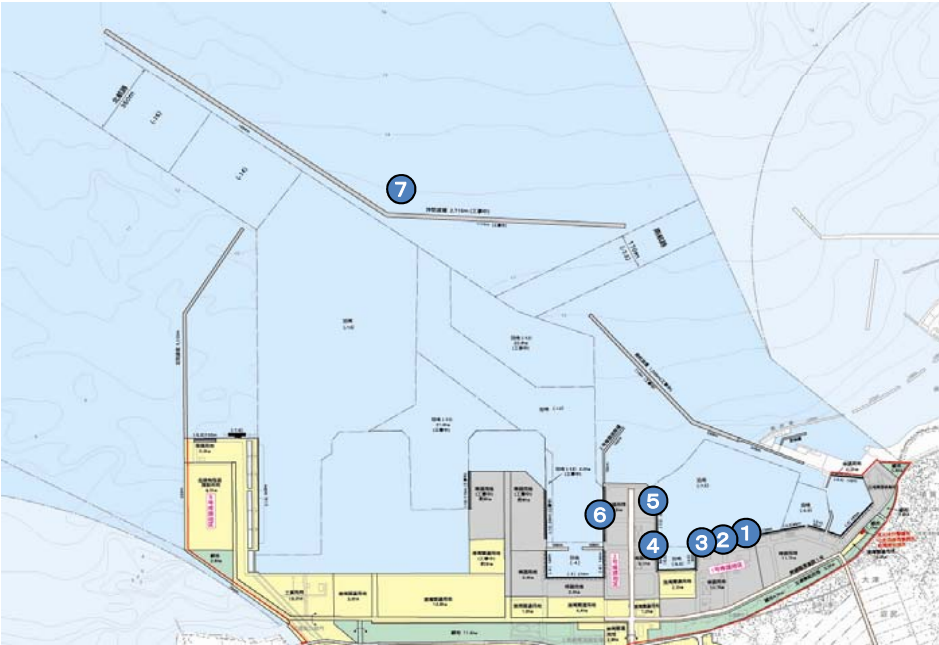

小 名 浜 港 復 旧 工 程 計 画

平成23年11月17日

■ : 応急復旧工事 ■ : 暫定供用 ☆ : 災害査定 ■ : 本格復旧工事 ■ : 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
①	3ー1〜2	-10m	石炭 石灰石									☆																					
②	3ー3	-10m	石炭									☆																					
③	3ー4	-10m	セメント			☆																											
④	4ー2	-10m	セメント			☆												暫定利用可能															
⑤	4ー3	-10m	化学薬品			☆												暫定利用可能															
⑥	5ー1	-12m	金属鉱			☆												暫定利用可能															
⑦	6ー1	-14m	石炭			☆												暫定利用可能															
⑧	7ー1	-13m	石炭			☆												暫定利用可能															
⑨	7ー2	-13m	石炭									☆	暫定利用可能																				
⑩	7ー3	-10m	非金属鉱物					☆												暫定利用可能													
⑪	7ー4	-10m	再利用資源			☆												暫定利用可能															
⑫	7ー5	-7.5m	石炭			☆												暫定利用可能															
⑬	Fー1	-10 m	製材 木材チップ			☆												暫定利用可能															
⑭	Fー2	-12m	製材			☆												暫定利用可能															
⑮	Fー3	-10 m	金属くず								☆	暫定利用可能																					
⑯	Oー3	-10m	コンテナ			☆												暫定利用可能															
⑰	Oー4	-10 m	コンテナ								☆	暫定利用可能																					




※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります

茨城港日立港区 復旧工程計画

平成23年11月17日

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

番号	施設名		水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度											
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	第1ふ頭	B岸壁	-7.5m	石油製品、重油	4/2～(吃水5.5m) ☆																							
②		C岸壁	-7.5m	石油製品、重油	3/29～(吃水5.5m) ☆												暫定利用可能											
③		D岸壁	-10m	石炭	6/1～(吃水6m) ☆												暫定利用可能											
④	第2ふ頭	B岸壁	-9m	非金属鉱物 非鉄金属	3/20～(吃水6m) ☆																							
⑤	第4ふ頭	C岸壁	-7.5m	非鉄金属 電気機械、金属製品				☆																				
⑥		D岸壁	-10m	シャーン 化学工業品				☆																				
⑦		E岸壁	-12m	生乳、製造食品 再利用資材	5/9～(吃水9m) ☆																							
⑧	第5ふ頭	A岸壁	-7.5m	金属くず				☆																				
⑨		B岸壁	-10m	非鉄金属 シャーン、金属くず				☆																				
⑩		C岸壁	-10m	非鉄金属 シャーン、金属くず				☆																				
⑪		D岸壁	-12m	完成自動車	3/20～(吃水9m) ☆																							

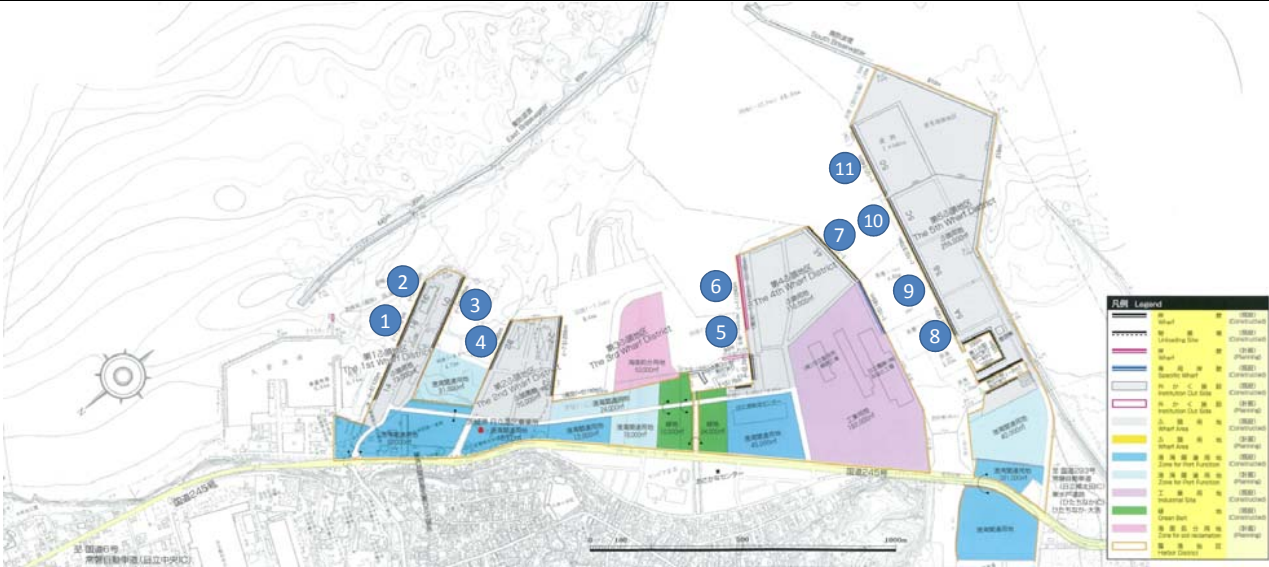


茨城港常陸那珂港区 復旧工程計画

平成23年11月17日

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	北ふ頭 (外貿)	A岸壁	紙・パルプ 産業機械				☆																				
②		B岸壁	産業機械 シャーン	4/1～			☆																				
③		C岸壁	産業機械、非鉄金属 完成自動車	3/22～			☆																				
④	北ふ頭 (内貿)	D岸壁	完成自動車 紙・パルプ、製造食品			5/18～☆																					
⑤		E岸壁	完成自動車 紙・パルプ、製造食品			5/18～☆																					
⑥		F岸壁	完成自動車 紙・パルプ、製造食品			5/18～☆																					
⑦		G岸壁	産業機械			4/29～	☆																				
⑧		H岸壁	産業機械	3/22～		☆																					
⑨	中央ふ頭	A岸壁	-7.5m (耐震)	3/15～		☆																					
⑩		B岸壁	-9m シャーン 製造食品、紙・パルプ	3/22～		☆																					
⑪	南ふ頭	B岸壁	-5.5m 鉄くず(スクラップ)	4/29～		☆																					
⑫		C岸壁	-7.5m 化学薬品	4/29～ (吃水5.5m)		☆																					

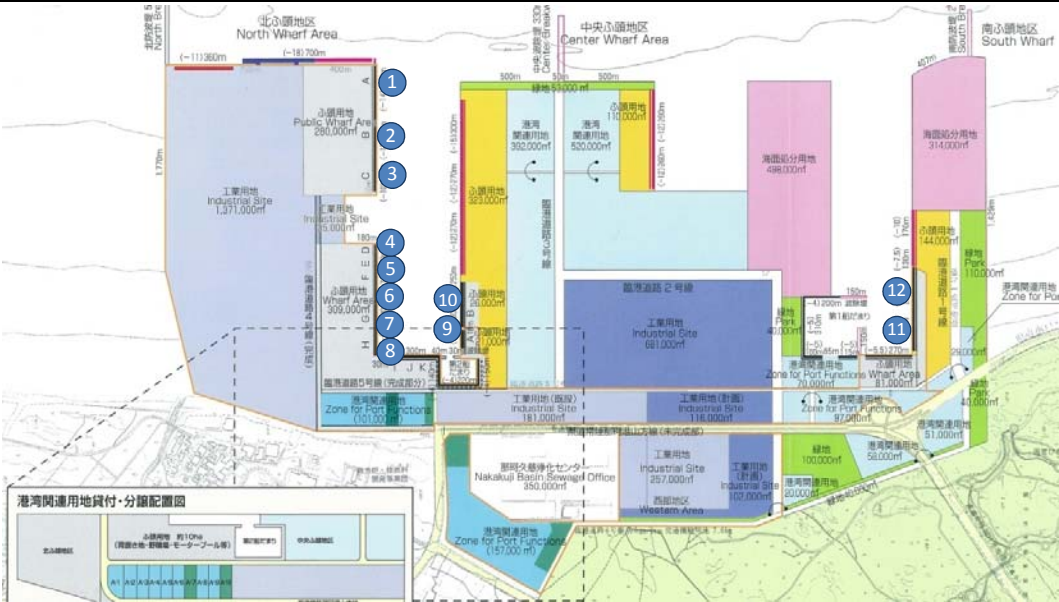

茨城港大洗港区 復旧工程計画

平成23年11月17日

: 応急復旧工事
 : 暫定供用
 ☆ : 災害査定
 : 本格復旧工事
 : 供用

番号	施設名		水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度											
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	第1ふ頭	岸壁	-5m	水産品																								
②		物揚場	—	水産品				☆																				
③		先端護岸波除堤	—	水産品			☆																					
④	第3ふ頭	G岸壁	-8m	製造食品・飲料、雑貨製材、パルプ、鉄鋼			☆ 6/6～(吃水6.8m)																					
⑤		H岸壁	-8m	製造食品・飲料、雑貨製材、パルプ、鉄鋼			☆																					
⑥	第4ふ頭	岸壁	-8m	砂利・砂、化学肥料																								
⑦	中央航路・泊地		-8m				☆																					



鹿島港 復旧工程計画

平成23年11月17日

: 応急復旧工事
 : 暫定供用
 ☆ : 災害査定
 : 本格復旧工事
 : 供用

番号	施設名		水深	主な取扱品目	平成23年度													平成24年度												
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	南公共埠頭	A岸壁	-10m	鉄鋼、非金属鉱物鋼材			☆																							
②		B岸壁	-10m	化学肥料、非鉄金属動物性製造飼肥料			☆																							
③		C岸壁	-7.5m	鋼材、化学肥料					☆																					
④		D岸壁	-7.5m	動物性製造飼肥料鋼材、化学肥料	3/22～			☆																						
⑤		E岸壁	-7.5m	木製品、化学肥料鋼材																										
⑥		F岸壁	-7.5m	鉄鋼、砂利・砂化学肥料																										
⑦		H岸壁	-10m	鉄鋼、非金属鉱物鋼材			☆																							
⑧	北公共埠頭	C岸壁	-10m	砂利・砂、鋼材	3/18～		☆																							
⑨		D岸壁	-10m	鉄鋼、化学肥料			☆																							
⑩		E岸壁	-10m	コンテナ(化学肥料)			☆																							
⑪	外港	航路	-22m				☆																							
⑫	中央	航路	-19m			☆																								
⑬	南	航路	-10m			☆																								
⑭	南海浜	導流堤	－				☆																							
⑮		護岸	－				☆																							
⑯		突堤	－				☆																							

