

事業計画

1. 流域下水道

(宮城県)

① 箇所名：

- ・仙塩流域下水道 仙塩浄化センター（所在地：多賀城市）（※位置図を参照）
（仙台市、塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町、大和町の汚水処理）
- ・阿武隈川下流流域下水道 県南浄化センター（所在地：岩沼市）（※位置図を参照）
（仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町の汚水処理）
- ・北上川下流東部流域下水道 石巻東部浄化センター（所在地：石巻市）
（※位置図を参照）
（石巻市、女川町の汚水処理）

② 仙塩浄化センターについては、6月末から簡易処理（沈殿＋消毒）に加えて仮曝気を実施中（暫定処理）。

県南浄化センターについては、7月中旬から簡易処理（沈殿＋消毒）に加えて仮曝気を実施中（暫定処理）。

石巻東部浄化センターについては、簡易処理（沈殿＋消毒）を実施中。

③ 仙塩浄化センターでは、平成24年8月から平成25年1月にかけて暫定処理から通常処理へ移行し、復旧を完了予定。


県南浄化センターでは、平成24年4月から9月にかけて暫定処理から通常処理へ移行し、復旧を完了予定。

石巻東部浄化センターでは、平成24年5月までに中級処理を開始予定。同9月から平成26年3月にかけて中級処理から通常処理へ移行し、復旧を完了予定。

④ 成果目標 平成23年度

- ・県南浄化センター 平成24年4月までに、通常処理を開始
- ・石巻東部浄化センター 平成24年5月までに、中級処理を開始

(参考)下水処理場 位置図

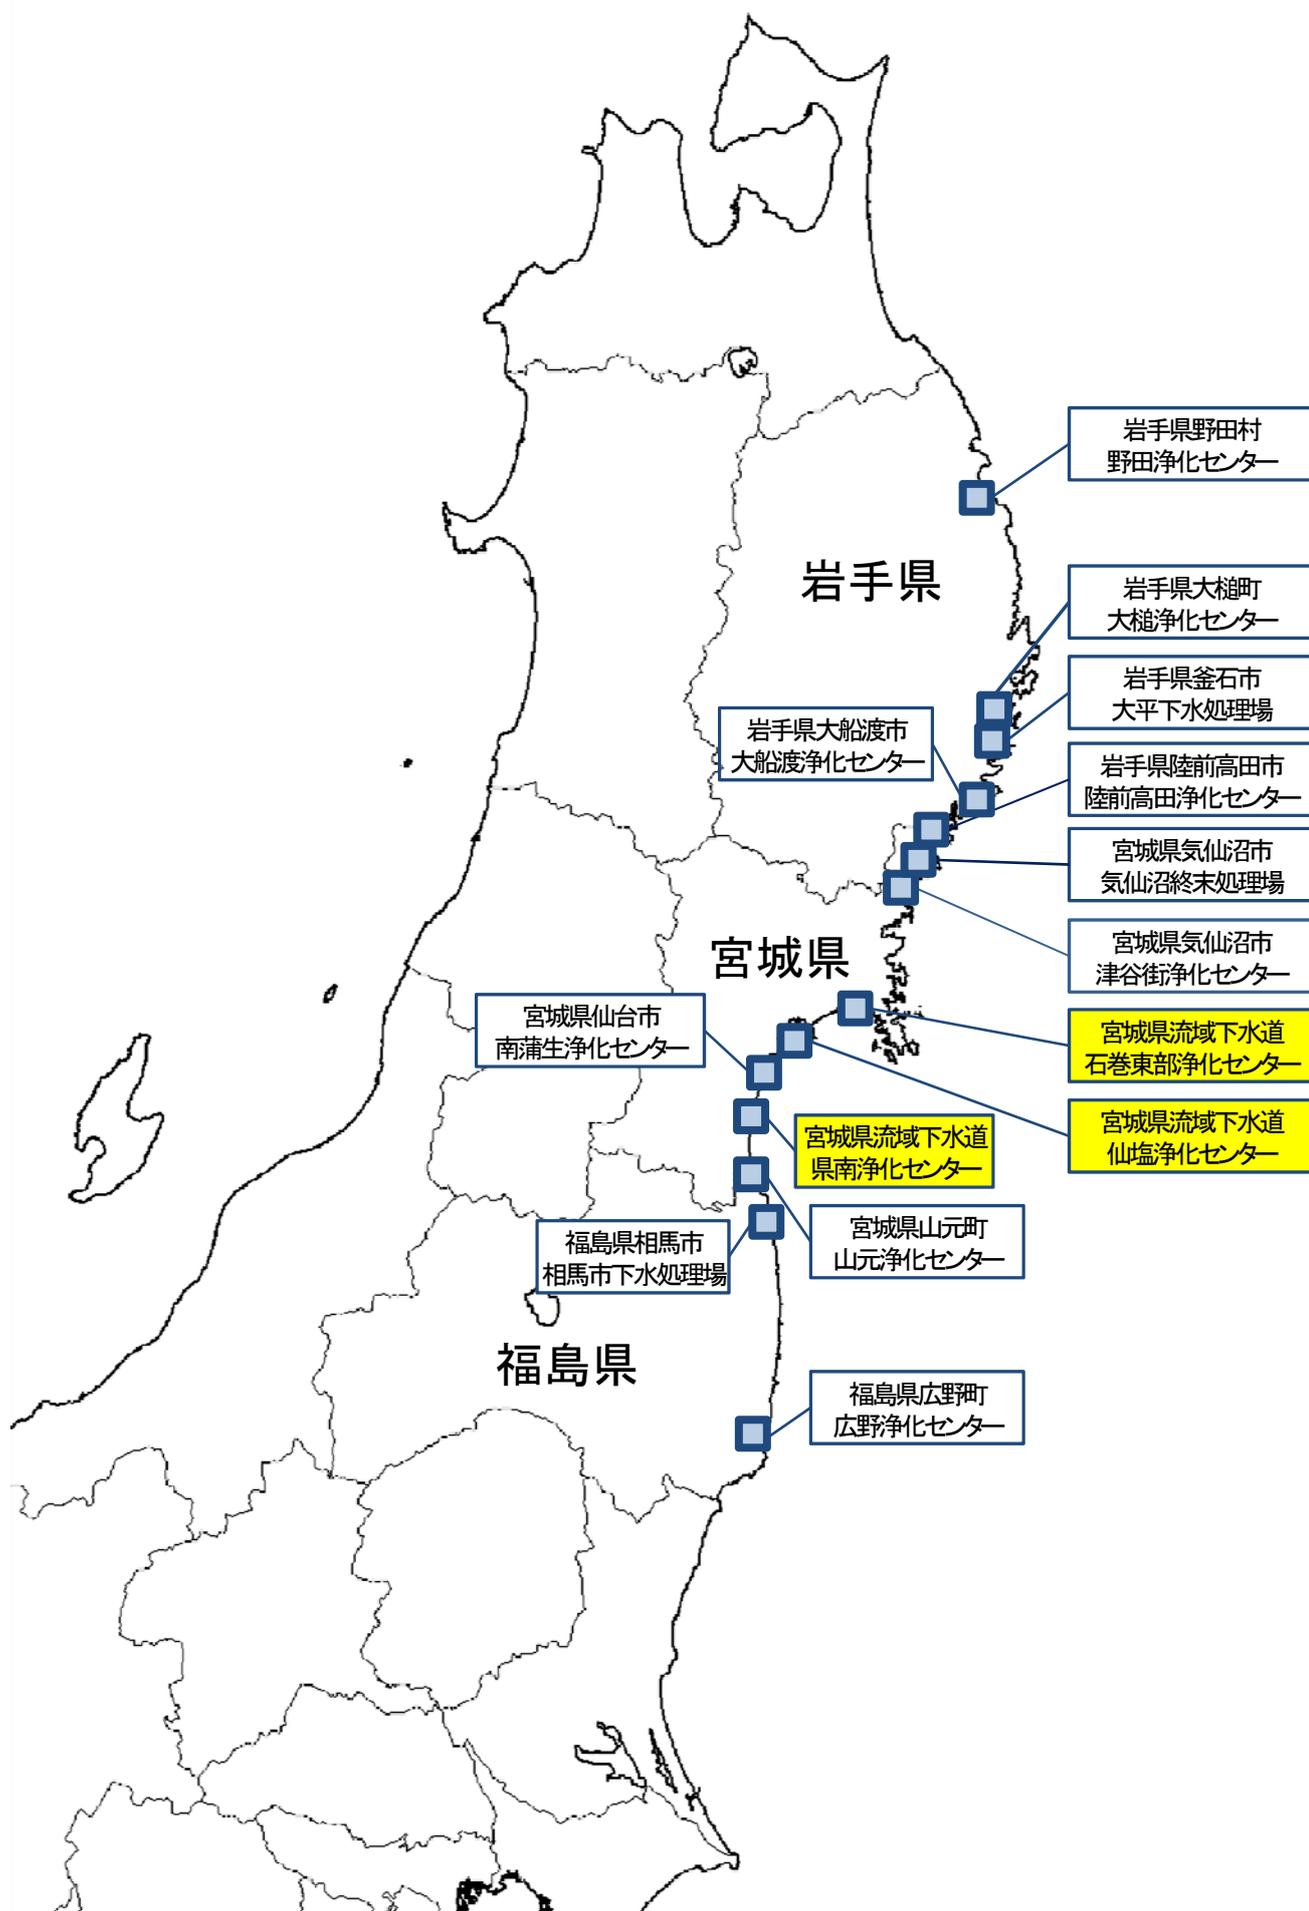

工程表(流域下水道)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 流域下水道 仙塩流域下水道 仙塩浄化センター (所在地: 多賀城市) ※仙台市、塩竈市、多賀城市、セヶ浜町、利府町、大和町の汚水を処理	簡易処理	暫定処理			通常処理								
							通常処理の開始						
阿武隈川下流流域下水道 県南浄化センター (所在地: 岩沼市) ※仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亶理町の汚水を処理	簡易処理	暫定処理			通常処理								
							通常処理の開始						
北上川下流東部流域下水道 石巻東部浄化センター (所在地: 石巻市) ※石巻市、女川町の汚水を処理	簡易処理			中級処		通常処理							
								通常処理の開始					
